

Opdrachtgever

C.A. de Groot Asbestsanering en Milieutechniek
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Koelmalaan 55
1812PR Alkmaar
Ref.nr. opdrachtgever
Kenmerk inventarisatie rapport
meldingsnummer

SD20160334
Van Dijk Geo- en Milieutechniek b.v.750623; ; geldig tot 20-07-2019
756494

Dominus Milieutechniek BV
Van Riemsdijkweg 70
3088 HD te Rotterdam
Tel: 010- 751 16 47
E-mail: Info@Dominus-Milieutechniek.nl
Website: www.Dominus-Milieutechniek.nl

Contactpersoon: Dhr. E. Kavas

Rotterdam, 12 oktober 2016

Onderzoeksgegevens

Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie, onder accreditatie NEN2990.
Plaats van onderzoek:	Schoutenbosch 60 te Castricum
Risicoklasse SZW:	2
Containment?:	Nee
Datum controle:	6-okt-16
Aanvang werkzaamheden :	11:00
Eind werkzaamheden :	12:30
Tijdsduur visuele inspectie (min):	70
Inspecteur:	R. Bhagwanbali

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek	Het verwijderen van golfplaat en buis van het dak van een loods.
	Zie bijgevoegde situatietekening.
Maaiveld	Buiten
Weersomstandigheden	Droog
Inhoud containment (m3)	-
Afmeting werkplek (m2)	875
Aantal segmenten	4

DTA:	Ja
Werkplan	Ja
Inventarisatie rapport	Ja

Visuele inspectie werkplek

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatie rapport en mededelingen DTA'er

Gehanteerde bronnen voor onderstaande asbesthoudende toepassingen/materialen:

Bron nr. inv. Rapport	locatie, bouwdeel	Materiaal	Soort Asbest	gehalte	gebondenheid
1	Loods, dak	AC Golfplaat	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
3	Loods, dak	AC buizen en kanalen	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		

Inspectie I: Inspectie randvoorwaarden

	Randvoorwaarden	Uitkomst	Opmerkingen
1.	Is elke plek in het 'containment' of de afgeschermd ruimte goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	ja	
2.	Zijn losstaande producten in het 'containment' of de afgeschermd ruimte aanwezig?	nee	Losstaande producten: Verwijderd of verplaatst :

Inspectie II: Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd waren

Segment	Locatie Bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		constructiedeel	aangelegde delen	toplaag bodem	
1	Dak	v	v	v	
2	Dak	v	v	v	
3	Dak	v	v	v	
4	Dak	v	v	v	
Tijd besteed aan inspectie II (minuten):		20	10	20	

Overige opmerkingen inspectie deel II:

Inspectie III (overige bouw- en constructiedelen in het 'containment' of de afgeschermd ruimte)

		Segmenten								Opmerkingen
Overige bouw- en constructiedelen		1	2	3	4					
1	plafond (constructiedelen)	v	v	v	v	-	-	-	-	Dak
2	kabelgoten en/of doorvoeringen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
3	ventilatiekanalen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
4	buizen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
5	verwarmingselementen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
6	kozijnen	v	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
7	plinten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
8	vloer	v	v	v	v	-	-	-	-	
9	machines, installaties	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
10	Deco-unit	v	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	-	-	
11	Gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers, eventueel achtergebleven inboedel	v	v	v	v	-	-	-	-	Kraan met manbak
12	Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	v	v	v	v	-	-	-	-	
13	Toplaag bodem 5 meter van het bouwwerk of constructie (Buitensanering)	v	v	v	v	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Tijd besteed aan inspectie II (minuten):		5	5	5	5					

Overige opmerkingen inspectie deel III:
Beperkingen visuele inspectie:

Op de volgende plaatsen zijn er beperkingen betreffende het uitvoeren van de visuele inspectie:	Plaats van de beperking:	Beperking en reden hiervan:
		Alle naden en kieren van de kozijnen.
	Muur	Alle naden en kieren van de steense muur en het voegwerk ervan.
	Vloer	Alle naden en kieren van de steense vloer.
	Begroeiing	Tussen de begroeiing in.
	Dak	Alle naden en kieren van het dak

Uitsluitingen visuele inspectie:

De volgende plaatsen dienen uitgesloten te worden van de visuele inspectie:	Plaats van de uitsluiting	Uitsluiting en reden hiervan:
	Maaiveld	Onder de visuele toplaag van het geïnspecteerde gebied.
	Container	De binnen- en onderzijde van de container.

Inspectie werkplek:
In orde bevonden
Verklaring symbolen:

v = in orde bevonden
 v (2) = in orde bevonden na één Aanvullende schoonmaak
 A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
 n.v.t. = niet van toepassing

Conclusie visuele inspectie:

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Dominus Milieutechniek BV: 1.16.0755

Handtekening technisch manager Dominus Milieutechniek:




I. Jawaid
pagina2 van 5

Bevindingenrapport: Tekenblad

Behorende bij bevindingenrapport: 1.16.0755

Plaats van onderzoek	Schoutenbosch 60 te Castricum
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie.
Omschrijving werkplek	Het verwijderen van golfplaat en buis van het dak van een loods.

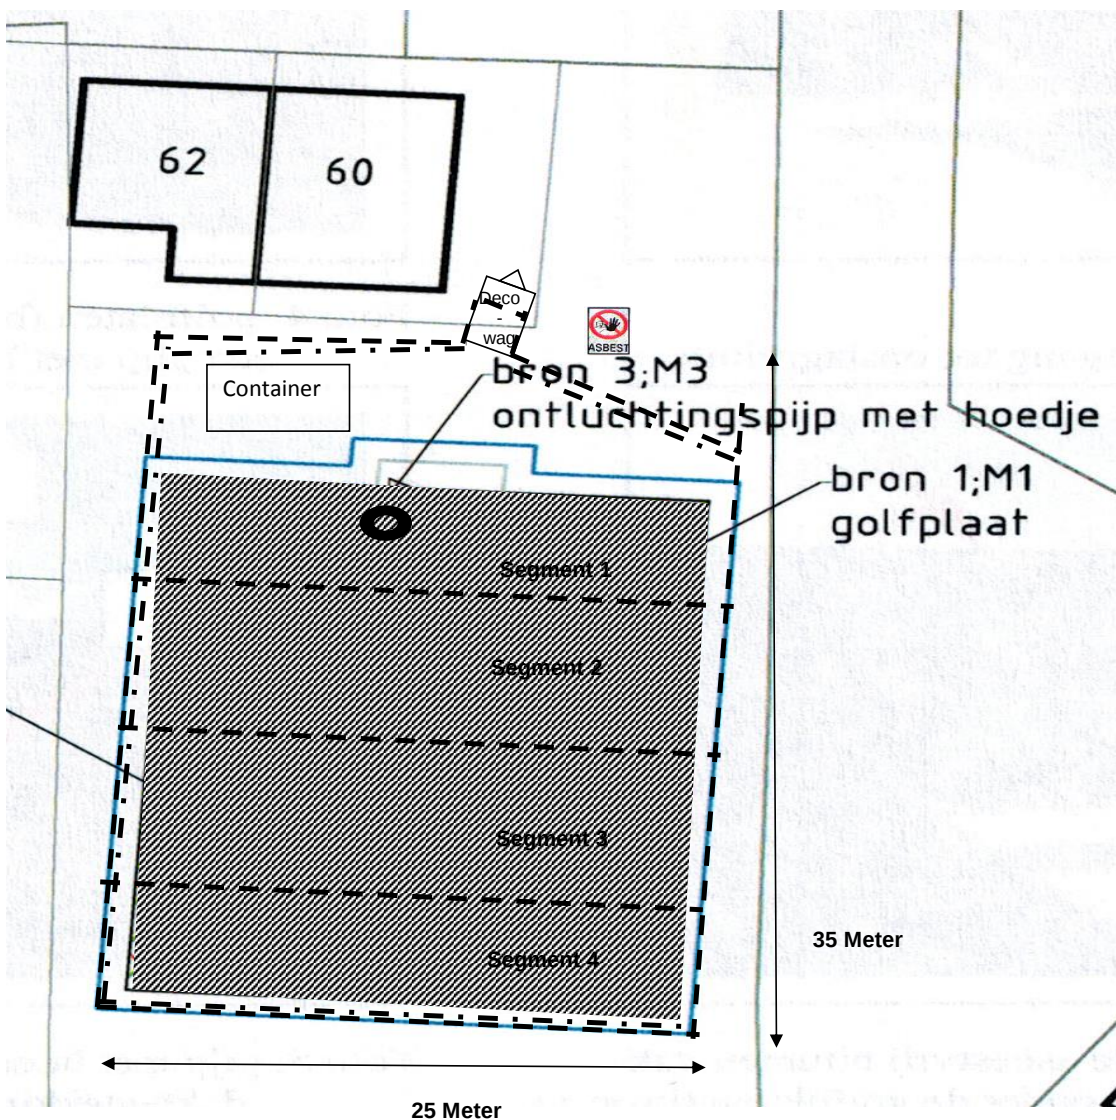

- Verwijderd AC buis en kanaal
Bron: 3
- Verwijderd AC golfplaat
Bron: 1

Opm: Tekening is niet op schaal

Hoogte containment 0,0 meter

Legenda:													
Toilet	Weg	struiken	Bomen	Keuken	foto	meter	douche	dakpannen	rechte trap	wenteltrap	steen/rots	ODM	
Inspectiegebied													
containment	Sluis	Ruimte	Begrenzingslint	Asbesthoudende bron	Meetpunten monsterneming								
					P1 P2 P3 P4 P5 P6								
	Deco-wagen			ASBEST									

Projectnummer	1.16.0755
Plaats van onderzoek	Schoutenbosch 60 te Castricum
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie.
Omschrijving werkplek	Het verwijderen van golfplaat en buis van het dak van een loods.

Foto 1: Deco-unit



Foto 2: Asbest-container



Foto 3: Overzichtsfoto



Foto 4: Overzichtsfoto



Foto 5: Overzichtsfoto



Foto 6: Overzichtsfoto



Foto 7: Overzichtsfoto



Foto 8: Overzichtsfoto



Foto 9: Overzichtsfoto



Projectnummer	1.16.0755
Plaats van onderzoek	Schoutenbosch 60 te Castricum
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie.
Omschrijving werkplek	Het verwijderen van golfplaat en buis van het dak van een loods.

Foto 10: Gesaneerde bron 1



Foto 11: Gesaneerde bron 3



Foto 12: Gesaneerde bron 3



Foto 13: Gesaneerde bron 1



Foto 14: Gesaneerde bron 1



Foto 15: Gesaneerde bron 1



Foto 16: Gesaneerde bron 1



Foto 17: Gesaneerde bron 1



Foto 18: Gesaneerde bron 3

