

Inspectierapport

conform NEN2990+C1:2020

Pagina 1 van 6

Opdrachtcode Eurofins Asbestos Inspections: A230501039A

Versie 1

Project gegevens

Opdrachtgever	Plentas B.V.
Contactpersoon	Richard Oude Lansink
Projectnummer	20231105
Locatie adres	Rijssenseweg 32a Enter
Datum	12-5-2023
Overige omschrijving	

Werkzaamheden

Naam inspecteur	Willem Sterken	
Aankomsttijd	16:25	
Vertrektijd	17:25	
Saneringsklasse / aardsanering	Buiten sanering / Visuele inspectie na risicoklasse 2A sanering	
Inventarisatie bureau	Rapportnummer	Versie
Prinas B.V.	PR-23-1869	1

Verwijderde bronnen

Bron	Locatie/bouwdeel	Materiaal	Vezelsoort + gehalte	Omvang	HB	Opmerking
M1	wanden stal	Vlakke plaat	Chrysotiel(10 - 15%)	25 m2	Ja	
M2	dak stal	Golfplaat	Chrysotiel(10 - 15%), Crocidoliet(2 - 5%)	125 m2	Ja	
M5	tussenwand in stal	Golfplaat	Chrysotiel(10 - 15%), Amosiet(2 - 5%)	2,5 m2	Ja	

HB = Hechtgebonden

Blijft er (verdacht) asbesthoudend materiaal achter

Er blijft geen asbesthoudend (verdacht) materiaal achter.

Resultaat

Visuele inspectie	Goedgekeurd
-------------------	-------------

Niet geïnspecteerde delen / uitsluitingen

Kieren, naden en gaten tot een visuele diepte geïnspecteerd.
--

Eind conclusie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte en/of asbestverontreinigde materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Inspectierapport

conform NEN2990+C1:2020

Pagina 2 van 6

Opdrachtcode Eurofins Asbestos Inspections: A230501039A

Versie 1

Inspectie randvoorwaarden

Inspectietijd	30 minuten
Afgezet gebied geschikt voor inspectie?	Ja
Werkzaamheden conform werkplan uitgevoerd?	Ja
Is het inspectiegebied droog?	Ja
Is het inspectiegebied stof vrij?	Nee
Is het inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja
Zijn er oppervlakten gefixeerd?	Nee
Afgezet gebied vrij van obstakels of verpakt afval?	Nee
Is alle folie verwijderd voor inspectie? (bodem, inboedel en losse goederen)?	Ja
Afzetlint > 5m vanaf het object geplaatst?	Ja
Indien de afzetting < 5 m vanaf object, is er wel tot 5 m vanaf object geïnspecteerd?	N.v.t
Indien transitroute, voldoet deze aan criteria?	N.v.t

Resultaten
Segmenten

	1	2	3
Locatie / bouwdeel	V	V	V
Constructiedelen (plafond, wanden)	Nvt	V	V
Kabelgoten / doorvoeringen	Nvt	Nvt	Nvt
Ventilatiekanalen	Nvt	Nvt	Nvt
Buizen	Nvt	V	V
Kozijnen	Nvt	V	V
Verreiker (werkbak)	Nvt	Nvt	Nvt
Vloer	V	V	V
Machines, installaties	Nvt	Nvt	Nvt
Deco-unit	V	Nvt	Nvt
Gereedschappen, hulpmiddelen, trappen,	Nvt	V	V
Achter gebleven inboedel	Nvt	Nvt	Nvt
Transitroute (route waarlangs afval is	Nvt	Nvt	Nvt

V = op moment van inspectie in orde bevonden;

V (2) = op moment van inspectie in orde na aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestrestanten, gehele ruimte reinigen.

F/A = afgeplakt

N.v.t. = niet aanwezig

Opmerkingen*Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming*

Inspectierapport

conform NEN2990+C1:2020

Pagina 3 van 6

Opdrachtcode Eurofins Asbestos Inspections: A230501039A

Versie 1

Naam en handtekening inspecteur

Willem Sterken


**Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever**

T. Oude Lansink



Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Tekening

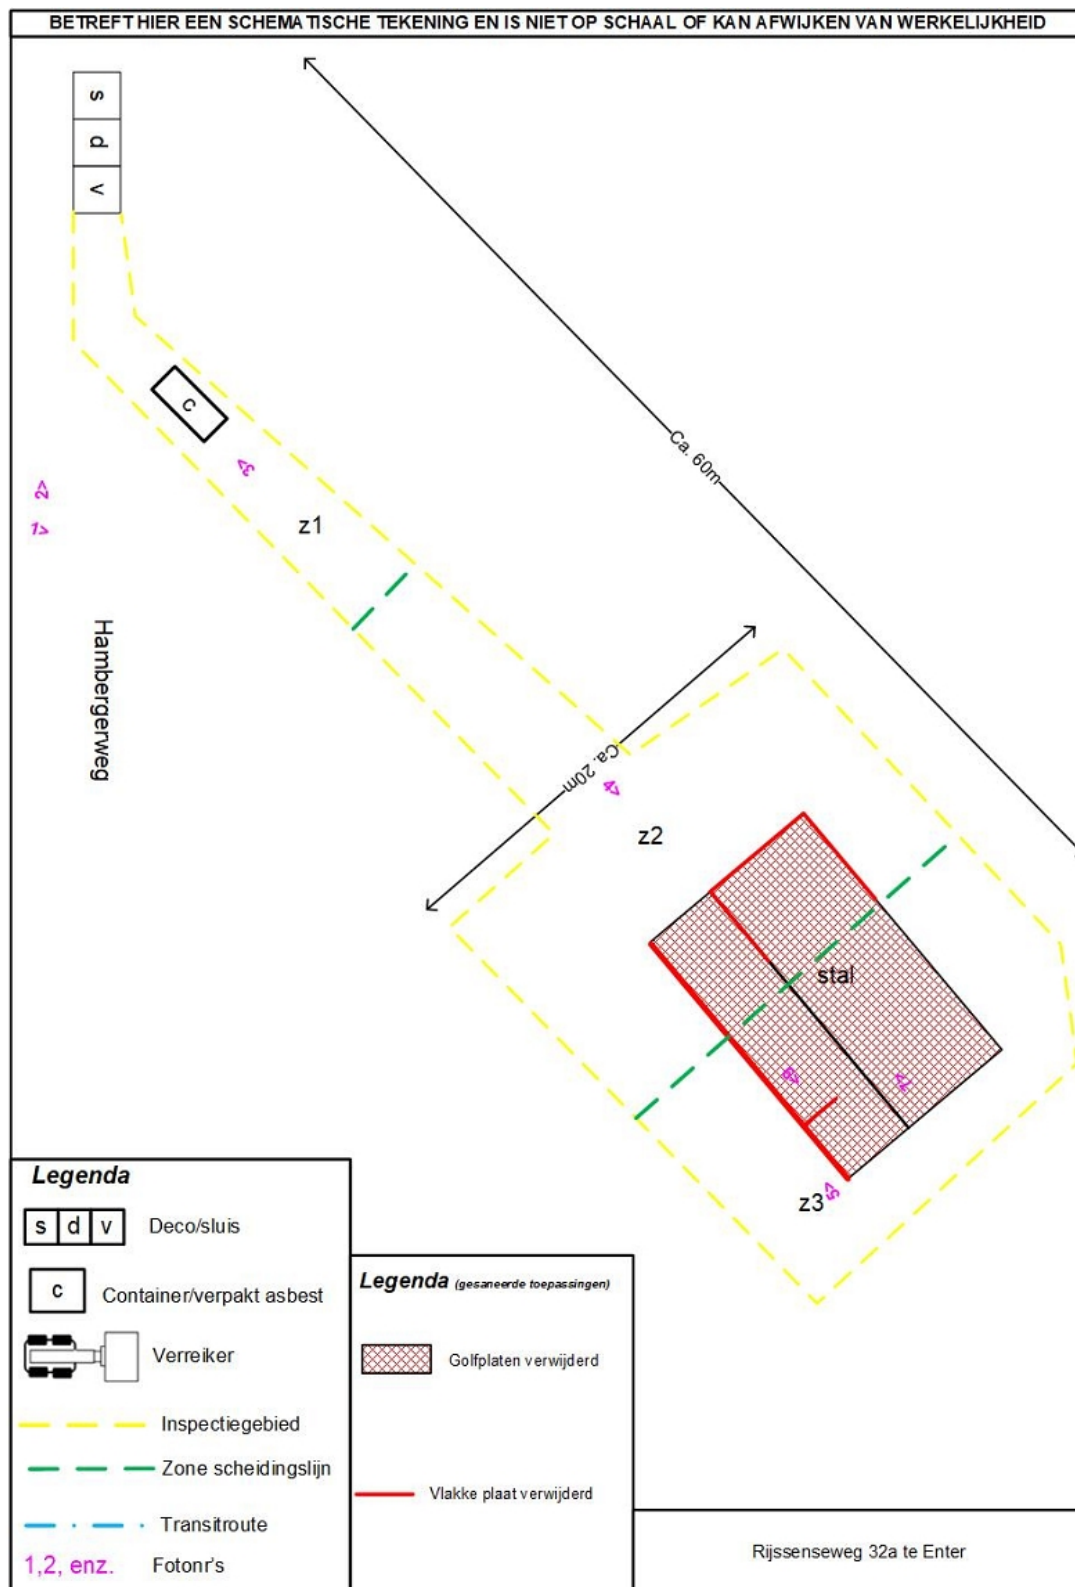

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Foto's


1. Overzichtsfoto



2. Deco



3. Container verpakt asbest



4. Locatie verwijderd asbest



5. Locatie verwijderd asbest



6. Locatie verwijderd asbest

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming



7. Locatie verwijderd asbest

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming
