

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING

OOO Islamitische begraafplaats Arnhem



Ref.: EES1378NL-02
15 augustus 2022

Proces-verbaal van oplevering

Versie	Doel van het document	Auteur	Gecontroleerd door	Goedgekeurd door	Datum
1.0	Rapport waarin wordt omschreven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat de onderzoeksresultaten zijn	T. Hebbink	M. Asveld	D. Denman	15-8-2022

Paraaf voor akkoord

Tim Hebbink

Historicus I Projectmedewerker OOO



15-8-2022

Emile van den Meiracker

Namens David Denman,
Operationeel Directeur RPS EES



15-8-2022

Marvin Asveld

Senior Deskundige OOO



15-8-2022

Gemaakt door:

Vorbereid voor:

RPS

Van Kerkhoff Maatwerk in RO

Tim Hebbink

Historicus I Projectmedewerker OOO

Roeland van Kerkhoff

Eigenaar

Postbus 75, 4140 AB Leerdam

Prins Mauritsstraat 17, 4141 JC Leerdam

Reinier de Graafstraat 17

5017 GP TILBURG

T +31 88 99 04 920

E tim.hebbink@rps.nl

T +31 63 17 71 881

E info@vankerkhoffmaatwerk.nl

Dit rapport is vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RPS of van de opdrachtgever. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	4
1.1	Opdracht.....	4
1.2	Probleemstelling.....	4
1.3	Doelstelling	4
1.4	Te verwachten OO	4
1.5	Projectplan	5
1.6	Distributielijst	5
2	LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS.....	6
2.1	Opsporingsgebied	6
3	UITVOERING	7
3.1	Afwijkingen	8
3.2	Aangetroffen OO	9
4	DETECTIETECHNIEKEN	11
4.1	Passieve realtime oppervlakedetectie.....	11
5	VERKLARING EN ADVIES	12

BIJLAGEN

1. Revisietekening OO
2. OO Overgaveformulier

1 ALGEMEEN

1.1 Opdracht

In Arnhem-Noord wordt in de toekomst mogelijk een islamitische natuurbegraafplaats gerealiseerd. Het projectgebied is verdacht verklaard op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO). Bijgevolg is reeds een non-realtime oppervlakedetectie uitgevoerd (zie detectierapportage met kenmerk EES1329NL). RPS is door Van Kerkhoff Maatwerk in RO gevraagd om de benader- en opsporingswerkzaamheden uit te voeren en eventuele ontplofbare oorlogsresten te verwijderen.

1.2 Probleemstelling


Bij geplande grondroerende werkzaamheden binnen het projectgebied bestond de kans op het aantreffen van OO. Deze OO vormen een risico voor de betrokken werknemers en de omgeving. Derhalve was een opsporingsonderzoek benodigd.

1.3 Doelstelling

Het doel is het creëren van een veilige werkomgeving voor de civiele aannemer en toekomstige gebruikers.

1.4 Te verwachten OO

Voor de gehele gemeente Arnhem is in het verleden al een historisch vooronderzoek naar OO uitgevoerd. RPS heeft in opdracht van Van Kerkhoff Maatwerk in RO een adviesrapport opgesteld (kenmerk: EES1259NL-001, 14 januari 2022), waarin dit onderzoek is geraadpleegd en geanalyseerd. Op basis van de bevindingen is geconcludeerd dat het gebied verdacht is op de aanwezigheid van OO:

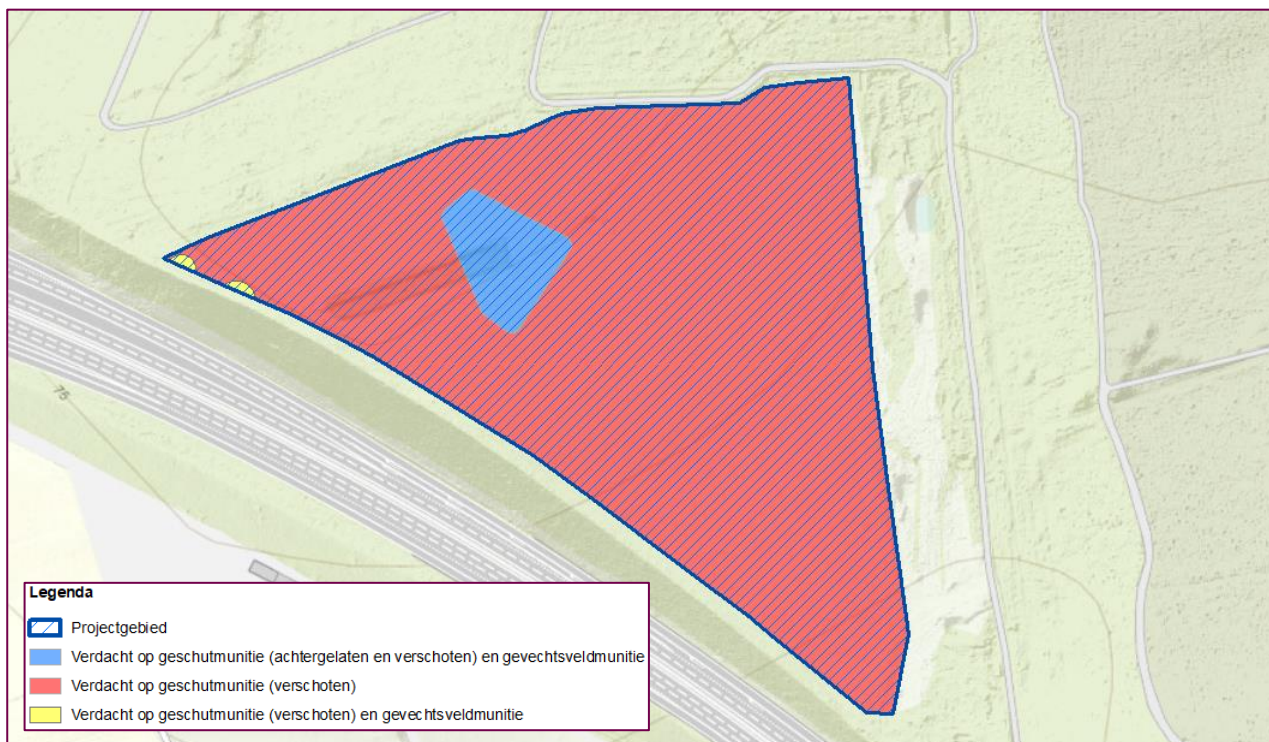

figuur 1.1: Verdachte gebieden OO (bron: RPS, EES1259NL-001 Adviesrapport OO Islamitische begraafplaats Arnhem-Noord)

tabel 1.1: overzicht van te verwachten OO

Verdacht gebied(en)	Soort aan te treffen OO (Kaliber)	Verschijningsvorm	Max. diepte op te sporen (m -mv)*
Rood	Geschutmunitie (25 ponder tot 7.2 inch)	Verschoten	1.75 m-mv
Geel	Geschutmunitie (25 ponder tot 7.2 inch)	Verschoten	1.75 m-mv
	Gevechtsweldmunitie (div)**	Achtergelaten / gedumpt	2 m-mv
Blauw	Geschutmunitie (25 ponder tot 7.2 inch)	Verschoten	1.75 m-mv
	Geschutmunitie (2 t/m 3.7 cm)	Achtergelaten / gedumpt	2 m-mv
	Gevechtsweldmunitie (div)**	Achtergelaten / gedumpt	2 m-mv

1.5 Projectplan

Voorafgaand aan de opsporingswerkzaamheden is door RPS een projectplan opgesteld (kenmerk: EES1378NL, 10 juni 2022). Hierin zijn alle relevante veiligheids- en uitvoeringsaspecten opgenomen. Dit projectplan is goedgekeurd door de opdrachtgever en de gemeente Arnhem in diens rol als bevoegd gezag.

1.6 Distributielijst


Dit proces-verbaal van oplevering wordt verstuurd naar:

- Opdrachtgever.
- Bevoegd gezag.

2 LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS

2.1 Opsporingsgebied

Het projectgebied is gesitueerd binnen de gemeente Arnhem, ten noorden van de A12. Het vrijgegeven gebied is weergegeven in de bijgevoegde revisietekening waarin ook de vrijgegeven dieptes zijn opgenomen (zie bijlage 1). Onderstaande afbeelding geeft het projectgebied weer:

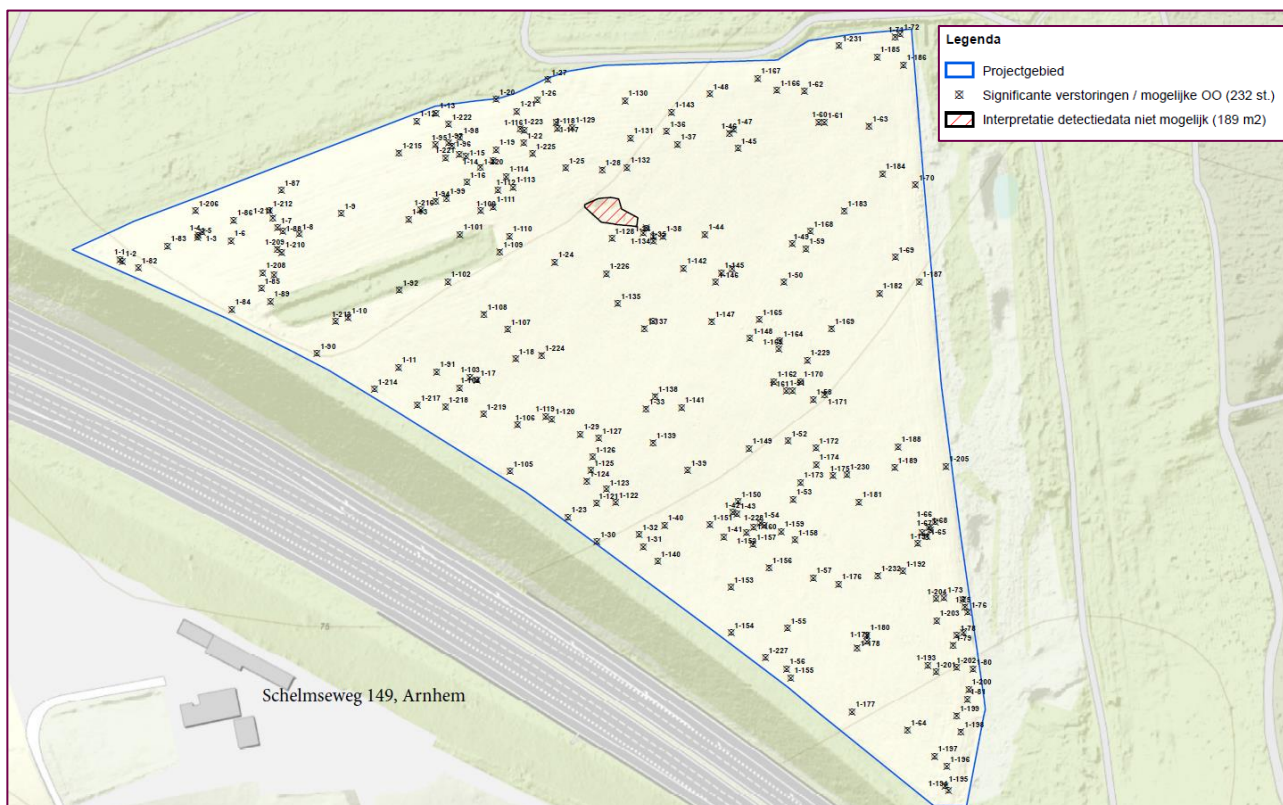

figuur 2.1: Projectgebied (blauw), te benaderen objecten (kruisjes) en nader te onderzoeken detectieverstoord gebied (rood)

3 UITVOERING

De opsporingswerkzaamheden zijn uitgevoerd van maandag 27 juni tot en met 13 juli 2022. Hieronder wordt kort een omschrijving gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden per week. Zie paragraaf 3.2. voor meer informatie over de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten en hoofdstuk 4 voor meer informatie over de detectiemethode.

Week 26

De werkzaamheden gingen van start met een startwerkoverleg, waarbij de werkzaamheden, risico's en bijbehorende veiligheidsmaatregelen werden besproken. Vervolgens gingen de benader- / opsporingswerkzaamheden van start. In deze week werden geselecteerde objecten met de hand benaderd. Allereerst werden de onderzoekspunten met GPS uitgezet. Vervolgens werd de exacte locatie van de objecten bepaald, waarbij gebruik werd gemaakt van de Vallon VX1. De significante verstoringen werden vervolgens handmatig benaderd, waarbij tussentijdse metingen werden uitgevoerd. Op de eerste dag werden 34 objecten benaderd, waarbij direct 5 ontplofbare oorlogsresten werden aangetroffen. Bijgevolg werd in overleg met de opdrachtgever besloten om de VTVS te laten aanvoeren. Deze werd uiteindelijk op dinsdag 28 juni geplaatst. In de eerste week werden uiteindelijk 133 objecten benaderd, waarbij 29 ontplofbare oorlogsresten aangetroffen.

Week 27

In week 27 werden de werkzaamheden voortgezet. In deze week werden de dieper gelegen objecten benaderd met behulp van een graafmachine. Tevens werd getracht het voorheen niet te detecteren gebied (189 m²) nader te onderzoeken. Uiteindelijk werd 115 m² van de 189 m² onderzocht en vrijgegeven en werd in overleg met de opdrachtgever besloten om een gebied van 74 m² in dit stadium niet nader te onderzoeken vanwege de aanwezigheid van niet te verwijderen (detectieverstorende) obstakels (jachthut en bosschage).

Op donderdag 7 juli werd een vliegtuigbom (100lbs Inc. AN-M47-A1 met ontsteker M126-A1) aangetroffen, waardoor de werkzaamheden tijdelijk kwamen stil te liggen. Direct werd contact opgenomen met de gemeente Arnhem en de EOD. Uiteindelijk werd besloten om dit munitieartikel direct ter plaatse te vernietigen. In de tweede week werden 74 significante verstoringen benaderd en geïdentificeerd. Hierbij werden in totaal 199 munitieartikelen aangetroffen.

Week 28

Op woensdag 13 juli werden de werkzaamheden weer opgepakt en uiteindelijk afgerond. Op de laatste dag werden nog 11 objecten benaderd en geïdentificeerd. Hierbij werden uiteindelijk nog 10 ontplofbare oorlogsresten aangetroffen.

Onderstaande foto's schetsen een beeld van de werkzaamheden:



figuur 3.1: situatieschets van de uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Afwijkingen

Na aanleiding van het archeologisch beleid van de gemeente Arnhem was het niet mogelijk om 14 significante verstoringen te benaderen en identificeren. Betreffende objecten liggen namelijk op een plek waar ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een FLAK-stelling stond en de gemeente ernaar streeft om deze te behouden in situ. Hieronder is een overzicht gegeven van de betreffende significante verstoringen:

tabel 3.1: overzicht niet te benaderen significante verstoringen zonder nader archeologisch onderzoek

Vallon Nr.	Easting (m)	Northing (m)	Diepte (m ¹ -mv)	Max-Waarde (nT)	Magn. Moment (Am ²)	Fit-Area (m ²)
1-16	192734,9	447515,424	0,47	52	0,226	4,18
1-24	192774,49	447479,442	0,22	585	0,46	5,54
1-94	192720,956	447506,844	1,13	17	0,463	6,06
1-99	192725,725	447508,041	0,67	37	0,389	9,91
1-100	192741,101	447502,649	0,6	32	0,228	6,45
1-101	192731,773	447492,072	1,59	58	3,991	20,05

1-102	192726,272	447470,731	0,92	57	0,474	7,76
1-107	192753,23	447449,132	0,3	48	0,115	5,61
1-108	192742,598	447455,963	1,46	15	0,709	4
1-109	192749,685	447483,95	0,41	33	0,099	3,34
1-110	192754,121	447491,142	0,78	24	0,296	6,61
1-111	192746,646	447504,363	0,64	30	0,286	4,95
1-112	192748,789	447511,938	0,77	25	0,364	5,91
1-216	192714,198	447502,912	1,05	19	0,335	3,2

Naast het hierboven genoemde, waren enkele terreindelen niet te detecteren vanwege niet wegneembare (detectieverstorende) obstakels, zoals begroeiing en de aanwezigheid van een jachthut. Indien wenselijk kunnen deze delen opnieuw gedetecteerd worden wanneer de verstoringe obstakels verwijderd zijn. Indien hierbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden, dienen deze conform de CS-OOO gecontroleerd te worden ontgraven.

3.2 Aangetroffen OO

Tijdens de opsporingswerkzaamheden zijn 238 stuks ontplofbare oorlogsresten aangetroffen. Alle ontplofbare oorlogsresten zijn gemeld bij de opdrachtgever en de gemeente en overgedragen aan de EODD. Het overgaveformulier is bijgevoegd als bijlage 2.

tabel 3.2: aangetroffen OO

Aantal	Soort OO	Subsoort / kaliber	Nationaliteit
39	Geschutmunitie	Rookgranaat van 25 pond met ontsteker TSB 221	UK
1	Geschutmunitie	Lichtgranaat van 25 pond met ontsteker TSB 221	UK
1	Geschutmunitie	Pantserbrandgranaat van 20 mm met LSP	UK
1	Geschutmunitie	Brisantpantsergranaat van 75 mm met ontsteker M66	US
1	Geschutmunitie	Brisantgranaat van 8 cm mortier zonder ontsteker	D
178	Geschutmunitie	Restant huls van 2 cm	D
2	Geschutmunitie	Rookpot van 25 pond	UK
9	Ontstekingsinrichtingen	Restant M126-A1	US
3	Ontstekingsinrichtingen	Restant Buster M1	US
2	Klein kaliber munitie	Diverse	Diverse
1	Afwerpmunitie	100lbs Inc. AN-M47-A1 met ontsteker M126-A1	US






figuur 3.2: foto's van aangetroffen ontplofbare oorlogsresten

4 DETECTIETECHNIEKEN

De onderstaande methoden zijn bij deze werkzaamheden toegepast. De specificaties van de gebruikte apparatuur worden hier ook beschreven.

4.1 Passieve realtime oppervlakedetectie

Passieve realtime oppervlakedetectie is normaliter de eerste keuze bij het uitvoeren van een detectie en benaderingsonderzoek. Een passieve detectie wordt door ons uitgevoerd met een Vallon VX1. Deze meet verstoringen in het aardmagnetisch veld die worden veroorzaakt door ferrometalen. Bij het gebruik van de Vallon VX1 worden dus alleen ontplofbare oorlogsresten gevonden die ferrometalen bevatten. De zoekdiepte reikt tot maximaal 5m-mv, maar dit is mede afhankelijk van omgevingsfactoren en de grootte en ligging van een object. Bij realtime (handmatige) oppervlakedetectie wordt de meting direct door de (Senior) Deskundige OOO beoordeeld waardoor significante verstoringen direct gelokaliseerd en benaderd worden.

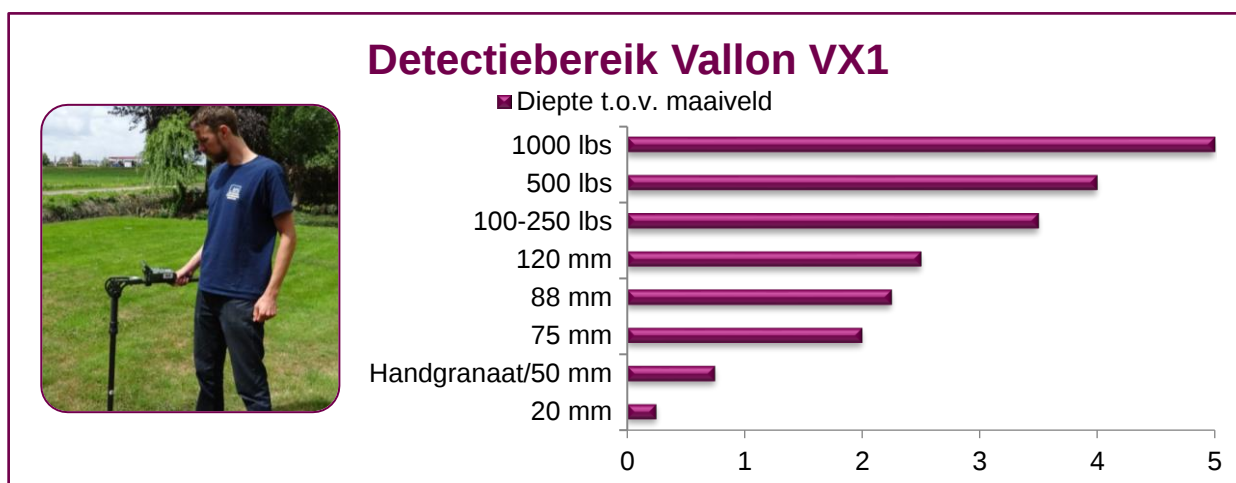

figuur 4.1: Vallon VX1 ferrous locator en maximale detectiediepte van verschillende OO artikelen

5 VERKLARING EN ADVIES

RPS verklaart dat alle werkzaamheden naar beste vermogen en geheel conform de geldende wet- en regelgeving alsook de binnen RPS geldende reglementen zijn uitgevoerd.


Middels dit proces-verbaal van oplevering geeft RPS de in de revisietekening aangegeven gebieden vrij voor alle aankomende grondroerende werkzaamheden tot de aangegeven diepte. Buiten de vrijgegeven gebieden bestaat nog steeds de kans dat er ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn. Voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden buiten het vrijgegeven gebied wordt daarom geadviseerd opsporingswerkzaamheden uit te laten voeren.

Bijlage

1. Revisietekening OO



- Legenda**
- Onderzocht en vrijgegeven tot 2 m-mv
 - Geen interpretatie / detectie mogelijk vanwege aanwezige bosschage en jachthut
 - Geen detectie mogelijk vanwege aanwezige bosschage
 - Interpretatie detectedata niet mogelijk vanwege hekwerk
 - Niet vrijgegeven significante verstoringen vanwege archeologische beperkingen
 - Aangetroffen OO
 - NAP hoogte maaiveld

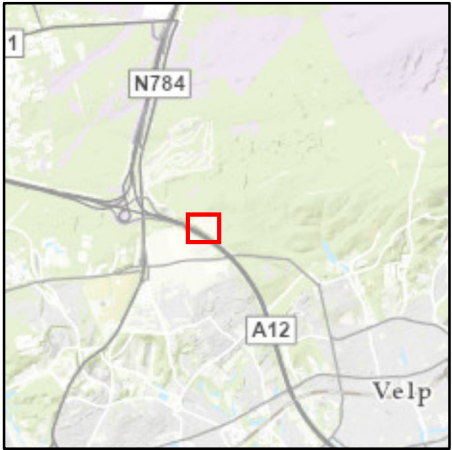

Regionale ligging 1:100.000

Coördinaten in RD

Project:	OOO Islamitische Begraafplaats Arnhem	Gecontroleerd door:	E. v.d. Meiracker
Opdrachtgever:	Van Kerkhof Maatwerk in RO	Functie controleur:	Namens D. Denman Operationeel directeur
Omschrijving:	Revisietekening OO	Handtekening:	

 Explosives Engineering Services Prins Mauritsstraat 17, 4141 JC Leerdam Postbus 75, 4140 AB Leerdam T +31 88 - 99 04 800 W www.rpsgroup.com	Projectnummer:	EES1378NL	Formaat:	A3
	Projectleider	D. Denman	Schaal:	1:1.400
	Auteur:	T. Hebbink	Status:	Definitief
	Fase:	Opsporing	Datum:	12-8-2022
	Logo opdrachtgever:			

Blad:	1 van 1	Wijz:
Numer:	EES1378NL-001	

Bijlage

2. OO Overgaveformulier



Explosives Engineering Services Netherlands

Projectgegevens

Project Nr	EES137BNL
UO Nr EOD	20221463
Opgave form Nr	2
Overgave form Nr	1
Plaats	Amhem
Adres	Schelmseweg
Locatie VTUS	52°00'41" ZN 5°56'28" BE
Geïdentificeerd door	M (Marvin) Asveld

[illegible]

Overdracht

OO opgave_overgave formulier_2 1.xlsx



OO Opgave / Overgave formulier

Explosives Engineering Services Netherlands

Projectgegevens

Project Nr. : EES1378NL
UO Nr. EOD : 20221453
Opgave form Nr. : 3
Overgave form Nr. : 2
Plaats : Arnhem
Adres : Schelmsseweg
Locatie VTVS : 52°00'41.2"N 5°56'28.6"E
Geïdentificeerd door : John Neggers / Marvin Asveld

OO

Aantal	Soort / Subsoort en kaliber	Nationaliteit	Wapeningstoestand	Type ontsteker	Explosieve inhoud (NEM)	Coördinaten (RD)		Diepte aangetroffen	Veiliggesteld in:	B Categorie
						X	Y			
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192853,59	447333,34	0,6 m-mv	VTVS	8
6	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192842,03	447492,00	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192842,03	447492,00	0,6 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192875,65	447875,65	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192874,35	447556,71	0,7 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192945,95	447295,26	0,7 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192945,88	447328,12	0,7 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192720,77	447532,28	1 m-mv	VTVS	8
2	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192726,69	447541,67	0,6 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192651,44	447511,80	0,6 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192652,11	447493,49	0,7 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192908,17	447277,34	0,8 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192910,34	447305,92	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192914,80	447308,75	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192647,68	447499,21	0,7 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192646,11	447502,74	0,7 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192865,72	447562,08	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192904,60	447502,52	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192887,37	447485,59	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192887,95	447435,52	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr licht	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192704,48	447466,92	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192820,72	447345,01	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192882,45	447354,50	0,9 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192880,64	447292,59	0,7 m-mv	VTVS	8
9	Geschutmunitie / 25 pdr rook	Engels	Verschoten / Leeg	TSB No 221	n.v.t.	192937,54	447352,98	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 20 mm PB met LSP	Engels	onverschoten	n.v.t.	n.v.t.	192712,29	447542,95	1 m-mv	VTVS	8
1	Geschutmunitie / 75 mm BPG	Amerikaans	Verschoten	M66	0,065	192649,64	447485,19	0,6 m-mv	VTVS	3
1	Geschutmunitie / 8 cm mortier	Duits	Verschoten / gedechargeerd	n.v.t.	0,075	192844,14	447361,47	0,4 m-mv	VTVS	1
48	Geschutmunitie / rest. 2 cm huls	Duits	Verschoten / Leeg	n.v.t.	n.v.t.	192834,13	447385,81	maaiveld	VTVS	2
130	Geschutmunitie / rest. 2 cm huls	Duits	Verschoten / Leeg	n.v.t.	n.v.t.	192649,73	447495,02	1 m-mv	VTVS	8
1	Rookpot 25 pdr.	Engels	Leeg	n.v.t.	n.v.t.	192667,44	447438,29	1,5 m-mv	VTVS	8
1	Rookpot 25 pdr.	Engels	Leeg	n.v.t.	n.v.t.	192842,03	447492,00	1 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192667,44	447438,29	1 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192921,79	447519,18	1,3 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192915,80	447540,66	1 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192771,45	447561,59	0,8 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192879,44	447399,11	1,2 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192856,79	447530,64	1 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192785,93	447402,06	1,5 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192881,52	447372,75	0,8 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192902,15	447334,64	1,2 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. M126-A1	Amerikaans	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	192712,29	447542,95	1 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. buster m1	Amerikaans	Verschoten	n.v.t.	n.v.t.	192856,79	447530,64	1 m-mv	VTVS	8
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. buster m1	Amerikaans	Verschoten	n.v.t.	n.v.t.	192785,93	447402,06	1,5 m-mv	VTVS	3
1	Ontstekingsinrichtingen / rest. buster m1	Amerikaans	Verschoten	n.v.t.	n.v.t.	192902,15	447334,64	1,2 m-mv	VTVS	3
2	Klein kaliber munitie	Diverse	verschoten / onverschoten	n.v.t.	n.v.t.	192652,81	447492,75	maaiveld	VTVS	8
Totaal					Totaal KG					
237					0,14					

Overdracht

Afgedragen door:	Locatie :	Datum :	Tijdstip :	Handtekening:
M. Asveld	Arnhem	27-7-22	10.00	
Overgenomen door:	Rang:	Dienstnummer:	Eenheid:	Handtekening:
CPH Bredewold	Sgt 1	27-7-22	11:55	
Aanwezige politie:	Rang:	Dienstnummer:	Eenheid:	Handtekening:
RCG Machielsens	Bergadrien	61M10231	oost-Nederland	
