

Asbestinventarisatierapport 2018012 versie 2

Asbestinventarisatierapport 2018012 versie 1 komt hiermee te vervallen



Projectidentificatiecode:	2018012 versie 2
Omschrijving:	2 Bedrijfspannen
Reikwijdte van de inventarisatie:	Gehele bouwwerk of gehele object
Adres:	Veersteeg 1
Postcode:	5331 PM
Plaats:	Kerkdriel

1 Titelblad

Opdrachtgever: Van Wanrooij Projectontwikkeling BV
Adres: Postbus 4
Postcode/plaats: 5386 ZG Geffen

Uitvoerend inventarisatiebureau:
Jagers Asbestinventarisatie bv
Heegterstraat 8
5386 CP Geffen
p/a Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen

Tel.: 073-5037094
E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl
Website: www.jagers-asbestinventarisatie.nl
KvK: 17134867

Cl: Eerland Certification B.V.
Certificaatnummer: 07-D070113
SCA-code: 07-D070113.01

Inventarisatielocatie:

Projectidentificatiecode: 2018012 versie 2
Omschrijving: 2 Bedrijfspanen
Adres: Veersteeg 1
Postcode: 5331 PM
Plaats: Kerkdriel

Reikwijdte van de rapportage

- ☒ Gehele bouwwerk of gehele object
- ☐ Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
- ☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom bouwwerk of object

Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- ☐ Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- ☐ Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☒ Voor volledige renovatie of totaalsloop

Inventarisatie uitgevoerd door: [REDACTED] (DIA-nummer: 04E-221020-140609)

Datum van uitvoering: 10-01-2018 en 30-05-2023

Rapportage uitgevoerd door: [REDACTED]

Interne autorisatiedatum: Rosmalen, 06-06-2023

Technisch verantwoordelijke: [REDACTED] (DIA-nummer: 04E-130621-140723)

Deze rapportage is 3 jaar geldig na autorisatiedatum.

LAVS-Asbestnummer: LAVS-ASBEST-0316059

Activeringscode: ddfa25ba-d872-4870-ad24-a6d1a4cf430c

Inhoudsopgave

1	Titelblad	2
2	Samenvatting	4
2.1	Totaaloverzicht.....	5
2.2	Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek.....	6
3	Omschrijving van de opdracht	7
3.1	Ter beschikking gestelde informatie/documenten	7
3.2	Omschrijving van opgedragen werkzaamheden	7
3.3	Inventarisatie.....	8
4	Methoden	9
5	Resultaten	10
5.1	Resultaten van het deskresearch	10
5.2	Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen	10
5.3	Analyseresultaten van bemonsterde materialen	10
5.4	Aangetroffen asbestverdachte materialen:	11
5.5	Niet-geïnventariseerde plaatsen	21
6	Indeling in risicoklassen bij verwijdering	22
6.1	Algemeen	22
6.2	Voorstel	22
6.3	Uitvoering	22
7	Conclusies en aanbevelingen	23
8	Omschrijving rapportages	24

Bijlagen:

1. Plattegrond van de locatie van het gebouw of object
2. Tekening(en) van de asbesthoudende en/of monsterlocaties
3. Deskresearch
4. Analyseresultaten van materialen
5. Validatiemetingen conform SC-548
6. Verplichtingen van de opdrachtgever
7. Evaluatieformulier
8. SMA-rt risicoclassificatie
9. Kopie procescertificaat

Het rapport is alleen geldig in volledig kleurenformaat inclusief bijlagen, tekeningen en foto's.
Wij rapporteren alleen aan de opdrachtgever. Indien derden informatie willen wordt dit alleen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verstrekt.

2 Samenvatting

Versie 1:

Er is op 10-01-2018 een asbestinventarisatie uitgevoerd van '2 Bedrijfspannen' aan Veersteeg 1, te Kerkdriel.

Versie 2:

Op 02-05-2023 is door de opdrachtgever de aanvraag gekomen voor een update van het asbestinventarisatierapport 2018012 versie 1 omdat deze verouderd is.

Op 30-05-2023 is door Jagers Asbestinventarisatie een aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Hierbij is geconstateerd dat een deel van het dak van de oude champignoncellen schuur is ingestort. De asbesthoudende golfplaten liggen op het asbesthoudende golfplaten plafond van champignon cel 6.

De oude champignoncellen schuur is niet meer in gebruik.

Specificatie van de reikwijdte van het onderzoek:

De reikwijdte van de inventarisatie betreft 'Gehele bouwwerk of gehele object'.

De 2 bedrijfspannen zijn geheel onderzocht inclusief 5 m¹ rondom of tot de erfgrens.

Specificatie van de geschiktheid van het onderzoek:

De geschiktheid van het rapport betreft 'Voor volledige renovatie of totaalsloop'.

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van de onderzochte bedrijfspannen de aangetroffen asbesthoudende toepassingen te saneren.

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Er is geen enkele uitsluiting of beperking voor deze inventarisatie van toepassing.

2.1 Totaaloverzicht

Tijdens het onderzoek zijn de volgende bronnen aangetroffen:

Bron-nr.	Monster-nr.	Omschrijving	Aantal	Locatie	Asbesthoudend Ja/Nee	Risico-klasse
1	MM01	Golfplaat	1 x 780 m ²	Oude champignoncellen schuur, golfplaten op het dak	Ja	2
2	ViMM01.1	Nokstukken	1 x 36,5 m ¹	Oude champignoncellen schuur, nokstukken op het dak	Ja	2
3	MM02	Golfplaat	1 x 180 m ²	Oude champignoncellen schuur, golfplaten als plafond in 2 champignoncellen	Ja	2
4	MM03	Golfplaat	1 x 56 m ²	Oude champignoncellen schuur, golfplaten op het dak van de aanbouw	Ja	2
5	MM04	Kit	1 x 14 stuks	Oude champignoncellen schuur, kit van de beglazing	Nee	n.v.t.
6	ViMM01.2	Golfplaat	1 x 30 m ²	Oude champignoncellen schuur, losse stukken golfplaat op de zolder	Ja	2
7	MM05	Bitumen	1 x 160 m ²	Oude champignoncellen schuur, Bitumen over de naden van de asbesthoudende golfplaten plafonds	Nee	n.v.t.
8	MM06	Bitumen	1 x 9 stuks	Oude champignoncellen schuur, Bitumen boven de kozijnen in de spouwmuur	Nee	n.v.t.
MM	Materiaalmonster					
ViMM	Visueel gelijk aan monster					

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in '2 Bedrijfspanen'. Deze beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek worden bij hoofdstuk 2.2 beschreven.

Het asbestinventarisatierapport zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een sloopmelding of een omgevingsvergunning.

Uitgebreide informatie per bron is beschikbaar in hoofdstuk 5.4.

2.2 Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek

Voorafgaand aan totaalsloop en/of werkzaamheden in de ruimtes die tijdens de inventarisatie niet toegankelijk waren of alleen met destructief onderzoek toegankelijk zijn geldt het volgende:

De vergunningverlener is verplicht bij een vermoeden van verborgen asbest tot een aanvullende inventarisatie.

Ook veiligheidsaspecten zoals hoogte of niet toegankelijke ruimtes zijn een reden om de inspectie te beperken.

Er zijn tijdens deze inventarisatie geen items van toepassing die niet toegankelijk waren of alleen met destructief handelen.

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in de 2 bedrijfspanden.

Er hoeven geen ruimten en bronnen aanvullend geïnspecteerd worden.

Onderzoek van losse inboedel, evenals asbestbronnen in de bodem, (chemisch) afval, vallen buiten het kader van dit onderzoek.

Jagers Asbestinventarisatie bv is alleen verantwoordelijk voor haar eigen uitgevoerde activiteiten en niet aansprakelijk voor een andere werkwijze bij het verwijderen van eventueel asbesthoudend materiaal dan is beschreven in dit rapport of in de bijlage welke als onderdeel zijn van de rapportage.

Vervolgwerkzaamheden zoals sloop en/of renovatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Jagers Asbestinventarisatie bv.

3 Omschrijving van de opdracht

3.1 Ter beschikking gestelde informatie/documenten

De volgende bronnen zijn ten behoeve van het deskresearch beschikbaar gesteld:

- interview
- bag viewer
- tekening
- asbestinventarisatierapport

Zie specificatie in bijlage 3.

3.2 Omschrijving van opgedragen werkzaamheden

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen van '2 Bedrijfspanen' aan Veersteeg 1, te Kerkdriel.

Er is op 22-12-2017 opdracht overeengekomen voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie op de locatie Veersteeg 1, te Kerkdriel. Het betreft een inventarisatie voor de gehele locatie zonder destructieve handelingen.

Op 10-01-2018 is door [REDACTED] (DIA-nummer: 51E-171217-411206) een visuele inspectie uitgevoerd van '2 Bedrijfspanen' aan Veersteeg 1, te Kerkdriel.

Op 30-05-2023 is door [REDACTED] (DIA-nummer: 04E-221020-140609, een aanvullend onderzoek uitgevoerd.

3.3 Inventarisatie

Alle ruimtes zijn geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest.

Er is géén destructief onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat er op de locatie asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.

De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van asbesttoepassingen tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden kunnen zijn, die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn. Deze bevinding wordt aangeduid met 'een redelijk of geen redelijk vermoeden'.

Gebouwbeschrijving:

Aantal bouwlagen:	1
Afdekplaat watermeterput:	Aluminium
Binnenwanden:	Staalplaat en gemetseld
Boeidelen:	Hout
Dak:	Staalplaat en asbestverdachte golfplaten
Dakconstructie:	Hout en ijzer
Dakkapel:	Geen
Drempels:	n.v.t.
Eindpijp:	Geen
Hemelwaterafvoer:	PVC, Zink
Kruipruimte riolering:	PVC
Panelen:	Geen
Plaats verwarmingsinstallatie:	Cv-ruimte
Plaats vloerluik:	Geen
Plafonds:	Staalplaat en golfplaten
Schoorsteen:	Geen
Type Bouw:	Systeembouw en halfsteens met spouwmuur
Type vloer:	Beton
Type vloerluik:	n.v.t.
Vensterbanken:	n.v.t.
Ventilatiekanaal keuken:	n.v.t.
Ventilatiekanaal toilet:	n.v.t.
Ventilatiekanalen badkamer:	n.v.t.
Verwarmingsinstallatie:	Ketel
Vloerbedekking:	n.v.t.

Voor een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 5.

4 Methoden

Historisch onderzoek en deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse heeft een historisch onderzoek plaatsgevonden. Aan de opdrachtgever is gevraagd om aanwezige bouwkundige en installatietechnische gegevens zoals bestekken, tekeningen en eventuele (eerder gemaakte) onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen.

Onderzoek ter plaatse

Via een globale schouwing wordt een idee verkregen van de actuele en globale staat van het gebouw (dit kan ook reeds in offertestadum zijn uitgevoerd). Beoordeeld wordt of het deskresearch of ontvangen tekeningen overeenkomen met de huidige staat; zo niet, dan wordt dit aangepast in deze fase. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het object voor inspectie, of wanneer het object niet voldoet aan de vooraf opgegeven kenmerken, wordt eerst contact opgenomen met de klant alvorens tot inventarisatie over te gaan.

Middels een systematische volgorde van doorlopen van het gebouw (bijvoorbeeld van boven naar beneden) worden alle ruimten geschouwd. Elke geschouwde ruimte wordt op tekening aangevinkt. Asbestverdachte materialen worden aangegeven op tekening en in het werkplan ingevoerd. Hoeveelheden, bereikbaarheid en de locatieomstandigheden worden vastgelegd. Ondersteuning van visuele waarneming wordt gedaan met behulp van foto's.

Na een volledig beeld te hebben van de situatie op asbestgebied wordt een nacontrole uitgevoerd of materialen voldoende gefixeerd zijn en geen emissie veroorzaken ten gevolge van bemonstering. Beoordeeld wordt of hoeveelheden juist zijn vastgesteld en er geen ruimten zijn overgeslagen. Beperkingen worden bepaald als ontoegankelijkheid, bereikbaarheid en in het gebruik zijn van de ruimte.

Indien de opdrachtgever of gebruiker aanwezig is, wordt er aangegeven wat er op dat moment bekend is op basis van visuele waarneming en ervaring. De kwaliteit van de opgedragen inventarisatie wordt gecontroleerd conform het kwaliteitssysteem. Afspraken omtrent rapportage of verdere gang van zaken worden aangetekend. Mogelijke blootstelling aan asbest wordt, indien van toepassing, aangegeven of er worden de nodige maatregelen getroffen. Dit gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever c.q. eigenaar van het pand.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de eigendommen van de opdrachtgever.

Monstername

Bemonsteringsplan wordt opgesteld op basis van bereikbaarheid en veiligheid. Tijdens monstername van asbestverdachte materialen zijn door de monsternemer persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen en is, indien nodig, gebruik gemaakt van een stofzuiger, welke is voorzien van een Hepa-filter.

Het aantal te nemen monsters is afhankelijk van het aantal asbestverdachte materialen. Per type materiaal wordt minimaal één monster genomen. Alle bemonsterde locaties worden ingekapseld ter voorkoming van asbestemissie.

Analyse van de monsters

Alle door Jagers Asbestinventarisatie bv genomen materiaalmonsters worden conform NEN 5896 geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten van de analyse worden door het laboratorium vastgelegd in een analysecertificaat. Hierop staan of de aangeboden monsters asbest bevatten, om welke soort(en) asbest het gaat, hoe groot het massapercentage asbest is en of dit hechtgebonden of niet-hechtgebonden is.

Asbestinventarisatierapport

De onderzoeks- en analyseresultaten worden in het asbestinventarisatierapport samengevat. Van iedere asbestbron worden foto's in de rapportage opgenomen. De locaties van de asbestbronnen worden in tekeningen weergegeven en de risico-indeling van de verschillende asbestbronnen wordt toegevoegd in de rapportage.

Risicoclassificatiesysteem SMA-rt

Ten behoeve van het nemen van maatregelen tijdens het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen vindt een risicoklasse-indeling plaats middels het SMA-rt systeem. Dit systeem is ontwikkeld door het ministerie van SZW en wordt eveneens gebruikt door de Arbeidsinspectie en certificerende instellingen.

5 Resultaten

5.1 Resultaten van het deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse zijn, door middel van een interview, historische gegevens opgevraagd aan de opdrachtgever. Hieruit zijn de volgende bijzonderheden naar voren gekomen welke een aanvullende waarde hebben op het onderzoek.

Op basis van de resultaten van het deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen.

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen.

Zie bijlage 3 voor meer deskresearch informatie.

5.2 Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen

Er zijn 6 monsters ter controle aangeboden aan het laboratorium.

In onderstaande tabel worden de aangetroffen materialen weergegeven:

Bron-nr.	Monster-nr.	Materiaal type	Analyseresultaten	Toepassing
1	MM01	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Oude champignoncellen schuur, golfplaten op het dak
2	ViMM01.1	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Oude champignoncellen schuur, nokstukken op het dak
3	MM02	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Oude champignoncellen schuur, golfplaten als plafond in 2 champignoncellen
4	MM03	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Oude champignoncellen schuur, golfplaten op het dak van de aanbouw
6	ViMM01.2	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Oude champignoncellen schuur, losse stukken golfplaat op de zolder

5.3 Analyseresultaten van bemonsterde materialen

In de volgende tabel is een overzicht gepresenteerd van de genomen asbestmonsters en de analyseresultaten:

Analyse-nr.	Monster-nr.	Beschrijving	Materiaal type	Massa percentage en soort asbest	Binding
A104856-001	MM01	Golfplaat	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Hechtgebonden
A104856-002	MM02	Golfplaat	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Hechtgebonden
A104856-003	MM03	Golfplaat	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Hechtgebonden
A104856-004	MM04	Kit	Kit	<0,1% geen asbest	n.v.t.
A219113-001	MM05	Bitumen	Bitumen	<0,1% geen asbest	n.v.t.
A219113-002	MM06	Bitumen	Bitumen	<0,1% geen asbest	n.v.t.

5.4 Aangetroffen asbestverdachte materialen:

Bronnummer	1
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Golfplaten op het dak
Hoeveelheid	1 x 780 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM01
Analysenummer	A104856-001
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Open lucht
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 1 Golfplaat Foto 2 Golfplaat	
	
Foto 3 Golfplaat	

Bronnummer	2
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Nokstukken op het dak
Hoeveelheid	1 x 36,5 m ¹
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	Visueel gelijk aan MM01 (ViMM01.1)
Analysenummer	A104856-001
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Open lucht
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
	
Foto 4 Nokstukken	
	
Foto 5 Nokstukken	

Bronnummer	3
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Golfplaten als plafond in 2 champignoncellen
Hoeveelheid	1 x 180 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM02
Analysenummer	A104856-002
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Containment
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 6 Golfplaat Foto 7 Golfplaat	
	
Foto 8 Golfplaat	

Bronnummer	4
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Golfplaten op het dak van de aanbouw
Hoeveelheid	1 x 56 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM03
Analysenummer	A104856-003
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Open lucht
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 9 Golfplaat Foto 10 Golfplaat	

Bronnummer	5
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Kit van de beglazing
Hoeveelheid	1 x 14 stuks
Materiaal type	Kit
Monsternummer	MM04
Analysenummer	A104856-004
Analyseresultaat	<0,1% geen asbest
Gebonden	n.v.t.
Bevestiging	Gekit
Beschadigd	Niet beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	n.v.t.
Verwijdering	n.v.t.
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 11 Kit Foto 12 Kit	

Bronnummer	6
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Losse stukken golfplaat op de zolder
Hoeveelheid	1 x 80 m ² (oppervlakte zolder)
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	Visueel gelijk aan MM01 (ViMM01.2)
Analysenummer	A104856-001
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Los
Beschadigd	Ernstig beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Containment
Bereikbaarheid	Slecht
Bijzonderheden	Het dak is in slechte staat en gedeeltelijk ingestort. Mogelijk kan door een beoordeling van een HVK (Hoger Veiligheids Kundige) de verwijderingsmethode gewijzigd worden naar een buitensanering.
 Foto 13 Golfplaat  Foto 14 Golfplaat	

Bronnummer	7
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Bitumen over de naden van de asbesthoudende golfplaten plafonds
Hoeveelheid	1 x 160 m ²
Materiaal type	Bitumen
Monsternummer	MM05
Analysenummer	A219113-001
Analyseresultaat	<0,1% geen asbest
Gebonden	n.v.t.
Bevestiging	Gesmeerd
Beschadigd	Niet beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	n.v.t.
Verwijdering	n.v.t.
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
	
Foto 15 Bitumen	
	
Foto 16 Bitumen	
	
Foto 17 Bitumen	

Bronnummer	8
Verdieping/ruimte	Oude champignoncellen schuur
Omschrijving	Bitumen boven de kozijnen in de spouwmuur
Hoeveelheid	1 x 9 stuks
Materiaal type	Bitumen
Monsternummer	MM06
Analysenummer	A219113-002
Analyseresultaat	<0,1% geen asbest
Gebonden	n.v.t.
Bevestiging	Ingemetseld
Beschadigd	Niet beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	n.v.t.
Verwijdering	n.v.t.
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 18 Bitumen Foto 19 Bitumen	
	
Foto 20 Bitumen	

Niet-asbestverdachte materialen:



Foto 21 | Staalplaat wanden en plafond



Foto 22 | Pvc riolering



Foto 23 | Staalplaten dak



Foto 24 | IJzeren spanten met isolatieplaten



Foto 25 | Stoomketel van 1999



Foto 26 | Dubbel glas



Foto 27 | Staalplaat wanden



Foto 28 | Pvc afvoer in de put buiten

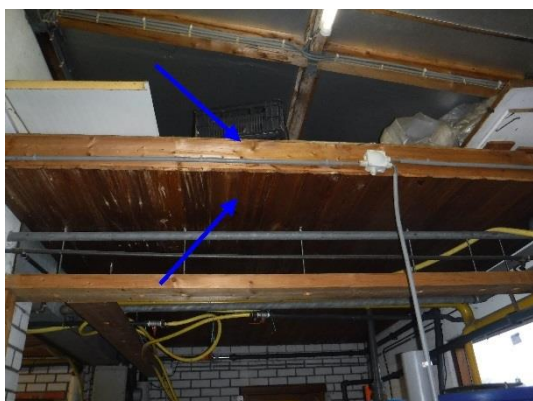


Foto 29 | Houten plafond en vloer



Foto 30 | Hard schuimisolatie rondom leidingen



Foto 31 | Harde Isolatieplaten



Foto 32 | Raamdorpels



Foto 33 | Houten boeiboord



Foto 34 | Pvc en zinken hemelwaterafvoeren

5.5 Niet-geïnventariseerde plaatsen

Er zijn tijdens deze inventarisatie geen items van toepassing die niet toegankelijk waren of alleen met destructief handelen.

6 Indeling in risicoklassen bij verwijdering

6.1 Algemeen

Het verwijderen van de asbesthoudende materialen moet door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden. Genoemd bedrijf dient in het bezit te zijn van een geldig procescertificaat. Tijdens de werkzaamheden dient het bedrijf alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de omgeving en het milieu te beschermen.

6.2 Voorstel

Indien het bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd dient het aanwezige asbesthoudend materiaal vooraf gesaneerd te worden. Er dient vooraf een sloopmelding of een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze dient op locatie aantoonbaar te zijn, anders is het asbestsaneringsbedrijf niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de saneringswerkzaamheden dient er altijd een persoon aanwezig te zijn met een DTA-A certificaat.

6.3 Uitvoering

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn een aantal technieken voorgeschreven. De methode hangt af van de locatie en de toepassing van de asbestbron. De werknemers dragen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een wegwerpoverall en adembescherming met P3-filter.

Openluchtsituatie

De openluchtsituatie wordt toegepast bij asbestverwijdering in open lucht en bij risicoklasse 1 verwijderingen. Stofemissie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door middel van bevochtigen, impregneren en puntafzuiging.

Verwijderen met behulp van Glove-Bag

Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove-Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveusezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In deze folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

Verwijderen in containment

Het verwijderen in containment is een van de omgeving afgezonderde ruimte. Alle toegangen worden dichtgeplakt, eventueel wordt een tijdelijke wand geplaatst. Er wordt onderdruk gecreëerd en een speciale gecontroleerde toegang gemaakt. De vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd door een pompinstallatie. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden volgt een vrijgavemeting conform NEN 2990. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

7 Conclusies en aanbevelingen

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van de onderzochte bedrijfspanden de aangetroffen asbesthoudende toepassingen te saneren.

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Er is geen enkele uitsluiting of beperking voor deze inventarisatie van toepassing.

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in '2 Bedrijfspanden'. Deze beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek worden bij hoofdstuk 2.2. beschreven.

Wij achten bij werkzaamheden aan de beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek bij hoofdstuk 2.2. een aanvullende inventarisatie niet noodzakelijk.

Er is géén destructief onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate bestekgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.

Door het aangaan van de opdracht hebben wij ons verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van ons, maar ook van factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.

Uiteraard horen wij altijd graag of dat wij een goed product hebben afgeleverd.

Mocht achteraf blijken dat er tijdens sloop of verwijdering van asbest nog onvoorziën asbest wordt aangetroffen, verzoeken wij u het bijgevoegde evaluatieformulier (bijlage 7) in te vullen en naar ons toe te zenden.

8 Omschrijving rapportages

Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Daarbij is onbelemmerde en passende toegang tot de ruimtes een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de inventarisatie. Als deze inventarisatie leidt tot “een redelijk vermoeden” op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie te worden uitgevoerd.


Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk).

Tijdens een inventarisatie door een specialist kan er iets over het hoofd worden gezien. Het blijft altijd mogelijk dat, ondanks dit met zorg samengestelde asbestonderzoeksrapport, tijdens de sloop toch nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen.

In een gebouw kunnen meerdere verborgen ruimtes en/of schachten aanwezig zijn. Door het ontbreken van gedetailleerde tekeningen is het mogelijk dat dit tijdens onze inventarisatie niet is opgemerkt, of visueel en zonder destructief onderzoek niet is te achterhalen.


**Bijlage 1:
Locatie gebouw**

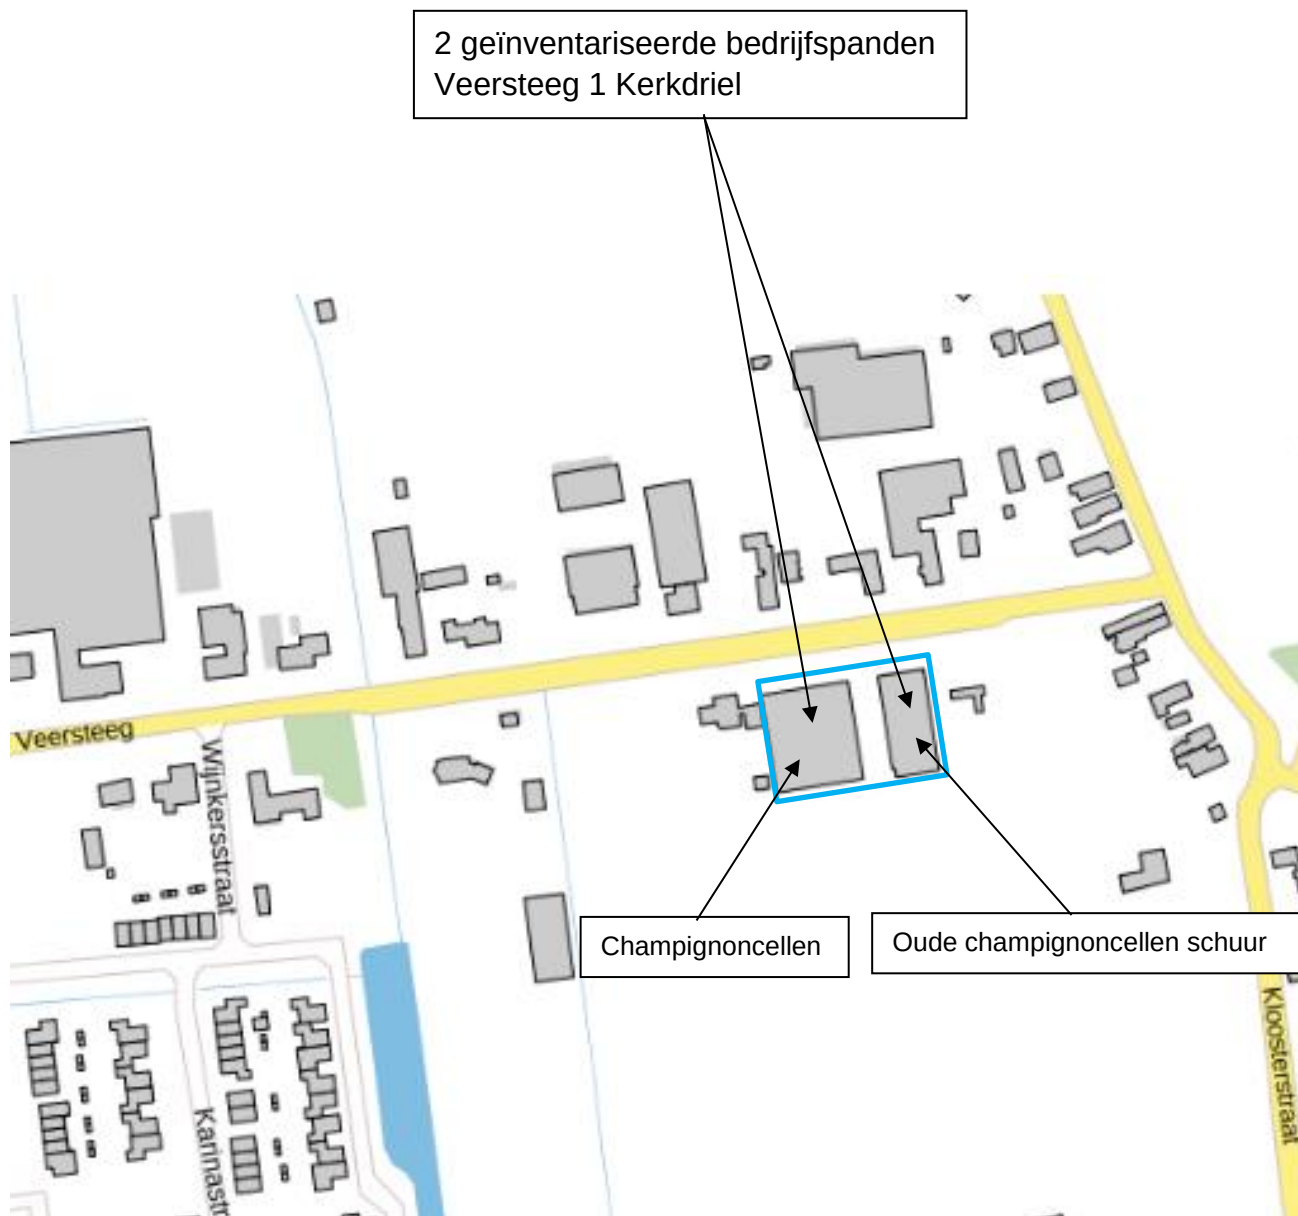

Bijlage 2:
Tekening asbesthoudende en/of monsterlocaties

Onderzoeksgebied

Plattegrond
champignoncellen

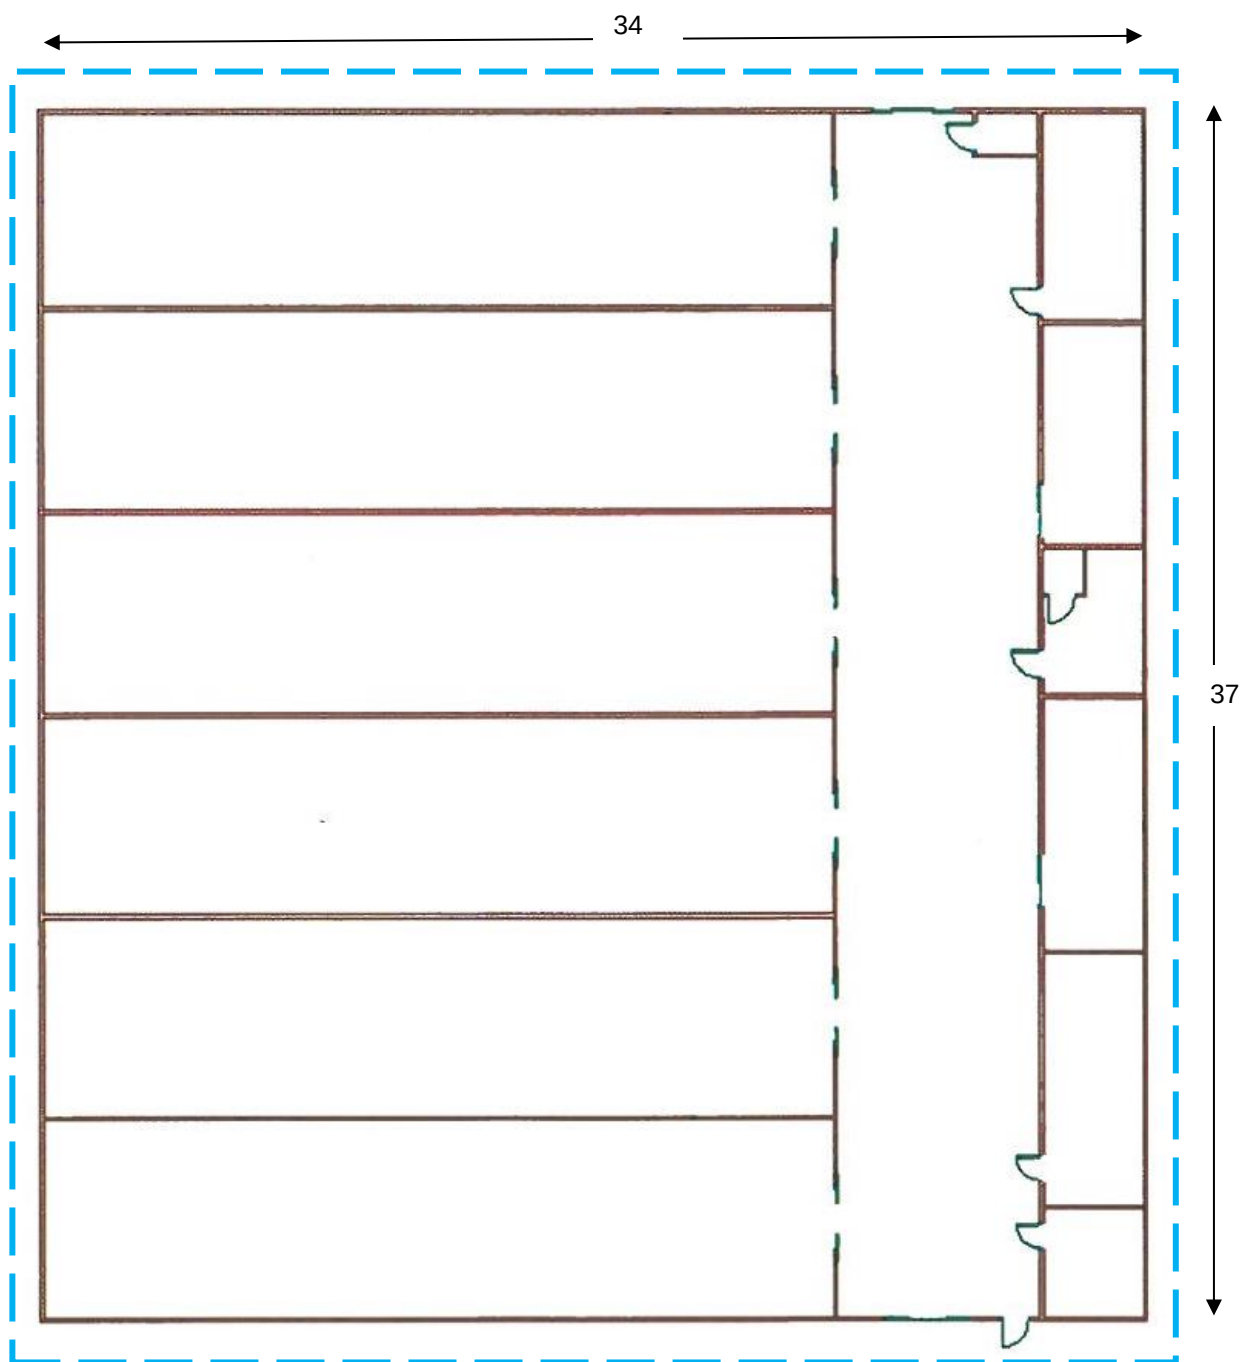

Geen asbestverdachte
materialen aangetroffen

Onderzoeksgebied

Plattegrond oude
champignoncellen schuur

56 m² asbesthoudende golfplaten
op het dak van de aanbouw
(bron 4 MM03)

160 m² asbestvrije bitumen op de
naden van het golfplaten plafond
(bron 7 MM05)

80 m² (oppervlakte zolder)
asbesthoudende golfplaten los op de
zolder van cel 6 (bron 6 ViMM01.2)


180 m² asbesthoudende golfplaten
als plafond in 2 champignoncellen
(bron 3 MM02)

14 stuks ramen met asbestvrije kit
(bron 5 MM04)

9 stuks asbestvrij bitumen in de
spouwmuur boven de ramen en
deuren (bron 8 MM06)

36,5 m¹ asbesthoudende nokstukken
op het dak (bron 2 ViMM01.1)

780 m² asbesthoudende golfplaten
op het dak (bron 1 MM01)

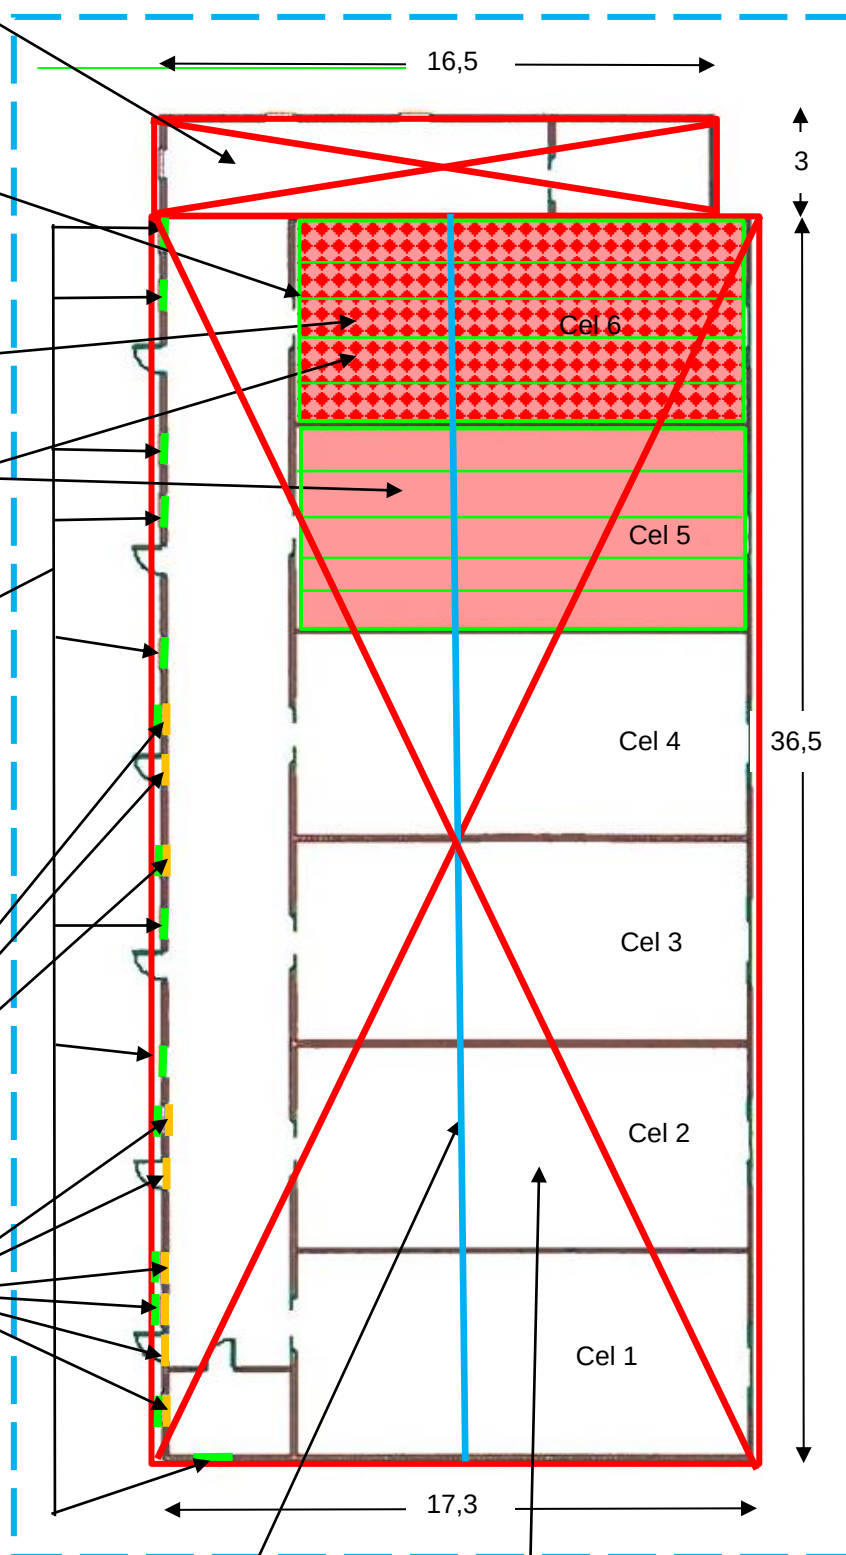

Bijlage 3: Deskresearch

De Oude champignon cellen schuur locatie was ten tijde van de inventarisatie niet in gebruik.

De beschikbare veiligheidsmiddelen voldoen aan de gestelde eisen.

De tijdens de inventarisatie aangetroffen situatie komt overeen met de situatie zoals opgenomen in het werkplan.

Deskresearchbronnen en verkregen informatie:

Informatiebron (Titel)	Informatie
Interview, Dhr. C. Robbemondt	Geen informatie over aanwezigheid van asbesthoudende materialen
Bag viewer	Kadastrale gegevens
Tekening	Indeling en afmetingen van de bedrijfspanden
Asbestinventarisatierapport 2018012 versie 1	d.d. 15-01-2018, door Jagers Asbestinventarisatie bv, SCA-code 07-D070113.01

Op basis van de resultaten van het deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen.

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen.

Zover bekend zijn er op de locatie niet recent asbestsaneringen uitgevoerd.

Bijlage 4:
Analyseresultaten van materialen



Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com
www.kiwa-inte.com

Jagers Asbestinventarisatie bv
T.a.v. mevr. N Jagers-Nesselaar
Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00004886.1
Datum rapportage	11-01-2018
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	eazzKP2Q
Uw referentie	2018012
Ons projectnummer	A104856
Projectomschrijving	Veersteeg 1 Kerkdriel
Ontvangst monsters	11-01-2018
Monsterneming door	Opdrachtgever (Dhr. R.A.T. Jagers)
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	11-01-2018
Analyse locatie	Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 2018012. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie <http://www.rva.nl>. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend,
i.o.



Dhr. A.H. Loete
Manager Laboratorium



Analyserapport

Rapportnummer: A00004886.1

Ons projectnummer: A104856

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype	Soort asbest	Massa (%)	Binding
A104856-001	MM01 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A104856-002	MM02 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A104856-003	MM03 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A104856-004	MM04 Kit	Kit	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.

*: <0.1% (niet aantoonbaar)

Jagers Asbestinventarisatie B.V.
Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00112526.1
Datum rapportage	31-05-2023
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	iPLlwjo4
Uw referentie	2018012
Ons projectnummer	A219113
Omschrijving opdrachtgever	Veersteeg 1 Kerkdriel
Ontvangst monsters	31-05-2023
Monsterneming door	Opdrachtgever (Jagers, Robert)
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	31-05-2023
Analyse locatie	Hongkongstraat 5 3047 BR Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 2018012. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

SGI Compliance Environmental Control is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door SGI Compliance Environmental Control uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie <http://www.rva.nl>. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het Hoofd Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@sgicompliance.nl onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend, i.o.



Mevr. ing. J. Pover
Hoofd Laboratorium



Analyserapport

Rapportnummer: A00112526.1

Ons projectnummer: A219113

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype *1 *3	Soort asbest	Massa (%)	Binding *2
A219113-001	MM05 bitumen	Bitumen	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A219113-002	MM06 Bitumen	Bitumen	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.

*: <0.1% (niet aantoonbaar)

*1 Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld.

*2 Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.

*3 Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovynyltegels, katten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

SGI Compliance Environmental Control | BTW NL813868634B01 | KVK 24370016 | IBAN NL36RABO0153273763 | BIC RABONL2U

Rapport PLM, Versie A2.5, 13 augustus 2021

pagina 2 van 2

Bijlage 5:
Validatiemetingen conform SC-548

Niet van toepassing

Bijlage 6: Verplichtingen van de opdrachtgever in overeenstemming met wet- en regelgeving

Appendix A

1. Algemeen

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3. De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

- a. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage en sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
- b. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen of verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling, dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;
5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De storbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit /Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006.

Par. 2 Asbestinventarisatie

Art. 3.1.b:

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 3.2.b:

Ook hier wordt weer gesproken over degene, die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 5:

Degene die de handelingen van par. 3 doet /laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt, vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene, die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene, die het asbest verwijdert.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

4. Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Art. 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Art. 4.54d. Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
4. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a. eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in Artikel 4.54a. eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Wet- en regelgeving

De volgende wetgevingen, of delen zijn van toepassing:

- Asbestverwijderingsbesluit dec. 2005, Staatscourant 704
- Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet juli 2006, Staatscourant 348
- Staatscourant 2016 nr. 64906, 30 november 2016
- Bouwbesluit Arbeidsomstandighedenwet
- Burgerlijk Wetboek
- Woningwet
- Wet Milieubeheer
- Bouwbesluit 2012

**Bijlage 7:
Evaluatieformulier**

Asbestinventarisatie	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	2018012 versie 2
Vrijgave datum	06-06-2023

Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorzien asbest	
Omschrijving	
Plaats	
Hoeveelheid	

Asbestverwijderingsbedrijf							
Naam							
SCA-code							
Naam		Handtekening					
Verzonden naar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Door(naam)							
Datum							
Paraaf							
Verzendlijst: 1=A/B Type A; 2=A/B Type B; 3=A/B onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever; 7=overig							

Bijlage 8: SMA-rt risicoclassificatie

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 januari 2018 om 08h37 (1049193)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018012]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Adres	Veersteeg 1, Kerkdriel
Projectcode	2018012
Projectnaam	Bedrijfspannen
Broncode	bron 1 en 4 (MM01 en MM03)
Bronnaam	Dakbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	836 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A104856-001 en A104856-003

Situatie

Bevestiging	Geschoefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 januari 2018 om 08h37 (1049195)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018012]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Identificatie

Adres	Veersteeg 1, Kerkdriel
Projectcode	2018012
Projectnaam	Bedrijfspannen
Broncode	bron 2 (ViMM01.1)
Bronnaam	nokstukken

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	36,5 m ³
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A104856-001

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
------------------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(1049195)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 12 januari 2018 om 08h37 (1049199)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018012]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Adres	Veersteeg 1, Kerkdriel
Projectcode	2018012
Projectnaam	Bedrijfspannen
Broncode	bron 3 (MM02)
Bronnaam	Golfplaten toegepast in gebouwen

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	180 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A104856-002

Situatie

Bevestiging	Geschoefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 05 juni 2023 om 13h22 (2375574)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018012].

Identificatie

Adres	Veersteeg 1, Kerkdriel
Projectcode	2018012
Projectnaam	Bedrijfspannen
Broncode	bron 6 (VIMM01.2)
Bronnaam	Overige golfplaten

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	80 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A104856-001

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Ernstig
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 20042023 (ingangsdatum 20-04-2023)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2375574)

**Bijlage 9:
Kopie procescertificaat**



Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070113

Jagers Asbestinventarisatie B.V.

Adres:	Heikampweg 1	Datum uitgifte:	20-04-2021
	5249 JX ROSMALEN	Vervaldatum:	20-04-2024
Telefoonnr:	+31 73 503-7094	Datum eerste uitgifte:	20-04-2012
Contactpersoon:	mevr. N. Jagers (Nathaly)	KvK-nummer:	17134867
		e-mail:	Info@jagers-asbestinventarisatie.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.

F. Smalt



Asbestinventarisatie



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070113.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladrijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1
