

Leemansweg 51
Postbus 5252
6802 EG Arnhem
Dr. Tel. 026-3844500
Dr. Fax. 026-4429410

Polman Milieu
t.a.v. De heer J.B. Wessels
Toermalijnstraat 6-2
7554 TX Hengelo

Rapportage visuele inspectie na asbestverwijdering

Landin NEN 2990:2005

rapportnummer:	50958-80658		V_insp.
product	Inspectie		
locatie	Schotkampweg 179 te Elspeet		
datum onderzoek	25 september 2008		
opdrachtgever	Polman Milieu		
inspecteur	W. Becker		
verrichte werkzaamheden	visuele inspectie na asbestverwijdering		
onderzocht ruimte/object	schuur		
referentie werkplan	062285		
Onderzoekseenheden visuele inspectie:			
Omschrijving	Oppervlakte (m ²)	# segmenten	
1. schuur	700	3	
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale grootte inspectiegebied	700 m ²		
Merkttype onderdrukapparaat			

Bronnen betreffende asbesthoudende bestanden / materialen

inventarisatie rapport, scheidert, DTA'er, werkplan

locatie/soort	materiaal	asbestsoort	hoeveel.	gewicht%	rechtgeb.
1. dak/om ventilatiekokers	glas/materiaal	chrysotiel	212 m ²	5-10	ja
2. dak	gipsbeton	chrysotiel	140 m ²	10-15	ja
3.					
4.					
5.					

3. Inspectie randvoorwaarden

aspecten	ja	nee	nvt	opmerking
1. Is elke plek in het container of de afgeschermd ruimte goed zichtbaar?	X			
2. Zijn kostbare producten in het saneringsgebied aanwezig?		X		
3. Zijn de materialen uwendig gereinigd, gefixeerd en/of dubbel en luchtdicht verpakt?			X	
4. Verzoeken plaatselijke omstandigheden beperkingen t.a.v. de visuele inspectie?	X			Op de volgende plaatsen zijn er beperkingen betreffende het uitvoeren van de visuele inspectie: dak van schuur, naden, kieren, spouw zoldervloer, diverse materialen binnen afgesloten en in de schuur: begroeiingen, diverse materialen, vloerisolatie
5. Is sanerings-/inspectiegebied sluitend? (Geldt niet bij buitensanering!)			X	
6. Is sanerings-/inspectiegebied voldoende droog?	X			
7. Zijn er nog asbesthoudende of andere vezelhoudende materialen aanwezig?		X		

8. Zijn er materialen of werkzaamheden in naaste omgeving van het sanerings-inspectiegebied die metingervisuele inspectie kunnen beïnvloeden?

	X	
--	---	--

II. Bouw- en constructie onderdelen saneringsgebied

	constructiedeel	Resultaten			ondergelegen oppervlakte	Coding en afsluiting
		hout	aangelegde delen	terrein		

11. dak/ventilatiekoers	+	houd	+ (2)	terrein	+ (2)	vloer
	+ (2)	bovenkant balk	+ (2)	terrein	+	zolder

15.

segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	opmerkingen
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

11. plafond (constructiedelen)	+	+	+ (2)								
--------------------------------	---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

12. kabelgoten en/of doorvoeringen											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. stopcontacten											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. kuisen											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. plinten											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. vloer	+ (2)	+									
----------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. machines, installaties											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. trap											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. sleger											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. verpakt materiaal	+	+	+								
-----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

14. maaiveld											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. terrein											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. zand		+	+								
----------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

17.											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

verklarend tekenen

* (2) in orde na aanvullende schoonmaak.

A. afgekeurd vanwege het aanwezig zijn van één of meerdere van de volgende zaken die verdere werkzaamheden kunnen veroorzaken; andere ruimte moet opnieuw worden geïnspecteerd.

18. niet inspecteerbaar

Er is geen asbestinventarisatie conform SC 540, maar wel conform B96, 5052.

Conclusie:

Bij de verrichte visuele inspectie zijn - na een aanvullende schoonmaak - geen asbestverdachte of als asbestbesmet te beschouwen materialen aangetroffen. Dit voorzover deze onderdelen vormen van de

In verband met aanwezige beperkingen in relatie tot de uitvoering van de inspectie wordt nadrukkelijk verwezen naar punt 4 van het onderdeel '1. Inspectie Randvoorwaarden'.

Amhem, 25 september 2008

Namens SGS Nederland BV / Environmental Services.

K. Beuker

Inspecteur/analist

R. Bos

Vestigingsmanager


Inspectie gecrediteerd onder
RA-inspectie, accreditatienummer: 0322

Copy of RAPPORTAGE_CERTIFICAAT_V0305-08-04, Rev. VI, Nr. 2 van 2

College bill project 50958-80059

Onderzoekslocatie: Schotkampweg 179 te Elspeet

Situatietekening

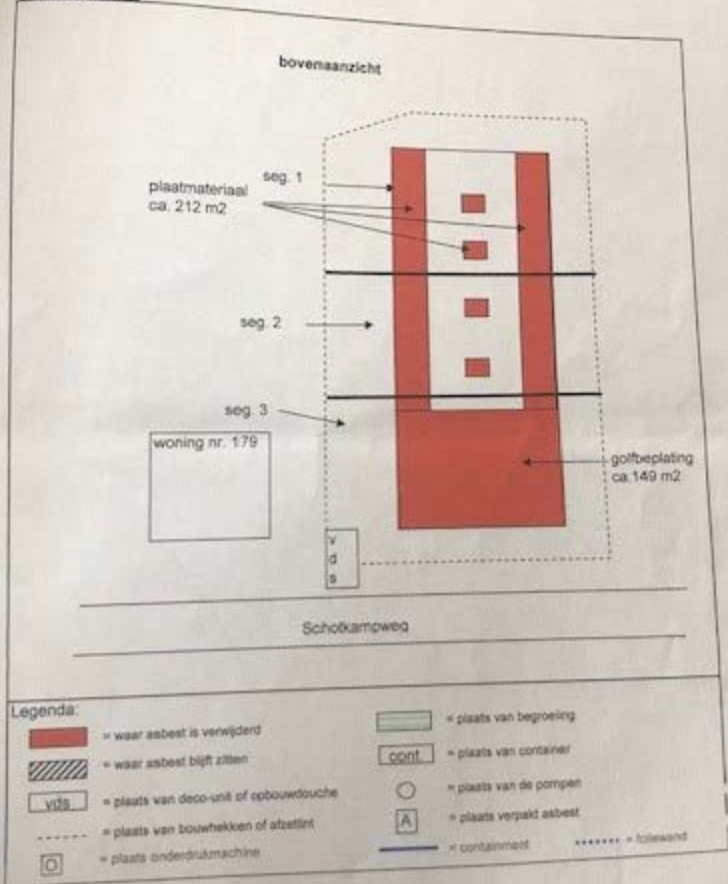



Analyses

Freek Foppen Asbestsanering
T.a.v. Dhr. F. Foppen

Ambachtsstraat 8
3882 BB Putten

Bosweg 10, 3811 LA Amstelveen
020 611 1111

VELDWERK CERTIFICAAT

www.findanalyses.nl

Freek Foppen 06 5991 316
f.f.foppen@findanalyses.nl

VISUELE EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

Doel van het onderzoek

De visuele eindcontrole heeft, conform NEN 2990, plaatsgevonden na het verwijderen van asbesthoudende materialen binnen- en/of buitensituatie. Het onderzoek had tot een doel vast te stellen of er nog visueel waarneembare restanten van het verwijderde asbesthoudende materiaal aanwezig waren.

algemene gegevens	Opdrachtgever / eigenaar	Dhr. Tol		
	Asbestverwijderingsbedrijf	Freek Foppen Asbestsanering		
	DTA'er	Dhr. F. Foppen		
	Referentie nummer werkplan	Schotkamp 179 te Elspeet		
	Inventarisatie bedrijf	Rapportnummer	P09-0618	Type A
	Gemeente	Sloopvergunning	Nunspeet	20090395
	Adres locatie bouwwerk / object	Schotkampweg 179 te Elspeet		
	Saneringsmethode	Buitensanering		
	Geïnspecteerde ruimte	Dak woning		
	Verwijderd materiaal (objecten / bronnen)			
	Dakbeschot			
	Asbestsoorten en gewichtspromille	CHR 2 - 5 %		
	Hechtgebondenheid	Hechtgebonden		

interne gegevens	Datum eindcontrole	21/04/2010		
	Aantal pagina's	3 (inclusief deze pagina's en situatieschets als bijlage)		
	Datum rapportage	21/04/2010		
	Certificaat	Veldwerk certificaat		
	Projectnummer Find Analyses	P2010-0922		
	Naam inspecteur(s)	Dhr. E. Drent		
	Aankomsttijd	Vertrektijd	13:50	14:50
	Inspectie tijd	13:50 tot 14:10		
	Norm	Conform NEN 2990, (eindcontrole na asbestverwijdering)		

Let op: Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Find Analyses.

opsteller	Dhr. E. Drent Inspecteur
-----------	-----------------------------

VISUELE EINDCONTROLE

Asbesthoudende toepassingen/materialen conform werkplan, inventarisatie rapport + mededelingen DTA-er

Nr.	Locatie/object/bodem	Verwijderd materiaal	Asbestsoort en hechtgebonden (ja/nee/onbekend)
1	Dak woning	Dakbeschot	Chrysotiel Ja
2			
3			
Indien buitensanering, totaal aantal m ² (vierkante meters) afgeschermd			250 m ²

Inspectie I binnen- en buitensanering (randvoorwaarden)

Locatie/object/bodem	Bevindingen	Opmerkingen
Is elke plek in het werkgebied goed verlicht?	Ja	Geen
Zijn losstaande producten in werkgebied aanwezig?	Ja	Sleiger
Zijn de nummers of objecten in het werkgebied gemakkelijk te bereiken?	Ja	Geen

Inspectie II buitensanering (randvoorwaarden)

Locatie/object/bodem	Omschrijving klimaat Zon/zware regen/middelregen/insolatie/vorst/scherm	Opmerkingen
Dak woning	Zonnig	Geen

Inspectie III binnen- en buitensanering (bouw- en constructiedelen waar asbesthoudende delen gemonteerd waren)

Inspectie II Binnen- en buitensanering (bouw- en constructiedelen waar asbestmoneren geen gemiddelde score)							
Nr.	Locatie/object/bodem	Resultaat Constructie deel	Resultaat Aangelegde delen	Resultaat Ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en/of beperkingen		
1	Dak woning	+	+	+	Visuele inspectie: Betreft saneren van 244m ² dakbeschot van het dak van de gehele woning. - Primaire voorwaarden: Sloopvergunning, werkplan en volledig asbestinventarisatie rapport aanwezig. - Bevindingen: Gebied volledig afgezet met lint. - Beperkingen en/of uitsluitingen: Onder de toplaag van grond is geen inspectie mogelijk. In naden en kieren is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Vuile ruimte van de decontaminatie unit is schoon en leeg.		
2							
3							
Locatie/object/bodem		1	Resultaat	2	Resultaat	3	Resultaat
Daken en nok		Ja	+				
Dakgoten		Ja	+				
Begroeiing en struiken		Ja	+				
Bomen							
Plassen (regen)							
Sloot en vijver							
Grind							
Gras							
Zand		Ja	+				
Aarde							
Inventaris							
Andere asbest bronnen aanwezig							
Overige:							

Verklaring symbolen:

+

= direct in orde bevonden

+(2)

= in orde bevonden na een aanvullende schoonmaak

A

= afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest verdachte resten; gehele locatie moet opnieuw gereinigd worden

"Bij controle van buitensanering dient de kolom "overige" te worden gedetailleerd met voor de betreffende locatie specifieke inspectiepunten.

Conclusie

Op grond van de resultaten van de visuele eindcontrole en eventueel het beschreven onderzoek mag de onderzochte ruimte WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen worden betreden.

BIJLAGE SITUATIESCHETS

Opdrachtgever:	Freek Foppen Asbestsanering
Inspecteur:	Dhr. E. Drent
Projectnummer opdrachtgever:	Schothkampweg 179 te Elspeet
Projectnummer Find Analyses:	P2010 - 0922
Adres inspectie:	Schothkampweg 179
Plaats inspectie:	Elspeet
Datum:	21/04/2010
Onderzocht gebied/huimte:	Dak woning

Businesspark Friesland-West 41 T 0513 - 653 318 E info@findinspectie.nl Friesland Bank 29 39 61 816
 5466 SL Heerenveen F 0513 - 683 656 I www.findinspectie.nl KvK Leeuwarden 01112559

Afgezet gebied 25m bij 10m



Woning

Legenda

■ Verijderd dakbeschoot
 Lint

V
 D
 S

Situatieschets visuele eindcontrole



Inspecties
 Milieukundig Adviesbureau



Analyses
 Environmental Consultancy
