

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**Pagina 1 van 4
24 juni 2019

Projectnummer PLM Lab 1807461
Projectnummer opdrachtgever 2019S016HOO

Opdrachtgever

Umias B.V.
Elzenweg 27
3421 TT Oudewater

Locatiegegevens

Adres van onderzoek Nedereindseweg 511 te Utrecht
Omschrijving locatie Schuren en omliggend terrein
Accreditatie Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Inventarisatierapport RPA-Advies
Type werk of sanering Buiten
Risicoklasse=2A

Inspectiegegevens

Datum controle 24-6-2019
Aankomsttijd inspecteur 15:30
Vertrektijd inspecteur 17:00

Onderdelen	Omvang	Resultaat
Visuele inspectie	1600 m2	Voldoet.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Conclusie

Op basis van de eindbeoordeling is geconcludeerd dat de onderzochte locatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in NEN2990:2012. De locatie is vrijgegeven.

DTA op locatie**Inspecteur**

Het onderzoek is onder de accreditatie van PLM Laboratorium uitgevoerd (I287). Eventueel bijgevoegde SEM-resultaten zijn onder de accreditatie van Stella Analyse B.V. uitgevoerd.

Deze rapportage bestaat uit diverse onderdelen die samen een onderbouwing vormen van de weergegeven conclusie of de betreffende werkplaats na asbestverwijdering voldoet aan de gestelde eisen. Als er onderdelen ontbreken of het resultaat is 'niet klaar', dan kan nog geen conclusie worden getrokken. De rapportage mag op geen enkele wijze worden aangepast of worden gereproduceerd, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van PLM laboratorium Services BV. Een duplicaat van de op locatie afgegeven definitieve rapportage zal worden toegestuurd. Als er wijzigingen aan de rapportage zijn aangebracht door PLM, is dit kenbaar gemaakt. De gewijzigde versie vervangt het eerder afgegeven certificaat. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van PLM Laboratorium Services BV van toepassing. Kenmerk: F701 Rapportagesjabloon versie 22-5-2019.

Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.

Pagina 2 van 4
24 juni 2019

Projectnummer PLM Lab 1807461
Projectnummer opdrachtgever 2019S016H00

Inspectieresultaten bronnen inventarisatierapport

Broncode	Omschrijving	Resultaat
M1RPA,M2RPA,M3RPA & M6RPA	Golfplaten, 752,6 m2, chrysotiel / crocidoliet, 10-15/2-5%, Hechtgebonden, Bron volledig weg.	Voldoet.
M4RPA & M5RPA	golfplaten & Windveren , 275 m2, chrysotiel, 10-15%, Hechtgebonden, Bron volledig weg.	Voldoet.
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Inspectieresultaten aangetroffen objecten e.d.:

Omschrijving	Aanwezig	Segment(en)	Waarneming	Conclusie
Daken en nok	Ja	1 T/m 7	Schoon	Akkoord
Dakgoten	Ja	1 T/m 7	Schoon	Akkoord
Bomen en struiken	Ja	1 T/m 7	Beperkt Inspecteerbaar	Akkoord
Plassen (regen)	Nee	-	-	-
Sloot en/of vijver	Nee	-	-	-
Grind	Ja	1 T/m 7	Beperkt Inspecteerbaar	Akkoord
Gras	Ja	1 T/m 7	Beperkt Inspecteerbaar	Akkoord
Zand en/of aarde	Ja	1 T/m 7	Beperkt Inspecteerbaar	Akkoord
Steigers, trappen, gereedschappen	Ja	1 T/m 7	Schoon	Akkoord
Deco, transitsluis- en routes	Ja	1	Schoon	Akkoord
Installaties	Nee	-	-	-

Werkgebied stofvrij	Voldoet voor buitensituatie.
Uitsluitingen	Achter, onder afplakkingen en onder alle toplagen.
Beperkt geïnspecteerd (<100%)	De toplaag, in naden en kieren.De spouwmuur is tot 5 cm inspecteerbaar.In het gras/struiken/bomen,In naden en kieren
Opmerkingen	-

Deelconclusie visuele inspectie


De betreffende locatie voldoet aan de eisen ten aanzien van de visuele inspectie. De visuele inspectie is een momentopname en beperkt tot waarneembare delen en waarneembaar asbest.

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.**

Pagina 3 van 4
24-6-2019

Projectnummer 1807461
Projectnummer opdrachtgever 2019S016HOO

Adres locatie Nedereindseweg 511 te Utrecht
Omschrijving Schuren en omliggend terrein
Oppervlak werkgebied/Containment 1600 m²
Aantal segmenten 7 segmenten
Volume containment m³

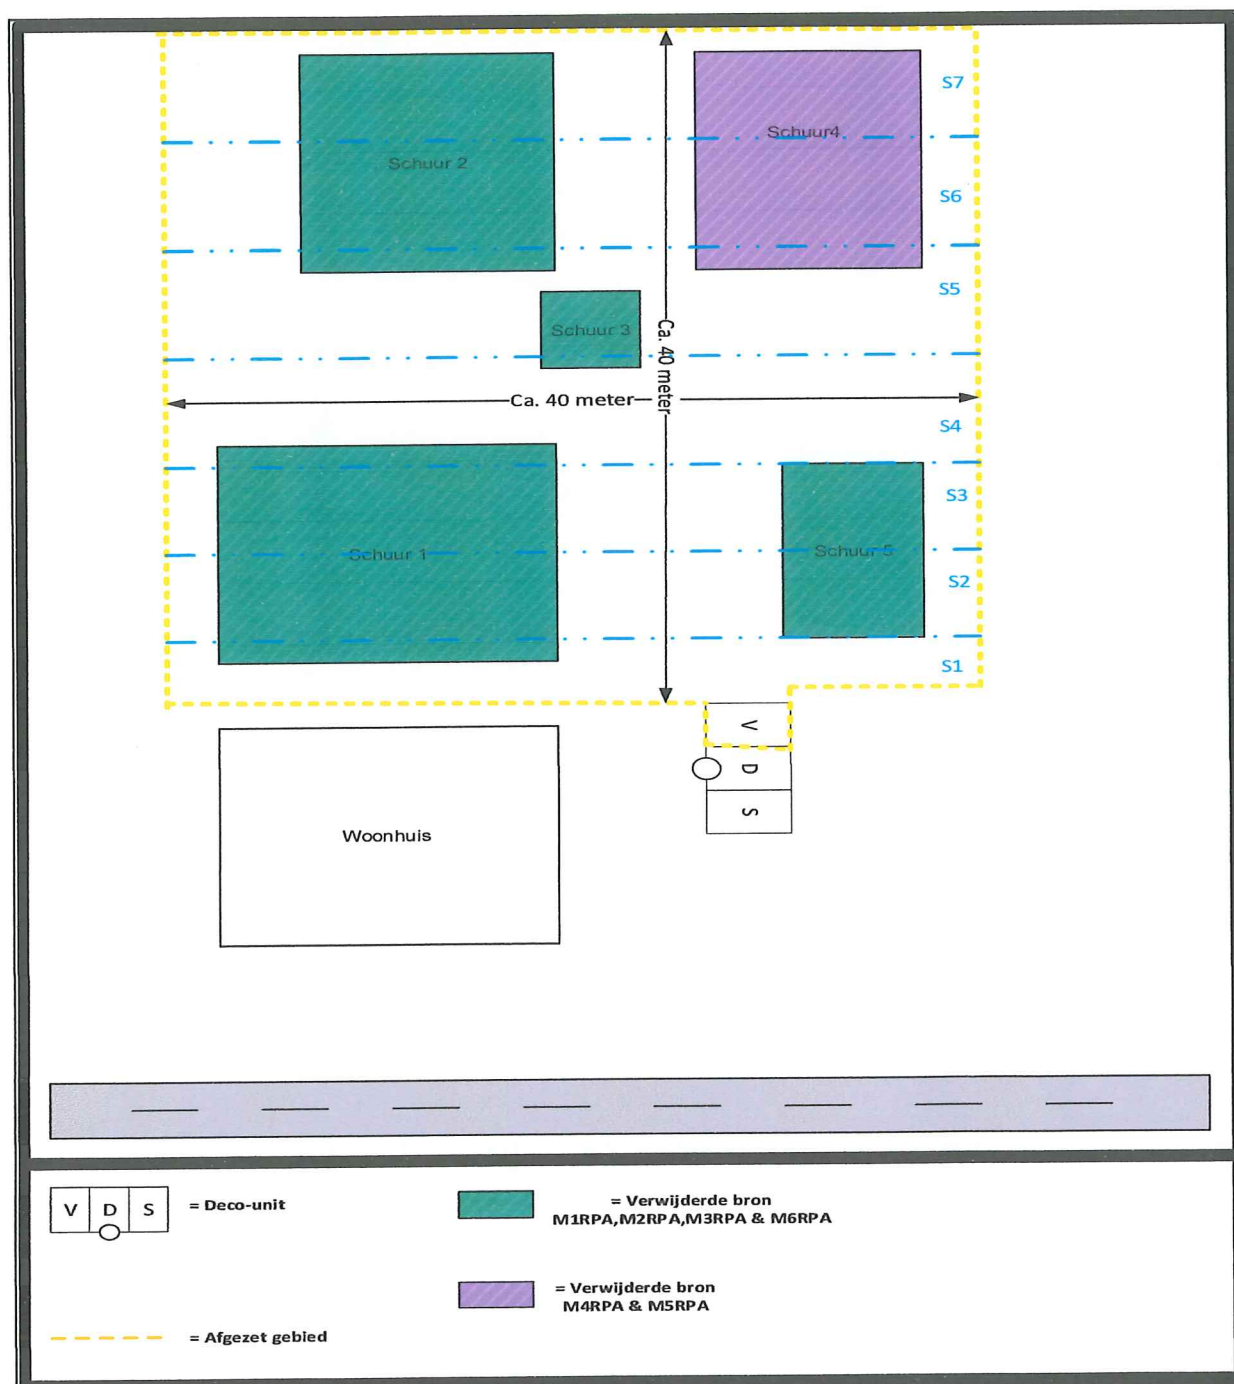

Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.

Pagina 4 van 4
24 juni 2019

Projectnummer PLM Lab
Projectnummer opdrachtgever

1807461
2019S016H00



Foto 1: Vooraanzicht



Foto 2: Deco-unit



Foto 3: Locatie verwijderde bron mm01

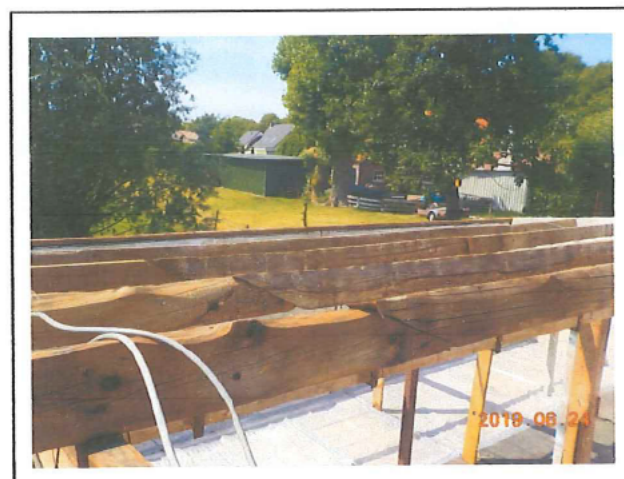


Foto 4: Locatie verwijderde bron mm6



Foto 5: Locatie verwijderde bron MM02, MM04 & MM05



Foto 6: Locatie verwijderde bron MM02

Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
conform NEN2990:2012.

Pagina 5 van 4
24 juni 2019

Projectnummer PLM Lab
Projectnummer opdrachtgever

1807461
2019S016H00



Foto 7: Overzichtsfoto



Foto 8: Overzichtsfoto



Foto 9: Locatie verwijderde bron MM03

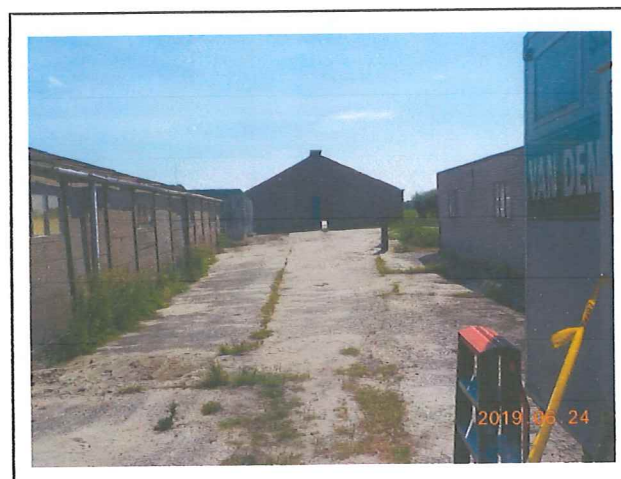


Foto 10: Overzichtsfoto



Foto 11: Overzichtsfoto



Foto 12: Overzichtsfoto
