

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

De eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de leveringsvoorwaarden conform RVOI 2001 van toepassing.

Opdrachtgever

Boon Asbestverwijdering B.V.
Barnseweg 124
3771 RP Barneveld

Rapportnummer

CBR11944
datum 4-09-2015
inspecteur C. Broek

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk: voormalige kapschuur
adres Rijndijk 5 Wijk bij Duurstede
aanvangstijd 11:31 uur eindtijd 12:30 uur
inspectietijd onder asbestcondities 00:10 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	bodem t.p.v. voormalige kapschuur	bron 150605-03: restanten golfplaat verspreid over 100m ² , hoeveelheid niet bekend	CHR	ja	10-15 /

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,
n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtsperscentage
+/- : sporen asbest aantoonbaar, +: duidelijk asbest aangetroffen, ++: zeer veel asbest aangetroffen

Risicoklasse en meetprotocol

risicoklasse(n) ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

Beperkingen en uitsluitingen

beperkingen:

naden en kieren - grove structuur van de betonplaten - alleen de toplaag van de bodem en zandgrond geïnspecteerd

uitsluitingen:

-

Resultaten(samenvatting)

visuele inspectie goedgekeurd
volledige eindcontrole ☐ ja ☒ nee: zie beperkingen

Rapportnummer

CBR11944

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) **wel** aan de eisen voldoet/voldoen zoals beschreven in art. 4.51a lid2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) **wel** zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening:

Ondertekening opdrachtgever:



C. Broek

Boon Asbestverwijdering B.V.

Rapportnummer

CBR11944

Doel

De eindcontrole heeft tot doel vast te stellen of in het onderzochte object/terrein nog visueel waarneembare resten van de gesaneerde asbesthoudende materialen aanwezig zijn en of het onderzochte object/terrein kan worden vrijgegeven voor het betreden zonder beschermende middelen. De eindcontrole heeft plaatsgevonden na het saneren van de asbesthoudende materialen.

Ingangscontrole

projectnummer opdrachtgever	2556
inventarisatierapport aanwezig	ja
valide sloopmelding aanwezig	ja
werkplan aanwezig	ja
sanering uitgevoerd conform werkplan en/of inventarisatierapport	Ja ☒ Nee ☐ reden:
weersgesteldheid	neerslag
conform NEN 2990	ja
aanvullingen en/of afwijkingen	de neerslag is minimaal en beperkt de inspectie niet - afwijkend inspectiegebied i.v.m. sloopwerkzaamheden

Inspectiegebied

totale oppervlakte inspectiegebied	101 m ²
------------------------------------	--------------------

Optionele kleefmonsternamen

aantal genomen kleefmonsters	n.v.t. stuks
------------------------------	--------------

Koppeling rapportage

☒ nee
☐ ja, namelijk aan rapportage(s) met kenmerk(en)

Rapportnummer

CBR11944

Visueel geïnspecteerde onderdelen

Segmentatie	1
Plafond/ dak (constructie)	N
Kabelgoten/ doorvoeringen	N
Ventilatiekanalen	N
Buizen/ leidingwerk	N
Verwarmingselementen	N
Kozijnen	N
Plinten	N
Vloer	+
Machines/installaties	N
Kruipruimte	N
Wanden/muren	+
Overige	N
Gereedschap/hulpmiddelen	N
(afval) transit-route	N
Vuile ruimte deco-unit	+
Aantal m2	101

Toelichting symbolen

toelichting keuze "overige": n.v.t.

+ direct in orde bevonden
+2 in orde bevonden na schoonmaak

A afgekeurd vanwege aantreffen van asbestrestanten
Z afgekeurd wegens andere reden (zie opmerkingen)
N niet aanwezig en/of niet onderzocht

Rapportnummer

CBR11944

Resultaten

Visuele inspectie

- ☒ goedgekeurd de onderzochte ruimte(n) voldoen **wel** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990
☐ afgekeurd: de onderzochte ruimte(n) voldoen **niet** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990

Additionele monsteranalyse

- ☒ goedgekeurd: zie bijlage
☐ afgekeurd: zie bijlage
☐ niet van toepassing

Gegevens over de gevolgde inspectieprocedure en bijhorende prestatiekenmerken kunnen bij Flamant Laboratory BV worden opgevraagd. Documentatie ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden wordt in digitale vorm 7 jaar bewaard. De monsters worden 2 maanden bewaard. Niets uit deze rapportage mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Flamant Laboratory BV. Deze verrichting valt binnen de scope van het accreditaat I189 en/of L503.

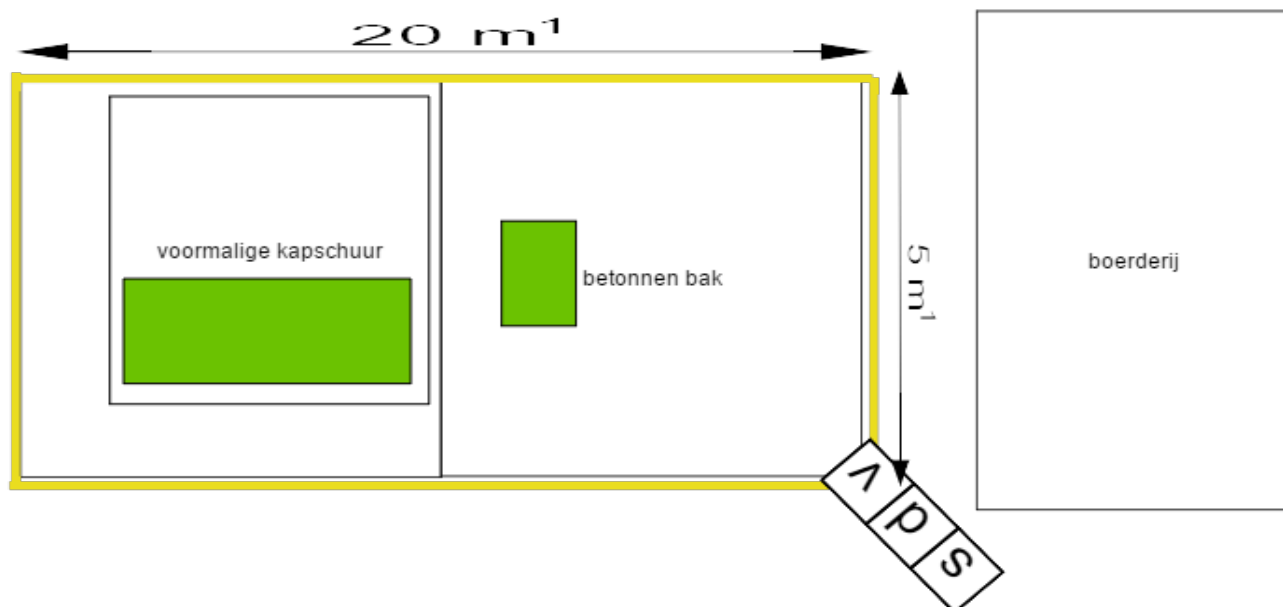
Opmerkingen/notities

--

Bijlagen

Geen

Rapportnummer

CBR11944

tekening is indicatief
en niet op schaal

luchtpomp:  gesaneerd:  afzetlint: 
 kleefmonster:  uitsluitingen:  metrage: 
 containment:  asbest:  segmentatie:  (x)
 deco-unit:  onderdruk:  transitroute: 

Rapportnummer

CBR11944



toelichting foto: vooraanzicht



toelichting foto: gebied onder de voormalige kapschuur



toelichting foto: restanten verwijderd - toplaag afgegraven



Rapportnummer

CBR11944



toelichting foto: deco aan gebied



toelichting foto: restanten verwijderd van de betonplaat
