



Onderzochte bouwkundige eenheid:

Woning

Adres Tropweere 16
Plaats 1661 BP De Weere
Rapportnummer 2022-191 (Versie 0)
Rapport geldig tot 01 februari 2025

Dit rapport is : ☐ niet geschikt voor asbestverwijdering, een risicobeoordeling is noodzakelijk
: ☐ geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
: ☐ geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
: ☒ geschikt voor renovatie- of totaalsloop

Opdrachtgever: Van der Bel Sloopwerken BV
Contactpersoon: dhr. E. van der Hoek
Agriport 231
1775 TA Middenmeer
Uitvoering: Schutte Asbestinventarisaties (SCA certificaat 07-D070020)
Dhr. H.W.G.M. Schutte (51E-310121-411768)
Projectleider Dhr. H.W.G.M. Schutte (51E-310121-411768)
Datum uitvoering 27 januari 2022
Datum interne autorisatie 01 februari 2022

Risicobeoordeling : ☒ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
: ☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005)

Omvang Onderzoek : ☐ Gehele gebouw
: ☐ Gedeelte van gebouw of object
: ☒ Bouwwerk of object en gebied rondom bouwwerk of object
: ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

INHOUDSOPGAVE

TITELBLAD	1
INHOUDSOPGAVE	2
SAMENVATTING.....	3
1. ALGEMEEN.....	5
1.1 OMSCHRIJVING OPDRACHT	5
1.2 TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE	5
2. ONDERZOEKSMETHODIEK.....	6
2.1 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	6
2.2 BEPALEN HOEVEELHEDEN (INVENTARISATIE)	6
3. RESULTATEN.....	7
3.1 HISTORISCH ONDERZOEK	7
3.2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN.....	7
3.3 TABEL OVERZICHT (ASBEST)BRONNEN	8
3.4 TABEL OVERZICHT NIET ASBESTHOUDENDE BRONNEN	8
3.5 TABEL OVERZICHT TECHNISCHE INSTALLATIES.....	8
3.5 BESCHRIJVING RISICOKLASSE-INDELING	9
4. BEVINDINGEN.....	10
4.1 BESCHRIJVING VAN HET GEÏNVENTARISEERDE BOUWWERK	10
4.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.....	10
BIJLAGE 1. TEKENING	11
BIJLAGE 2. VERSLAG DESKRESEARCH	12
BIJLAGE 3. FOTOBLADEN	13
BIJLAGE 4. LABORATORIUMRESULTATEN	16
BIJLAGE 5. KADASTRALE KAART	17
BIJLAGE 6. CERTIFICATEN	18

SAMENVATTING

De woning aan de Tropweere 16 te De Weere is op 27 januari 2022 door H. Schutte onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt voor renovatie of totaalsloop.

Het doel van het onderzoek is om door middel van een inspectie, studie van bestaande stukken (tekeningen, bestekken, e.d.), interviews met de beheerder en laboratoriumonderzoek van verdachte materialen een indicatie te krijgen op welke locaties in de onderzochte ruimtes asbest aanwezig is. De verdachte elementen zijn bemonsterd en onderzocht middels laboratoriumonderzoek op de aanwezigheid van asbest. Er is één materiaalmonster genomen.

Onderstaand een samenvattende opsomming van de asbestverdachte bemonsterde materialen:

Bron nr.	Omschrijving Materiaal	Analyseresultaat	Risico klasse	Afwijkingen saneringsmethodiek
Bron 1	Zeil (berging)	M1: Niet asbesthoudend	-	

Onderstaand een samenvattende opsomming van de asbestverdachte niet bemonsterde materialen:

Bron nr.	Omschrijving Materiaal	waar aangetroffen	reden waarom niet bemonsterd
n.v.t.			

Gedetailleerde gegevens van de aangetroffen materialen worden vermeld in de tabel in hoofdstuk 3.

Er heeft vanwege het feit dat het gaat om sloop van de woning destructief onderzoek plaatsgevonden. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld metselwerk ter plaatse van kozijnen is gesloopt.

Gelet op het bovenstaande en de grote mate van kennis en ervaring binnen Schutte Asbestinventarisaties bij de inventarisatie van soortgelijke objecten, bestaat er geen redelijk vermoeden van de aanwezigheid van niet- direct waarneembare, asbesthoudende materialen zoals achter panelen aan gevel en rondom de kozijnen in de spouwmuren.

Een aanvullende inventarisatie wordt niet nodig geacht.

Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie van Schutte Asbestinventarisaties. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij verbouwings-werkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.

1. ALGEMEEN

1.1 Omschrijving opdracht

Door Van der Bel Sloopwerken BV is aan Schutte Asbestinventarisaties de opdracht verstrekt om de woning aan de Tropweere 16 te De Weere te inventariseren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De woning is op 27 januari 2022 door dhr. H.W.G.M. Schutte (51E-310121-411768) onderzocht.

1.2 Ter beschikking gestelde informatie

De volgende informatie is door de opdrachtgever beschikbaar gesteld:

-	
---	--

Voor deze inventarisatie zijn er geen interviews met de opdrachtgever afgenomen.

Het onderzoek betreft de volgende onderdelen:

Buitenzijde	
Binnenzijde	

Binnen deze opdracht is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem en mogelijke besmettingen met asbestrestanten cq. asbestvezels.

Alle gegevens in deze rapportage zijn vertrouwelijk en zullen door Schutte Asbestinventarisaties als zodanig behandeld worden. Informatie uit deze rapportage zal niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever.

Datum van interne autorisatie: 01 februari 2022

Technisch verantwoordelijke: dhr. H.W.G.M. Schutte



2. ONDERZOEKSMETHODIEK

2.1 Omschrijving werkzaamheden

Inhoudelijk maken de volgende werkzaamheden deel uit van een asbestinventarisatie:

- a. Vooronderzoek:
Het uitvoeren van een vooronderzoek door middel van het planmatig voorbereiden, bestuderen van bouwkundige en installatietechnische bestekken/werkomschrijvingen en tekeningen op toegepaste asbestverdachte materialen, inclusief het maken van een onderzoeksplan en melding aan de certificerende instelling.
- b. Visuele inspectie:
 - Het door middel van een survey opsporen van asbestverdachte bouwkundige en installatietechnische onderdelen;
 - Het door middel van een inventarisatie kwantificeren van de aanwezige bouwkundige en installatietechnische asbestbronnen.
- c. Het uitwerken van de rapportage, inhoudelijk omvat dit:
 - Aangeven van de asbestbronnen op de plattegronden en/of geveltekeningen;
 - Korte omschrijving van de vindplaats en kwantificeren van de bronnummers;
 - Foto's, genummerd naar de vindplaatsen;
 - Inclusief rapportage in tweevoud.
- d. Het maken van een beknopte toelichting per bronnummer.
- e. Reproductie / foto's / kleurenkopie en kwaliteitscontrole.

2.2 Bepalen hoeveelheden (inventarisatie)

Bij het uitvoeren van de inspectie zijn van de asbesthoudende materialen, door middel van een inventarisatie, de hoeveelheden bepaald en de constructieve gegevens verzameld. Er heeft geen uitgebreid destructief onderzoek plaatsgevonden.

3. RESULTATEN

3.1 Historisch onderzoek

De opdrachtgever is verzocht om historische gegevens van het te onderzoeken object. Op dit verzoek is de volgende informatie beschikbaar gesteld;

Titel	informatie
Bag viewer	Bouwjaar

3.2 Gebruikte afkortingen

In tabel 3.3 op de volgende pagina zijn de asbesthoudende materialen weergegeven.

Uitleg van de in tabel in 3.3 genoemde afkortingen :

F	Foto
T	Technische installaties
K	Kleefmonster
M	Materiaalmonster
VH	Visueel herkend
S	Stofmonster

De foto's van de asbesttoepassingen zijn opgenomen in bijlage 3 en de resultaten van de laboratoriumanalyses in bijlage 4.

Woning
Tropweere 16, De Weere

3.3 Tabel Overzicht (asbest)bronnen

Bron nr.	Lab nummer	Foto-nummer	Omschrijving Materiaal	Locatie	Afmeting en hoeveelheid	Bevestiging	Bereikbaarheid	Hechtgebonden	Analyseresultaat	Risico klasse
n.v.t.										

3.4 Tabel overzicht niet asbesthoudende bronnen

Bron nr.	Lab nummer	Foto-nummer	Omschrijving Materiaal	Locatie	Afmeting en hoeveelheid	Bevestiging	Bereikbaarheid	Analyseresultaat
Bron 1	7039547	F1	Vloerzeil	Berging	±17,5m ²	Gelijmd	Goed	M1: Geen asbest

3.5 Tabel Overzicht technische installaties

Bron nr.	Foto-nummer	Omschrijving	Locatie	Specificatie	Vaststelling
T1	F3	Cv-ketel	Berging	Intergas	Gezien leeftijd niet asbesthoudend

3.5 Beschrijving risicoklasse-indeling

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [Lit. 1: artikelen 4.44, 4.46, 4.48 en 4.53a]. Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:

Risicoklasse	Beschrijving van de belangrijkste kenmerken	Lit. 1
1	Blootstellingsniveau < 0,002 vezels/cm³ (2.000 vezels/m³) 1. De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 2. De concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen".	Art. 4.46
2	Blootstellingsniveau > 0,002 vezels/cm³ (> 2.000 vezels/m³) 1. De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt (mogelijk) de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 2. De concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk (mogelijk) de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.	Art. 4.48
2A	Blootstellingsniveau > 0,002 vezels/cm³ (2.000 vezels/m³) 1. De concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk (mogelijk) de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.	Art. 4.53a

4. BEVINDINGEN

4.1 Beschrijving van het geïnventariseerde bouwwerk

Het betreft een inventarisatie van een vrijstaande woning.

Buitenzijde: De woning is opgetrokken uit metselwerk en is gedekt met dakpannen. Het platte dak is gedekt met bitumen. De schoorsteen is gemetseld, zichtbare eindpijp is van gres. De goten en hemelwaterafvoer zijn van pvc. De boeidelen zijn van trespas en kozijnen van hout. Bij destructief onderzoek, naast het kozijn, zijn er geen bijzonderheden in de spouw aangetroffen.

De berging is aangebouwd, opgetrokken uit metselwerk en gedekt met bitumen.

Buiten de woning is een put aangetroffen, hier zijn geen asbestverdachte toepassingen aangetroffen.

Binnenzijde: De vloer op de begane grond, verdieping en zolder is van hout. De berging/bijkeuken is bekleed met niet asbesthoudend zeil. De overige ruimtes zijn bekleed met diverse niet asbestverdachte toepassingen zoals tapijt, laminaat, niet asbestverdachte zeilen en vloertegels. In diverse ruimtes zijn meerdere lagen vloerbekleding aangetroffen. Onder het keukenblok zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De vloertegels in de badkamer en toilet bevinden zich in cement. De drempels zijn van hout, vensterbanken van tegels. De scheidingswanden zijn van metselwerk en zijn in de keuken en badkamer deels voorzien van wandtegels. De wandtegels in deze ruimtes bevinden zich in cement. Het plafond is van gips.

Er is geen vloerluis aangetroffen. Na het verwijderen van het toilet werk de gres riolering zichtbaar. In de woonkamer bevindt zich een schouw, ook hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

De cv-ketel bevindt zich in de berging/bijkeuken. De dakconstructie en het dakbeschot van de woning zijn van hout.

Er heeft op diverse plaatsen destructief onderzoek plaatsgevonden, plafond, wanden e.d. Hierbij zijn geen asbestverdachte toepassingen aangetroffen.

De schuren op het erf zijn vrijstaand, opgetrokken uit metselwerk en gedekt met asbestverdachte golfplaten. De schuren vallen buiten de inventarisatie.

4.2 Conclusies en aanbevelingen

In verband met sloop is de woning onderzocht op asbesthoudende toepassingen.

Het vloerzeil in de berging/bijkeuken is bemonsterd maar niet asbesthoudend gebleken. Een saneringsadvies is hiervoor niet aan de orde.

Er heeft vanwege het feit dat het gaat om sloop van de woning destructief onderzoek plaatsgevonden. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld metselwerk ter plaatse van kozijnen is gesloopt.


Gelet op het bovenstaande en de grote mate van kennis en ervaring binnen Schutte Asbestinventarisaties bij de inventarisatie van soortgelijke objecten, bestaat er geen redelijk vermoeden van de aanwezigheid van niet- direct waarneembare, asbesthoudende materialen zoals achter panelen aan gevel en rondom de kozijnen in de spouwmuren.

Een aanvullende inventarisatie wordt niet nodig geacht.

BIJLAGE 1. Tekening

(bestaande uit 1 pagina)

Tropweere 16, De Weere

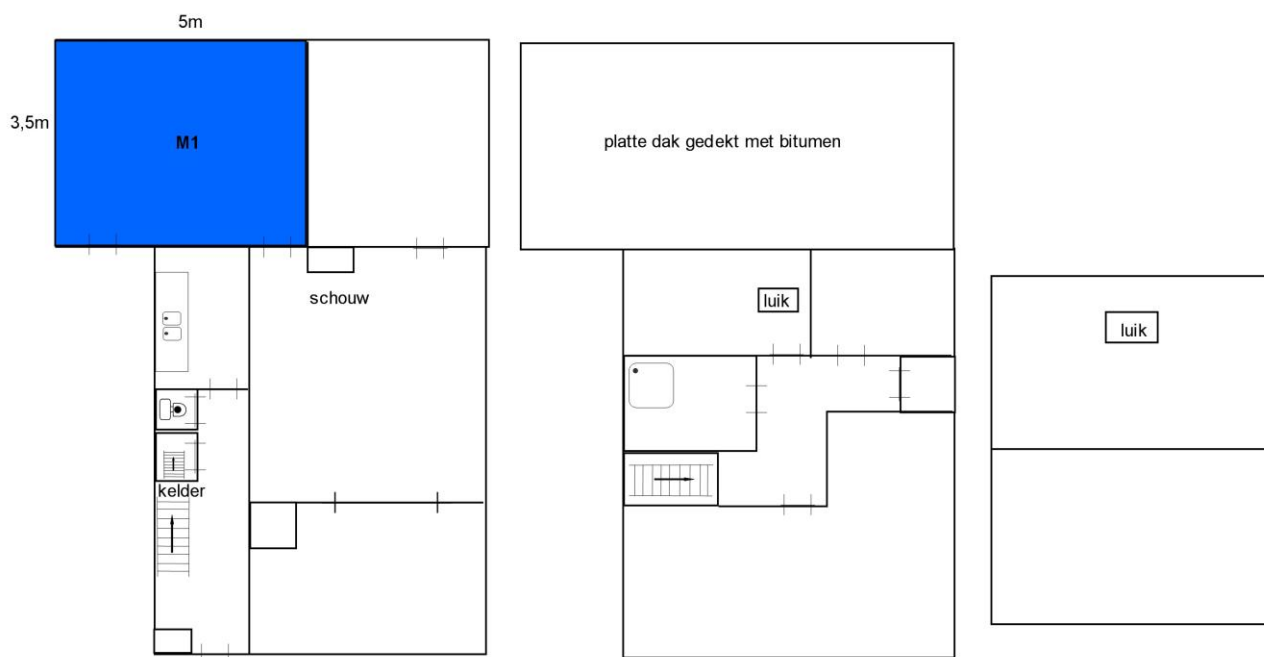

Toelichting:

Voor afmetingen/hoeveelheden wordt verwezen naar de opsomming in tabel 3.3

SCHEMATISCHE WEERGAVE / SCHETS ONDERZOCHT GEBIED

M00	Monsterlocatie en nummer
F00	Fotolocatie en nummer
VH	Visueel herkend als M00
	Bemonsterd maar niet asbesthoudend
	Gecontroleerd maar geen asbestbron
	Vermoedelijke asbestbron
	Asbesthoudende bron
NT	Ruimte niet toegankelijk
NO	Ruimte niet onderzocht

BIJLAGE 2. Verslag deskresearch

De opdrachtgever is per e-mail verzocht om historische gegevens van het te onderzoeken object. Op dit verzoek heeft de opdrachtgever de volgende informatie beschikbaar gesteld.

titel/kenmerk	informatie
Bag viewer	Bouwjaar 1956

Uit het gesprek met de opdrachtgever blijkt dat hij niet bekend is met mogelijk asbesthoudende toepassingen.

Conclusie


Voor aanvang van de asbestinventarisatie was niet bekend of en waar er mogelijk asbesthoudende toepassingen aanwezig zouden kunnen zijn.

BIJLAGE 3. Fotobladen

(bestaande uit 3 pagina's)

Bron 1	Foto F1
	
Vindplaats: Berging/bijkeuken Omschrijving: Vloerzeil Lab nummer: M1:7039547 Analyseresultaat: Niet aantoonbaar Hechtgebonden: n.v.t. Bevestiging: Gelijmd Bereikbaarheid: Goed Staat waarin de toepassing verkeert: Ernstig beschadigd Mate van verweerdheid: Licht verweerd	Hoeveelheid: Bron 1: ±17,50m ² Risicoklasse: n.v.t. Afscherming werkgebied: n.v.t. Werkmethode: n.v.t. Evt. bijzonderheden m.b.t. sanering: n.v.t.

Foto F2: 	Foto F3: 
Detailfoto M1	T1
Foto F4: 	Foto F5: 
Woning met aanbouw opgetrokken uit metselwerk en gedekt met dakpannen en bitumen	Geen bijzonderheden aangetroffen in de spouw
Foto F6: 	Foto F7: 
Gemetselde schoorsteen met eindpijp van gres	Put tegen de gevel. Geen bijzonderheden aangetroffen in de put
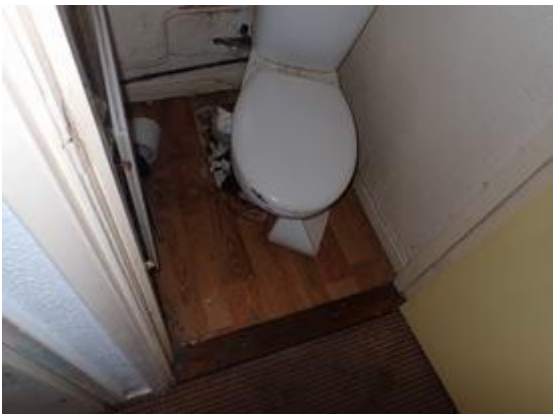
<i>Foto F8:</i> 	<i>Foto F9:</i> 
Vloer bekleed met oa tapijt en niet asbestverdacht zeil	Wandtegels in cement
<i>Foto F10:</i> 	<i>Foto F12:</i> 
Riolering van gres	Deconstructief onderzoek wanden
<i>Foto F13:</i> 	<i>Foto F14:</i> 
Zoldervloer van hout. dakconstructie en dakbeschot van hout	Op het erf zijn gemetselde schuren met asbestverdachte golfplaten aangetroffen

Woning
 Tropweere 16, De Weere

BIJLAGE 4. Laboratoriumresultaten



Omegam



1304288_certificaat_v1 - 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Schutte Asbestinventarisaties
Contact : de heer H.W.G.M. Schutte
Adres : Noord Zijperweg 21D, 1766HG WIERINGERWAARD

Projectgegevens
Projectcode : 1304288
Uw project omschrijving : 2022-191 Tropweere 16 De Weere
Validatierref. : 1304288_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VUNR-HDDG-DIEX-SHZO

Datum ontvangst : 27-01-2022
Datum rapportage : 28-01-2022
Aantal monsters : 1
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthrofiylliet	tremoliet	actinoliet	
7039547	M01 - zeil berging	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

Analysemethode
 Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0,1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

Opmerking
 De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
 Manager productie



Disclaimer
 Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de kopstek van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monstername.


Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
 De met een "Q" gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
 H.J.E. Wenkebachweg 120
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
 CSOmegam@eurofins.com
 www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNP 0227667980
 BIC BNPANL2A
 BTW nr. NL8139.67.132.B01
 KvK nr. 34215654

BIJLAGE 5. Kadastrale kaart

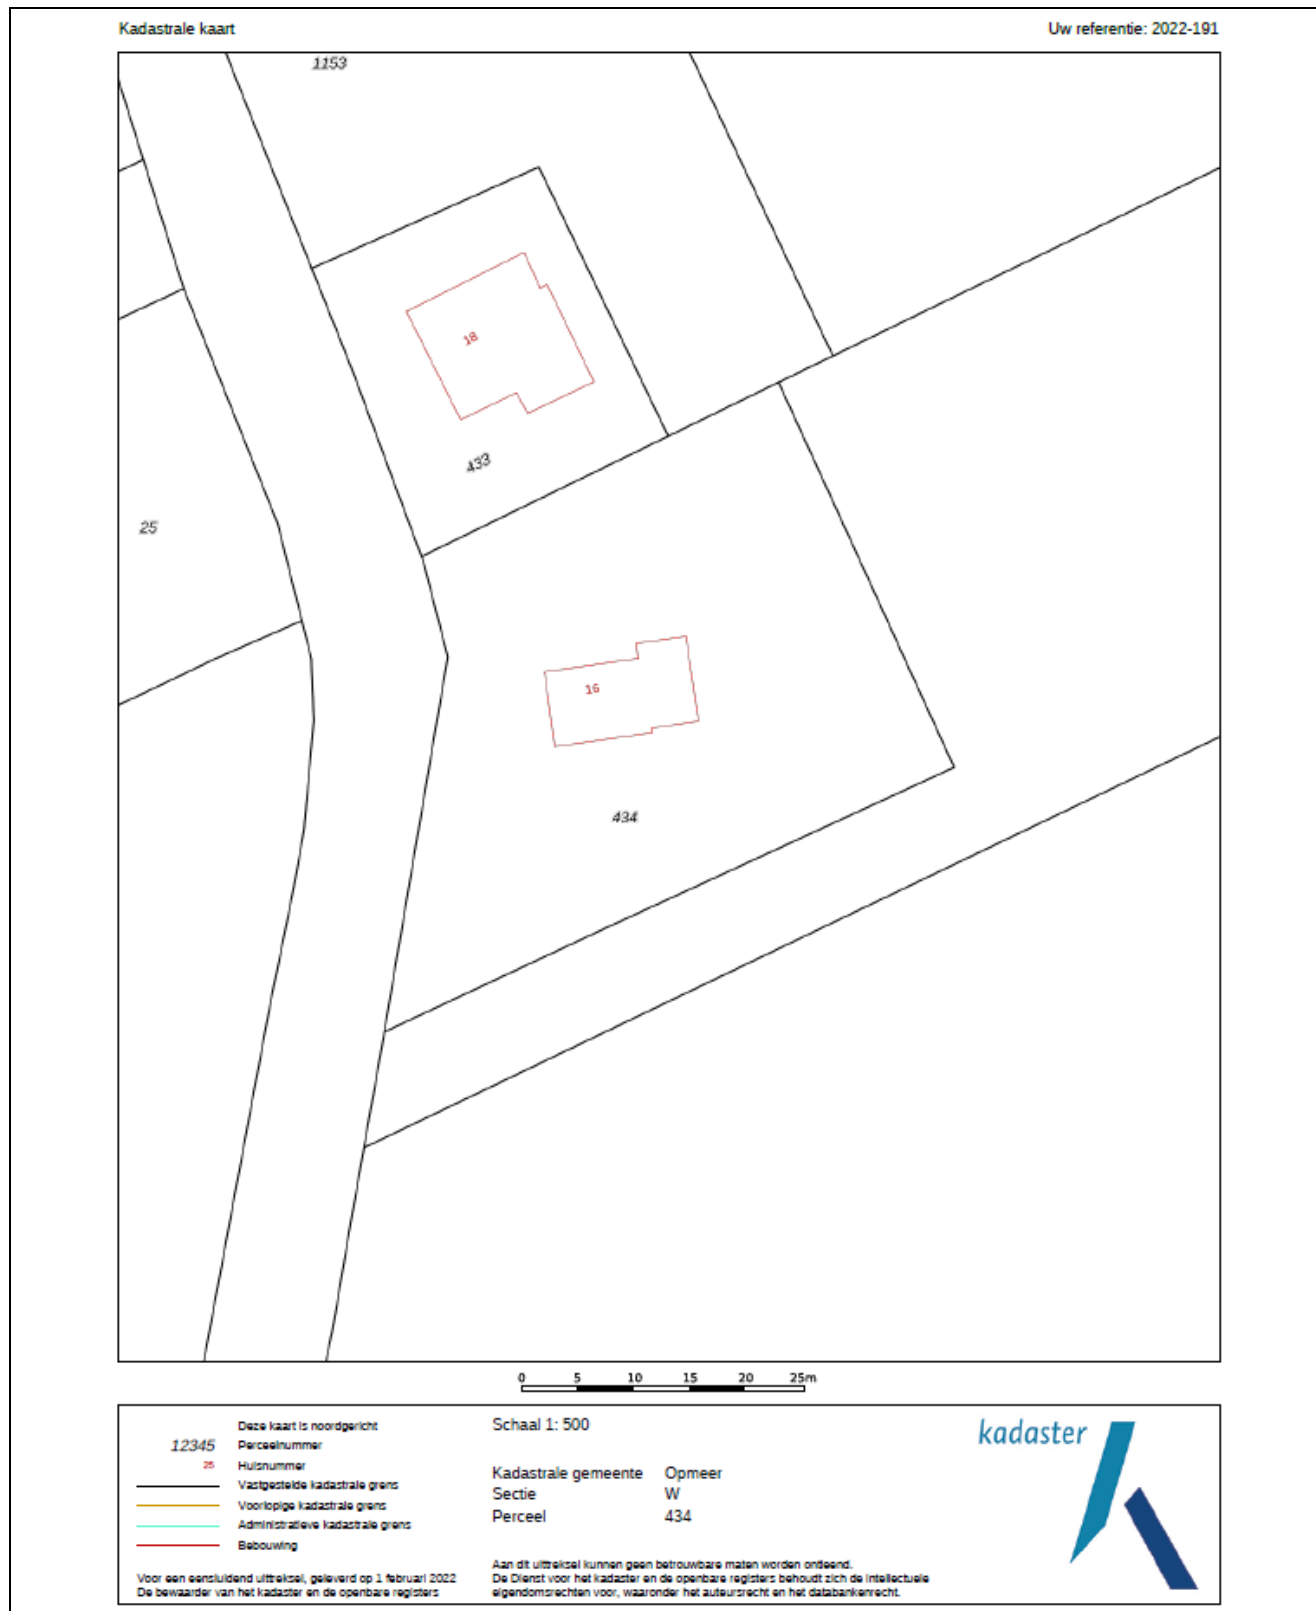

BIJLAGE 6. Certificaten



Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070020

Schutte Milieu en Advies B.V. h.o.d.n. Schutte Asbestinventarisaties

Adres:	Noord Zijperweg 21D 1766 HG WIERINGERWAARD	Datum uitgifte:	29-05-2021
Telefoonnr:	+31 6 2721-7345	Vervaldatum:	29-05-2024
Contactpersoon:	dhr. H.W.G.M. Schutte	Datum eerste uitgifte:	01-06-2007
		KvK-nummer:	34227448
		e-mail :	info@schuttemilieu.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

- De certificaathouder:
 - blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
 - verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.

F. Smalt



Asbestinventarisatie



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070020
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070020.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1

Woning
Tropweere 16, De Weere

ASCERT PERSOONSCERTIFICAAT

**DESKUNDIG
INVENTARISEERDER ASBEST**



Dit Certificaat van vakbekwaamheid DIA is op basis van het certificatieschema DIA 01042019 en conform het geldende Sca-511 examenreglement van Ascet afgegeven door IBEX Certificatie.

IBEX Certificatie verklaart dat de certificaathouder voldoet aan de eisen ten aanzien van het vakbekwaamheidsprofiel voor Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) vastgesteld in bovengenoemd certificatieschema.

Dit Certificaat van Vakbekwaamheid is na ondertekening geldig vanaf 31 januari 2021 tot 31 januari 2024

Aldus overaangekomen op zatekend,

Namens IBEX Certificatie,

Certificaathouder
H.W.G.M. Schutte

Certificatiebeslissers
W.K. Broekhuizen

GEGEVENS CERTIFICAATHOUDER

- Naam H.W.G.M. Schutte
- Geboortedatum 16 juli 1960
- Geboorteplaats Genep
- Ascet-code S1E-310121-411768
- Examendatum 14 december 2020
- Certificatiedatum 31 januari 2021
- Geldig tot 31 januari 2024

DIT EXAMEN IS AFGENOMEN DOOR



IBEX Instituut voor Beroepsexamens
Nevelgaarde 20-B
3436 ZZ NIEUWEGEIN
Tel: 088 - 998 30 34
Email: info@ibex.nl
www.ibex.nl

Onderdeel van dit certificaat is een ondertekende certificaatovereenkomst.
Dit certificaat bestaat uit twee bijdragen - nadruk verboden

IBEX bv is door de minister van SZW aangewezen als CIO conform de aanwijzingsbeschikking met kenmerk 2014-0300050020, d.d. 01-01-2014. IBEX Certificatie is een handelsnaam van IBEX bv. IBEX bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 3960046.

IBEX Certificatie, Nevelgaarde 20-B, 3436ZZ Nieuwegein, tel: 088-9983046, email: info@ibexcertificatie.nl

Ascet
