
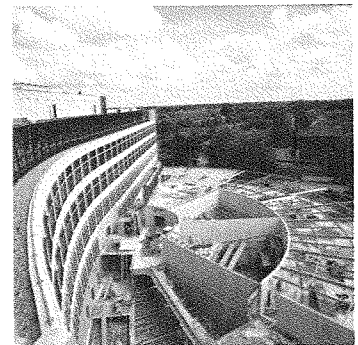
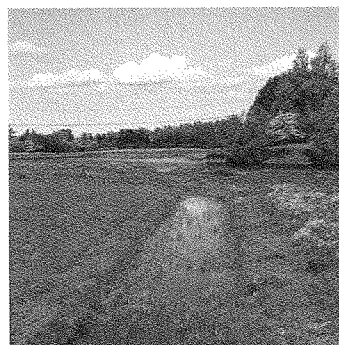



| <b>Team Vergunningen</b> |              |
|--------------------------|--------------|
| Ingekomen:               | 15 APR. 2010 |
| Nummer:                  | 20101204     |
| Op hoofdlijnen akkoord:  |              |
| Teamleider:              |              |

**Aanvraag werkterreinvergunning  
en uitritvergunning  
AWZI Noordwijk**

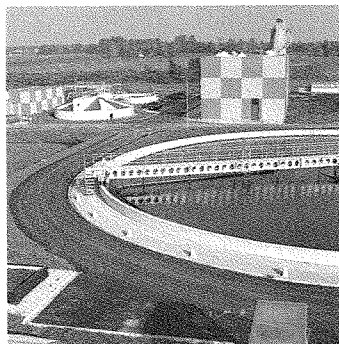

## Aanvraag werkterreinvergunning en uitritvergunning AWZI Noordwijk

|                    |                  |              |
|--------------------|------------------|--------------|
| referentie         | projectcode      | status       |
| NWZ16-10/hoop2/009 | NWZ16-10         | definitief   |
| projectleider      | projectdirecteur | datum        |
| ing. M. Kraneveld  | ir. P. de Jong   | 1 april 2010 |

|             |                   |                                                                                       |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| autorisatie | naam              | paraaf                                                                                |
| goedgekeurd | ing. M. Kraneveld |  |

Witteveen+Bos  
Willemstraat 28  
postbus 3465  
4800 DL Breda  
telefoon 076 523 33 33  
telefax 076 514 44 42

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

## INHOUDSOPGAVE

blz.

### 1. ALGEMEEN

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1.1. Gegevens aanvrager                  | 1 |
| 1.2. Gewenste vergunning                 | 1 |
| 1.3. Aard van de aangevraagde activiteit | 1 |
| 1.4. Relatie met andere vergunningen     | 1 |
| 1.5. Ligging van het complex             | 2 |
| 1.6. Andere benodigde vergunningen       | 2 |
| 1.7. Ondertekening                       |   |

### 2. GEGEVENS VAN DE WERKZAAMHEDEN

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 2.1. Inleiding                          | 3 |
| 2.2. Nieuwe AWZI Noordwijk              | 3 |
| 2.3. Werkterrein                        | 3 |
| 2.3.1. Gronddepot                       | 4 |
| 2.3.2. Opslag van materiaal             | 4 |
| 2.3.3. Plaatsen van keten en voertuigen | 4 |
| 2.4. In- en uitrit                      | 4 |
| 2.5. Planning                           |   |

laatste bladzijde

4

#### bijlagen

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| I   | Aanvraagformulier werkterrein- en/of objectvergunning |
| II  | Aanvraagformulier uitweg                              |
| III | Regionale situatie                                    |
| IV  | Kadastrale situatie                                   |
| V   | Tekening werkterrein                                  |

aantal bladzijden

2  
2  
1  
1  
1

## 1. ALGEMEEN

### **aanvraag om een werkterreinvergunning**

Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk  
Postbus 298  
2200 AG Noordwijk

### **aanvraag om een uitritvergunning**

Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk  
Postbus 298  
2200 AG Noordwijk

#### **1.1. Gegevens aanvrager**

naam : Hoogheemraadschap van Rijnland  
adres : Archimedesweg 1  
postcode / woonplaats : 2333 CM LEIDEN  
postadres : Postbus 156  
: 2300 AD LEIDEN  
algemeen telefoonnummer : 071 30 63 063  
contactpersoon : de heer ing. M.G. Revallier  
telefoonnummer : 071 30 63 832  
telefax : 071 51 23 916

#### **1.2. Gewenste vergunning**

Verzoekt om:

- een werkterreinvergunning op grond van de algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2007;
- een uitritvergunning ingevolge artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2007;
- een tijdelijke buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 1998' ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

In bijlage I is het ingevulde aanvraagformulier 'Aanvraag werkterrein- en/of objectvergunning' opgenomen. In bijlage II is het ingevulde aanvraagformulier 'uitwegvergunning' opgenomen.

#### **1.3. Aard van de aangevraagde activiteit**

Voor de bouw van een nieuwe AWZI en de sloop van een bestaande AWZI moeten werkterreinen ingericht worden voor:

- de opslag van grond;
- opslag van materiaal;
- plaatsen van keten;
- parkeren van voertuigen;
- daarnaast dienen de terreinen bereikbaar te zijn, via de aangrenzende weg. Hiervoor worden vijf tijdelijke uitritten aangelegd.

#### **1.4. Relatie met andere vergunningen**

Voor het in werking hebben van het werkterrein met perceelnummer 1436 en 1443 en gronddepot met perceelnummer H368 is reeds een vergunning verleend (met kenmerk 20081028). De vergunning voor het werkterrein is verleend tot januari 2010 en het gronddepot is verleend tot januari 2011. Door uitloop van de werkzaamheden, tot mei 2012, is het noodzakelijk de vergunning te verlengen. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van bouwwerkzaamheden en zijn tijdelijk van aard.

#### **1.5. Ligging van het complex**

adres : Achterweg 11

postcode / vestigingsplaats : 2201 AH NOORDWIJK  
kadastrale gegevens : gemeente Noordwijk, sectie I, nummer 452.

De AWZI is gelegen in het buitengebied van Noordwijk. Aan de westzijde van de inrichting ligt een glastuinbouwbedrijf met een bedrijfswoning. Ten zuidoosten van de AWZI is een afvalverwerkingsbedrijf gevestigd.

In bijlage III is een kaart van de regionale situatie ter plaatse van de inrichting opgenomen. In bijlage IV is een kadastrale situatie opgenomen en in bijlage V is een tekening van de inrichting van het werkterrein opgenomen.

#### **1.6. Andere benodigde vergunningen**

Voor het bouwen van een volledig nieuwe installatie zijn reeds de volgende vergunningen worden verleend:

- de gemeente Noordwijk heeft reeds een Wm vergunning, bouwvergunning 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> fase, een melding 8.19 en een tijdelijke vrijstelling voor werkterrein en uitritten verleend;
- voor de bouw is reeds een grondwateronttrekkingvergunning en een lozingsvergunning verleend. De grondwateronttrekkingvergunning is verleend door de provincie Zuid-Holland en de lozingsvergunning is verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland;
- voor het slopen van de huidige AWZI is een sloopvergunning ingevolge de gemeentelijke bouwverordening nodig. Deze is verleend door de gemeente Noordwijk.

Deze aanvraag heeft betreft een aanvraag werkterreinvergunning & uitritvergunning.

#### **1.7. Ondertekening**

plaats : Leiden

datum : .....

Handtekening

.....

de heer J. den Haan  
projectleider

## **2. GEGEVENS VAN DE WERKZAAMHEDEN**

### **2.1. Inleiding**

De hoofdactiviteit van de AWZI Noordwijk is het zuiveren van afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven. Het afvalwater wordt gezuiverd en het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlakte water.

### **2.2. Nieuwe AWZI Noordwijk**

Binnen de inrichtingsgrenzen van de AWZI Noordwijk wordt een volledig nieuwe zuivering gebouwd. De zuivering bestaat uit de volgende onderdelen:

- influentgemaal;
- ontvangwerk;
- roostergoedverwijdering;
- zandvanger;
- verdeelwerk;
- beluchtingstank;
- nabezinktank;
- bedrijfsgebouw;
- gebouw voor de slibontwatering.

Het ontvangwerk, de roostergoedverwijdering en de zandvanger zitten in één gebouw: het ontvanggebouw. Na de zandvanger stroomt het afvalwater via een verdeelwerk naar de twee betonnen beluchtingstanks. De beluchtingstank bestaat uit vier ringen, drie van deze vier ringen zijn afgedekt. Het verdeelwerk en het blowergebouw staan tussen de twee beluchtingstanks. Vanuit de beluchtingstank stroomt het water naar de nabezinktanks. Dit zijn twee open betonnen tanks met daar tussen het re-tourslib- en effluentgemaal. Naast de nabezinktank staat het bedrijfsgebouw waar een werkplaats een procescontrole ruimte aanwezig is. Naast het ontvanggebouw staat het slibontwateringsgebouw en de slibverlading waar het slib ontwaterd wordt zodat afvoer mogelijk is.

### **2.3. Werkterrein**

De nieuw AWZI wordt gebouwd op het terrein van de bestaande AWZI. Het gehele braakliggende terrein van de AWZI wordt in gebruik genomen om de nieuw AWZI te bouwen. Nadat de nieuwe AWZI volledig in gebruik is wordt de bestaande AWZI gesloopt. Op het terrein van de bestaande AWZI is geen plaats voor een werkterrein. Om werkterreinen in de buurt van de AWZI te realiseren zijn afspraken gemaakt met omwonende agrariërs om grond te huren. Voor het huren van grond voor werkterreinen zijn huurovereenkomsten afgesloten met de eigenaren. De werkterreinen bestaan uit de volgende onderdelen:

- gronddepot perceelnummer H368 en 1436;
- opslag van materiaal perceelnummer 1443;
- plaatsen van keten en voertuigen perceelnummer 1443.

In de paragrafen hieronder wordt nader in gegaan op de bovenstaande activiteiten. De werkterreinen worden afgesloten met een hekwerk. De werkterreinen worden verhard met secundaire verharding. De reeds uitgevoerde bodemonderzoeken waarbinnen de kwaliteit van de bodem.

#### **2.3.1. Gronddepot**

Voor tijdelijke opslag van grond worden twee gronddepots gerealiseerd. De gronddepots hebben een oppervlakte van 3.360 m<sup>2</sup> en 3.033 m<sup>2</sup>. De grond wordt gestort op het maaiveld waarop geotextiel ligt.

De grond wordt opgeslagen als bergen met een hoogte van ongeveer 4 á 5 meter.

### **2.3.2. Opslag van materiaal**

Op het werkterrein is een ruimte is voor aannemers en diverse onderaannemers gereserveerd voor de opslag van materiaal.

Op locatie zijn diverse opslagcontainers aanwezig waarin materieel als ladders en steigers en werkmetaal worden opgeslagen.

### **2.3.3. Plaatsen van keten en voertuigen**

Op het werkterrein is een ruimte ingericht voor het plaatsen van keten en het parkeren van voertuigen. In bijlage V is een plattegrond van het werkterrein opgenomen.

Voor de directie en de uitvoering van de werkzaamheden zijn diverse keten op het werkterrein geplaatst. De keten die geplaatst zijn, zijn van het type geschakelde containerketen. Deze keten zijn ook stapelbaar. Voor de directie en de uitvoering zijn 16 6-meter units aanwezig. Deze units zijn in twee rijen van 8 geschakelde containers opgesteld en vormen een geheel voor de directie en de uitvoering.

Verder zijn op het terrein drie geschakelde units van 9 meter met een kleed-, was-, toilet- en kantinefunctie. Naast deze containers zijn nog losse keetcontainers voor de opslag van bouwmetaal en twee stapelunits aanwezig.

De voertuigen die overdag op het terrein aanwezig zijn, is een mengeling van personenauto's, bedrijfsvoertuigen en groot grondverzetmetaal. In totaal zijn maximaal circa 30 personenauto's, 5 bedrijfsvoertuigen en 1 of 2 stuk groot metaal aanwezig.

### **2.4. In- en uitrit**

Voor het bereikbaar maken van de werkterreinen, gronddepots en de kas worden extra uitritten aangelegd. Voor de aanleg van de werkterreinen worden vijf tijdelijke uitritten aangelegd. De uitritten worden verhard met stelconplaten. Door het plaatsen van het werkterrein wordt de toegangsweg naar de kas op perceel met nummer 1444 afgesloten. Om de kas bereikbaar te houden wordt een nieuwe tijdelijke uitrit aangelegd.

### **2.5. Planning**

Het werkterrein en gronddepot met perceelnummer 1443 en 1444 is maart 2008 ingericht en staat tot mei 2012.

De tijdelijke uitrit voor het bereikbaar maken van de kas en de toegang tot het werkterrein is begin maart 2008 ingericht en staat tot mei 2012.

Het gronddepot met perceelnummer H368 is in gebruik van begin maart 2008 tot en met mei 2012.

De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag uitgevoerd tussen 07.00 en 19.00 uur. In de avond- en nachtperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd.
