

Bodem

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, heeft advies gegeven op het bodemonderzoek. Dit advies heb ik voorgelegd aan de projectleider van Landview, Petra Pijnenburg. In deze notitie staat het advies van ODNHN en de reactie van Landview

Advies ODNHN

Uitgevoerd bodem- en asbestonderzoek

De in de rapportage vermelde omvang van de onderzoek locatie (1,1 ha) komt niet overeen met de onderzoek locatie zoals in het kaartmateriaal van bijlage 1 is ingetekend (1,5 ha). Er zijn volgens de NEN 5740 daardoor onvoldoende boringen en analyses verricht. Dit dient te worden aangevuld.

Reactie Landview

Voor de opzet van het onderzoek en daarmee het aantal boringen is uitgegaan van de voorziene oppervlakte van de uitbreidingen zoals aangegeven op bijgesloten tekening 10.20 situatie nieuw: dit betreft een oppervlakte van 10.698 m². Dit hebben wij al "afgerond" naar circa 1,1 ha.

Op onze tekening met de boorpunten in het verschenen rapport heb ik deze uitbreidingen globaal omlind aangegeven, wat inderdaad mogelijk de indruk wekt dat de onderzoek locatie groter is. Gezien de toentertijd nog aanwezige woning op de voorziene plek van de migrantenhuisvesting is hier omheen geboord en is er voor gekozen om één peilbuis tussen deze voorziening en de toekomstige nieuwe woning te plaatsen.

Op het bijgesloten 'bovenaanzicht' is te zien dat de plaatsen van de gedane boringen redelijk overeenkomen met de voorziene uitbreidingen.

Daarmee komt naar ons idee het aantal gedane boringen en analyses overeen met de onderzochte oppervlakte.

Naar aanleiding van het advies van ODNHN hierbij de aangepaste tekening (bijlage 2) van het deel van het terrein ter plaatse van Zuiderdijkweg 11 te Wieringerwerf wat daadwerkelijk onderzocht is. Hiermee is m.i. aangegeven dat wij voldaan hebben aan de NEN 5740.

Conclusie


ODNHN geeft aan dat de omvang van de onderzoeklocatie niet overeenkomt met de onderzoeklocatie zoals in het kaartmateriaal van bijlage 1 is ingetekend. Zoals Landview aangeeft is de uitbreiding 10.698 m² zoals op tekening 10.20 is te zien. Landview heeft bijlage 2 aangepast, waarop duidelijker is te zien dat welk deel bij de onderzoek locatie hoort.

Ik ga ervan uit dat hiermee voldoende is aangetoond dat voldaan is aan NEN 5740

Bijlagen:

- ◇ Tekening 10.20 situatie nieuw
- ◇ Bovenaanzicht: situatie nieuw met de boringen
- ◇ Bijlage 2: aangepast met onderzoeklocatie

BIJLAGE 2 LOKALE SITUATIE MET BOORPUNTEN/ASBESTGATEN

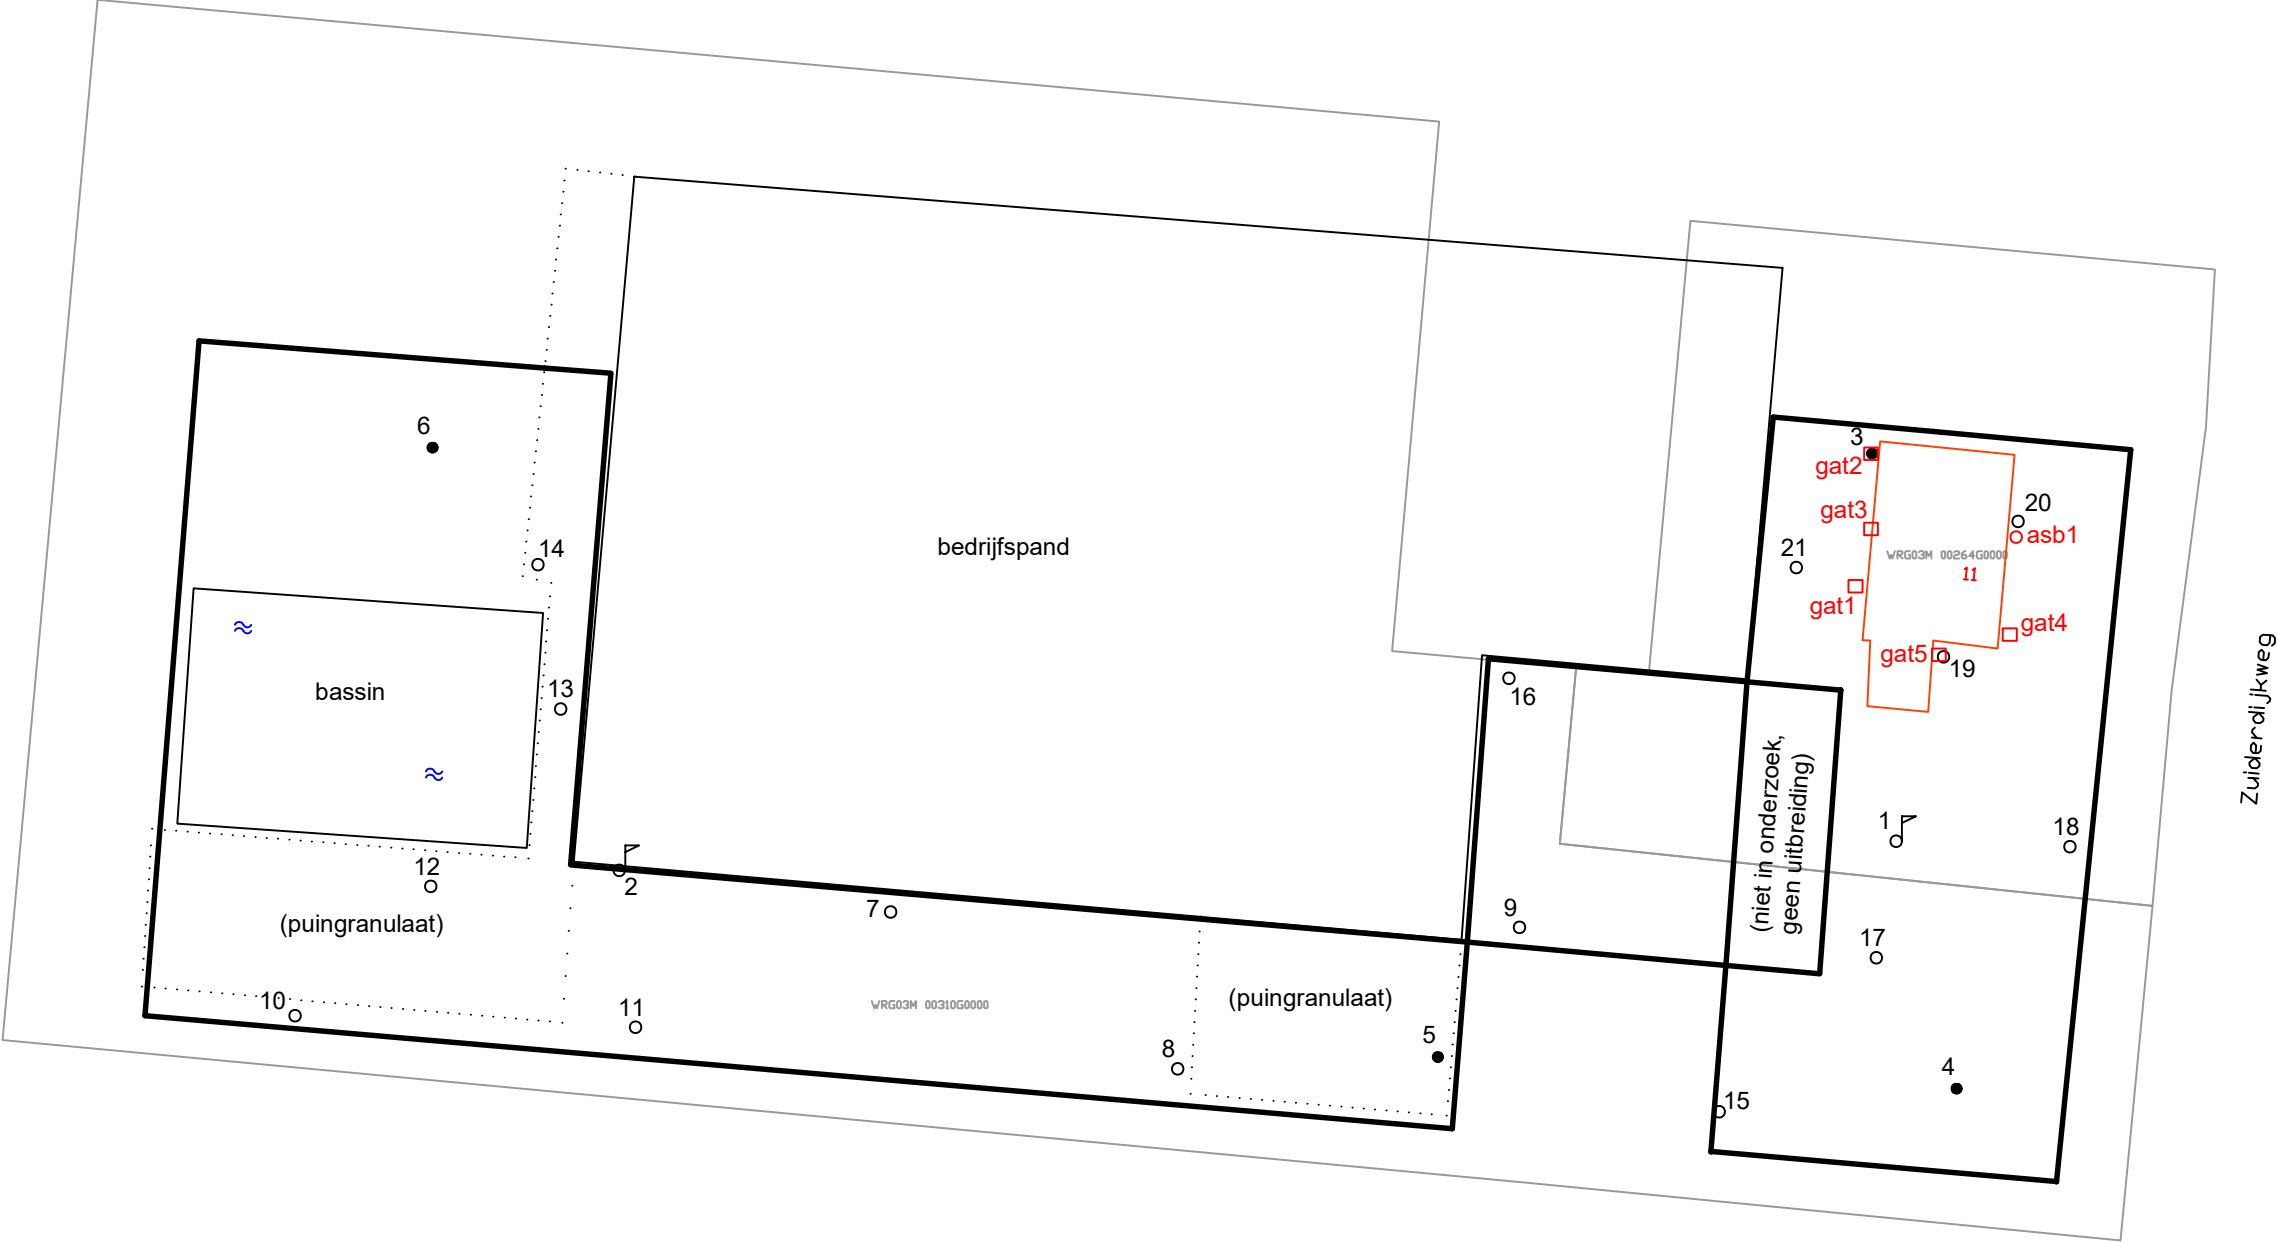

Legenda ♂ NEN-peilbuis • Boring tot GWS. ◦ Boring tot 0.5 m □ Asbestgat ≈ Water		Getekend door: PP Datum: 16-2-2023		Zuiderdijkweg 11 te Wieringerwerf		Noord Schaal: 1:1000
		Landview Bodemonderzoek De Factorij 32F, 1689 AL Zwaag Postbus 4060, 1620 HB Hoorn		Bijlage: 2	Projectnummer: 2022245	
				Datum veldwerk: 19/4-17/5-2022	Boormeester: F. Borst	

Meetpunt



01
Peilbuis
210

Asb 1
-
5

Gat 01
Gat
50

02
Peilbuis
250

Gat 02
Gat
50

03
Boring
140

Gat 03
Gat
100

04
Boring
150

Gat 04
Gat
50

05
Boring
150

Gat 05
Gat

Meetpunt

03

Type

Boring

Maaiveldtype

Puin

GWS (cm -mv)

80

Opmerking

Datum

19-04-2022 09:52:34

Diepte (cm -mv)

140

Boormeester

F. Borst

Monsternemer

F. Borst

Sleuflengte en -breedte ...

Deellocatie

