


Ecologisch werkprotocol heikikker, poelkikker en grote modderkruiper


Momenteel bevat de waterloop op de grens van de planlocatie een steile oever. In de beoogde ontwikkelingen wordt deze oever aan een zijde (zuidwest) vergraven tot natuurvriendelijke oever. Gezien de potentie voor de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper dient dit middels dit ecologisch werkprotocol te gebeuren. Dit ecologisch werkprotocol dient tevens bij de uitvoerder(s) van de werkzaamheden bekend te zijn.

Bovenstaande soorten kennen elk een eigen kwetsbare periode. Onderstaande tabellen zijn overgenomen uit de Kennisdocumenten voor de soort van BIJ12.



Heikikker:

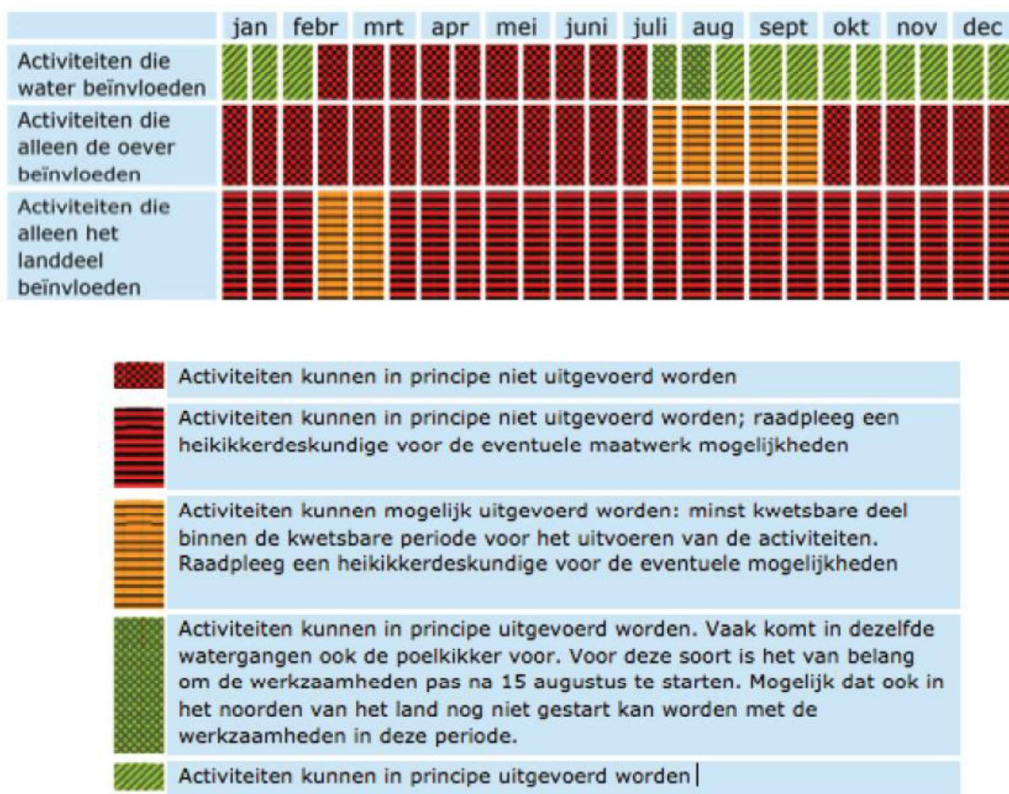

Poelkikker:

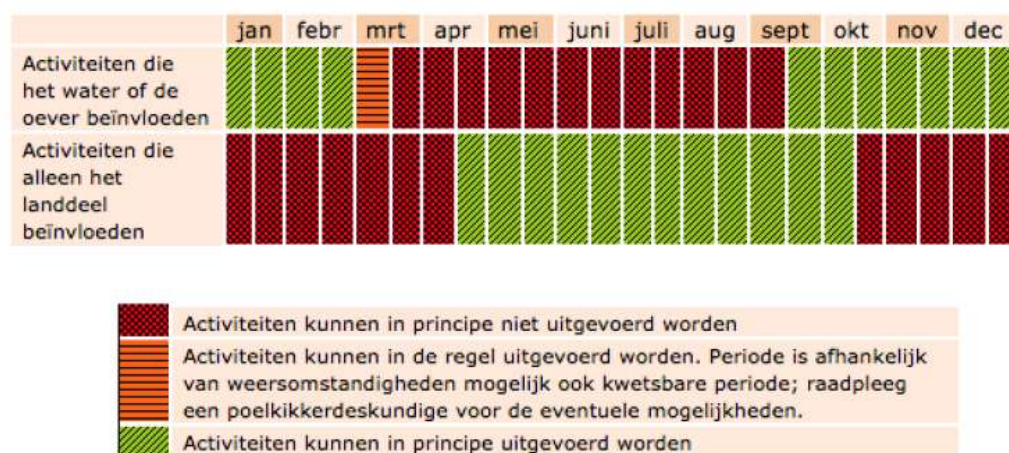

Grote modderkruiper:

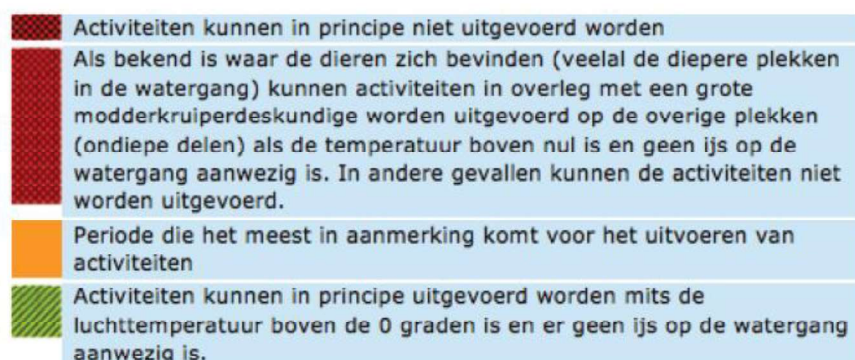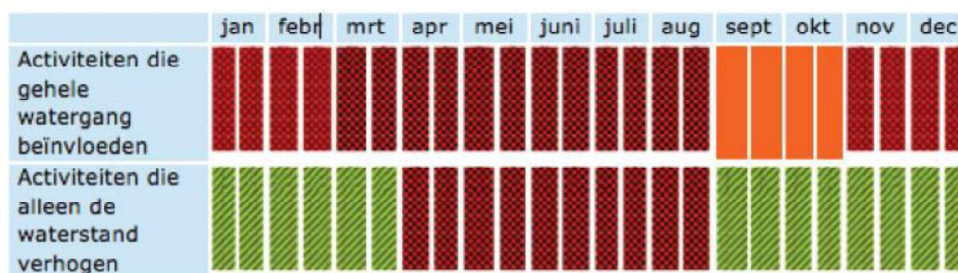

Bovenstaande tabellen laten zien dat de enige periode waarin werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden medio september tot eind oktober is. In deze periode is het voorkomen van negatieve effecten op de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper zeer klein tot uitgesloten.

Naast het werken buiten de kwetsbare periode dient er rekening gehouden te worden met het volgende:

- Tijdens het werken dient één werkrichting aangehouden te worden om voorgenoemde soorten én algemene soorten (zorgplicht) een kans te geven om te vluchten.
- De werkrichting dient richting delen te zijn welke niet worden aangetast. In dit geval dient de werkrichting in zuidoostelijke richting te zijn.
- De watergang dient maximaal voor de helft van de breedte gebaggerd te worden. Met de andere kant dient minstens één jaar gewacht te worden.

De toekomstige natuurvriendelijke oever dient een helling te hebben van 2:1 of 1:5. Bij voorkeur wordt deze ruim uitgerasterd om eventuele betreding van vee te voorkomen.
