



Beplantingsplan Driehoek 11 Oploo


DATUM 19 juli 2023

LOCATIE Driehoek 11
Oploo
Gemeente Land van Cuijk

Beplantingsplan

In het beplantingsplan worden de nieuw aan te leggen landschapselementen benoemd, beschreven en gemaatvoerd. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het beheer van het element.

Onderstaand een beplantingsplan met de verschillende elementen:

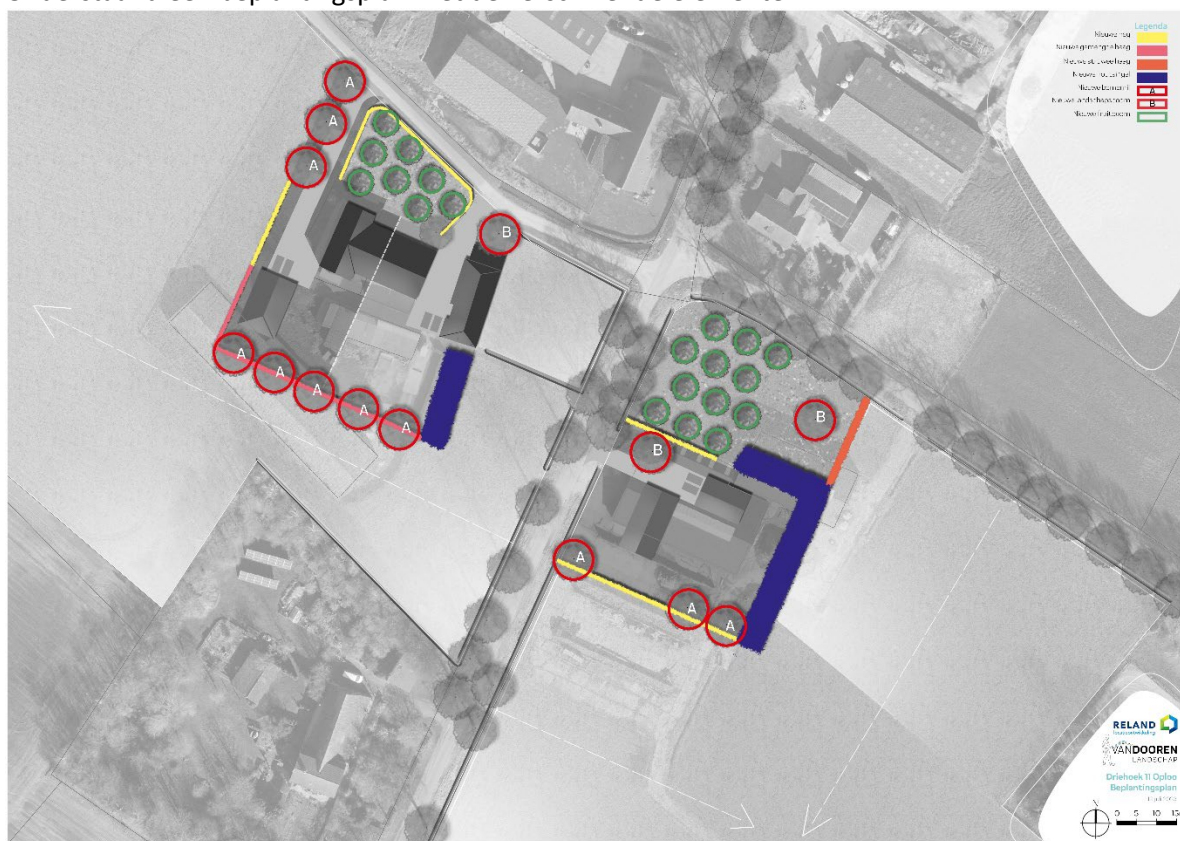

Beplantingsplan (zie bijlage I voor plan op maatvastе ondergrond)



HEG LAAG

Boomgaard voor bestaande boerderij 63m – 252 stuks

Ten westen bestaande boerderij 25m – 100 stuks

Rondom nieuwe woning 75m – 300 stuks

Afbakening

- ✓ Een knip- of scheerheg is een vrij liggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- ✓ Aanplant 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen:
 1. 25% Carpinus betulus (Haagbeuk)
 2. 25% Ligustrum ovalifolium (Liguster) (niet rondom de boomgaard)
 3. 25% Fagus sylvatica (Groene beuk)
 4. 25% Acer campestre (Veldesdoorn)
- ✓ Plantafstand: 4 stuks per meter

Beheervoorschriften

- ✓ Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
- ✓ De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 2 jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de haag een minimale hoogte van 0,8 meter en maximaal 1,2m en is minimaal 0,5m breed.
- ✓ Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- ✓ Het element mag niet worden beschadigd door vee.

GEMENGDE HAAG LAAG

Achtertuintuin bestaande woning: 75m – 300st

Afbakening

- ✓ Een knip- of scheerhaag is een vrij liggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- ✓ Aanplant 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen in groepsverband (5 stuks bij elkaar) met de volgende soorten:
 1. 25% Carpinus betulus (Haagbeuk)
 2. 25% Cornus mas (Gele kornoelje)
 3. 25% Fagus sylvatica (Groene beuk)
 4. 25% Acer campestre (Veldesdoorn)
- ✓ Het betreft een tweerijig element in kruislings verband.
- ✓ Plantafstand: 4 stuks per meter



Beheervoorschriften

- ✓ Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
- ✓ De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 2 jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de haag een minimale hoogte van 0,8 meter en maximaal 1,5m en is minimaal 0,7m breed.
- ✓ Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.

STRUWEELHAAG

Ter hoogte boomgaard nieuwe woning 22,5m – 90st

Afbakening

- ✓ Een struweelhaag is een vrij liggend lijnvormig landschapselement van ca. 2 meter breed met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse struiken.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- ✓ Aanplant 2- en/of 3-jarig inheems bosplantsoen in groepsverband (5 stuks bij elkaar) met de volgende soorten:
 1. 20% Carpinus betulus (Haagbeuk)
 2. 25% Cornus mas (Gele kornoelje)
 3. 20% Fagus sylvatica (Groene beuk)
 4. 25% Acer campestre (Veldesdoorn)
 5. 10% Ilex auifolium (Gewone hult)
- ✓ Het betreft een tweerijig element in kruislings verband.
- ✓ Plantafstand: 4 stuks per meter

Beheervoorschriften

- ✓ Snoeiwerkzaamheden worden verricht tussen 1 oktober en 14 maart.
- ✓ Takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.
- ✓ Beheereenheid wordt eens in de 3-7 jaar afgezet.
- ✓ Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter;
- ✓ Na het vlechten heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,5 meter
- ✓ Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan, uitgezonderd voor het snoeiwerk van zijkanten.
- ✓ Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.



- ✓ Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een raster niet nodig.

HOUTSINGEL

*Achtertuintuin bestaande boerderij 24*6m – 90st*

*Achtertuintuin nieuwe woning 62*6m – 240st*

Afbakening

- ✓ Een houtwal of houtsingel is een vrij liggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken.
- ✓ Het doel van het beheer van het element is het behoud van de karakteristieke uitstraling en natuurlijke waarde door het element als hakhout te beheren en het periodiek afzetten van het element (cyclisch beheer). De cyclus varieert tussen de 10 en 25 jaar.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- ✓ De houtsingel is te realiseren middels de aanplant van 2- jarig bosplantsoen, groepsgewijs in kruiselings plantverband van 1,25 x 1,25m.
- ✓ De houtwal is minimaal 6m breed en bevat de volgende soorten:
 1. 5% Betula pendula (Ruwe berk)
 2. 5% Tilia cordata (Kleinbladige linde)
 3. 10% Sorbus aucuparia (Lijsterbes)
 4. 20% Acer campestre (Veldesdoorn)
 5. 15% Amelanchier lamarckii (Amerikaanse krent)
 6. 15% Corylus avellana (Hazelaar)
 7. 10% Crataegus monogyna (Eénstijlige meidoorn)
 8. 20% Rhamnus frangula (Vuilboom)
- ✓ Raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien perceel beweid wordt.

Beheervoorschriften

- ✓ Ten minste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd. De gemiddelde diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven de hakhoutstoof (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden).
- ✓ Overhangende takken aan de zijanten mogen teruggesnoeid worden.
- ✓ Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 14 maart.
- ✓ Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.

- ✓ Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.
- ✓ Bij schade aan het landschapselement wordt de schade hersteld.

LANDSCHAPSBOOM of BOMENRIJ

Erf bestaande boerderij: 9 stuks

Erf nieuwe woning: 5 stuks

Afbakening

- ✓ Een bomenrij/solitaire boom is een vrij liggend landschapselement van inheemse loofbomen.

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- ✓ Aanplant landschapsboom, minimaal maat 10-12 en goed verankeren op aangewezen locatie met aanduiding A.:
 1. Tilia cordata (Kleinbladige linde)

De volgende soorten op aangewezen locatie met aanduiding B.:

1. Juglans regia (Olkernoot)

Beheervoorschriften

- ✓ Gedurende 10 jaar worden de bomen minimaal éénmaal gesnoeid. Na het snoeien beslaat de kroon minimaal 50% van de lengte van de boom.
- ✓ Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element.
- ✓ Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming mag niet aan het element bevestigd worden.

HOOGSTAMBOOMGAARD

Erf bestaande boerderij: 8 stuks

Erf nieuwe woning: 12 stuks

Afbakening

- ✓ Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,5 meter hoog, waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie (geen gazon).

Inrichtingseisen bij aanleg nieuw element

- ✓ Aanplant inheemse fruitbomen met minimale maat 8-10. Voor specificatie fruitsoorten wordt verwezen naar de lijst in BIJLAGE II.
- ✓ Plantafstand minimaal 8 x 8 meter
- ✓ Rond jonge bomen boomkorf aanbrengen indien perceel wordt beweid.

Beheervoorschriften

- ✓ Appel, peer en pruim snoeien dat de kroon open blijft en de waterloten verwijderen in de maanden november tot februari. Zieke en beschadigde takken verwijderen en afvoeren.
- ✓ De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf.
- ✓ De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
- ✓ Bemesting met ruige mest van rundvee en bekalking is toegestaan.
- ✓ Bij bemesten van de boomgaard, grondbewerking en maaiwerkzaamheden worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd

Bijlage I

Beplantingsplan

Bijlage II

Lijst met streekeigen fruitbomen

nr.	rasnaam	bewaarb aar	gebruikstijd	gebruik	bijzonderheden	wordt bestoven door nr:	te bestellen aantal
appels							
1	Brabantse Bellefleur	X	dec.-mrt	H,M,B	zacht-zuur	z,5,13	
2	Bramley's Seedling	XXX	nov-jan	M,B,(H)	moesappel	4	
3	Dubbele Bellefleur	XX	nov-jan	S	zacht-zuur	5,13	
4	Glorie van Holland	XX	nov-febr	H	zacht-zuur	6	
5	Gravensteiner	XX	sept-okt	H	fris aroma	3,10,14	
6	Groninger Kroon	XX	nov-jan	H,M,S,(B)	zacht-zuur	z	
7	Jasappel	XXX	nov-mrt	S	zoet	1,5,6	
8	Lemoenappel	XXX	nov-jan	H	aromatisch	6,10,14	
9	Lombarts Calville	XX	nov-jan	H,M	aromatisch	3	
10	Notarisappel	XX	okt-dec	H	zeer goede smaak	12,14	
12	Schone van Boskoop	XXX	okt-mrt	H	fris zuur	4,,6,14	
13	Sterappel	XX	okt-dec	H	speciaal aroma	1,4,17	
14	Yellow Transparant	XX	aug-sept	H,M	zacht zuur	6,10,12	
15	Zigeunerin	X	sept	H	zacht zuur	z	
17	Zoete Erngaarde	XXX	nov-mrt	M	zoet	1,13	
appelbomen						totaal:	0
peren							
1	Beurre Hardy		okt--nov.	H	sappig	4,3	
2	Brederode		dec-febr.	S	zoet	z,1	
3	Clapp's Favourite		sept.	H	sappig	1,4	
4	Conferance		okt.-jan	H,P	sappig	z,1,2	
5	Doyenne du comice		nov.-dec.	H	zeer goede smaak	3	
6	Gieser wildeman		dec-febr.	S	rood kokend	z	
8	Juttepeer		sept.	H,S,I,P,D	wit vruchtvlees	1,3	
9	Maagdenpeer		okt-nov	H,P	tamelijk saprijk		
10	Pondspeer		nov-jan	S			
11	Saint remy		nov.-mrt.	S	rood kokend	1,2,3,4	
12	Winterjan		jan-apr	S	rood kokend		
perenbomen						totaal	0
pruimen							
			pluktijd	kleur			
1	Belle de Louvain		aug.	groot rood-blauw	z		
2	Eldense blauwe		aug.	blauw	5,7		
3	Ontario		begin aug.	groot groengeel	z		
4	Opal		juli- aug.	paars roodgeel	z		
5	Reine Claude dOullins		aug.	groengeel	z,2,7		
6	Reine claudes Verte		sept.	klein groengeel	2,5,7		
7	Victoria		aug.-sept.	langwerpig rood	z,3,5		
pruimenbomen						totaal	0
Kersen							
			pluktijd	kleur			
1	Dubbele meikers		28 juni	rood	z,2,5		
2	Mierlose zwarte		6 juli	donker	4,5		
3	Morel		22 juli	zuur	z		
4	Udense spaanse		19 juli	geel met rood	1,2		
5	Varikse zwarte		5 juli	zwart	1,2		
6	Hedelfinger		15 juli	groot donker	1		
kersebomen						totaal	0
uitleg							
		iedere boom moet bij het planten voorzien worden van minimaal 1 boompal					
H	Handappel/peer	boombeschermer wanneer de boomgaard beweide wordt: pantanetgaas					
M	Moesappel	180cm hoog.					
S	Sapappel/peer	1 zak 20 kg groencompost per plantgat toevoegen (aanschaf door aanvrager)					
B	bakappel	totaal aantal hoogstamfruitbomen					0
I	inmaak	boompalen				aantal	
P	perensap						
z	zelfbestuiver						
