

Heesen, Anita

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 13:07
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Passantenhaven Schipperskerk : Bodemonderzoek en NGE
Bijlagen: GPR7013.1-Bijlage 1f CE-Bodembelastingkaart.pdf

Hallo [REDACTED]

Volgens de bodemkwaliteitskaart is de kwaliteit van de overigens zeer beperkte hoeveelheid vrijkomende grond;" Landbouwgrond (zowel de boven-alsook de ondergrond)"
Deze grond kun je zonder problemen op de bonnen van de grondbank afvoeren (vermelden op de bon AW , plaats vrijkomen en boekingsnr.). Een bodemonderzoek is gezien de uitkomende zeer beperkte hoeveelheid onnodig en overbodig, daar is juist de BKK voor geschreven. Ook is de BKK als bewijsmiddel voldoende voor de arbo , dus ook geen gekke dingen voorschrijven.
In de BKK is wel als bevoegd gezag RWS aangewezen voor zowel het openbaar water alsook de dijkstrook dus ook aldaar waar je de poer wilt graven.

De NGE kaart heb ik je bijgevoegd en volgens mij ligt de locatie in de groene zone, maar dat kun jij beter zelf beoordelen.
Groen is gewoon aan de slag. Rood is voorzichtig zijn en dan zou je kunnen werken met de opgestelde handreiking(is de grond geroerd na de WOII dan kan er ook vrij probleemloos gewerkt worden zoniet dan is er aanvullen NGE onderzoek noodzakelijk en een mogelijk daar aan vast gekoppeld zoek en benaderingsonderzoek.

Groetjes
[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@sittard-geleen.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 16:24
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@sittard-geleen.nl>
Onderwerp: Passantenhaven Schipperskerk : Bodemonderzoek en NGE


Hé [REDACTED]

Naar aanleiding van telefoongesprek zojuist, bij deze onderstaand door mij in voorbereiding zijnde project.
In de bijlage het kaartje voor de plaatsbepaling.

Voorlopig technisch ontwerp passantenhaven

Wij baseren het voorlopig technisch ontwerp op de standaardmaten van leveranciers van kwalitatief zeer goede drijvende steigers met een flexibele indeling en modules om uit te bouwen in de toekomst. Daarbij gelden de volgende technische specificaties:

- Standaard basiselementen hoofdsteiger 12 meter lengte, breed minimaal 1,50 meter
- Vingerpielen breed 80 cm, lang 800 cm, met verbrede bevestiging
- Kopsteigers / vingerpielen, lang 10 meter, voor eventueel ligplaatsen buiten de steigerstructuur (grotere schepen)
- Oploopsteiger, lengte 4 meter boven water + 1 a 1,5 meter op land, scharnierend aan de oever, berekend op een waterstandsverschil van 100 cm naar boven en naar beneden
- Hoogte boven water ca 50 cm, drijvend op eigen constructie
- Verankering aan drie palen als getekend, met flexibele paalbeugels

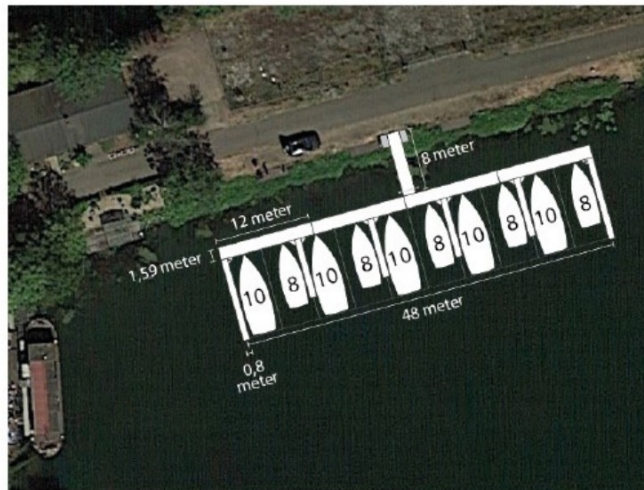


Voorlopig technisch ontwerp details en voorzieningen

Op basis van de input zoals deze geleverd is door verschillende stakeholders gaan wij uit van de volgende technische uitvoering:


- Drijvende steiger, comfortabele breedte
- Loopdekken en vingerpielen uit te voeren in kunststof profiel (zie detail) zodat bij gebruik door eenden en ganzen de uitwerpselen bij regen van de steiger lopen en niet tot
- Geen elektra of water voorziening op de steiger. Deze is gericht op kort verblijf
- Mogelijkheid tot het plaatsen van een hek bij de toegang voor het geval er te veel overlast ontstaat van sportvissers op de steiger
- Plaatsen van een informatiepaneel en reddingmateriaal op de steiger (band, trap, infopaneel met noodnummer en toeristische informatie)




Boven- en zijaanzicht steigerdeel



Boven- en zijaanzicht vingerpier



Boven- en zijaanzicht beweegbare toegangssteiger

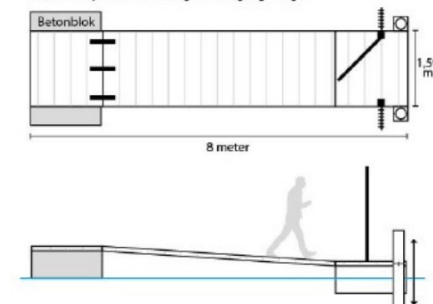

1. Is er een bodemonderzoek nodig voor deze minimale grond-werkzaamheden (plaatsen van een funderingspoer voor het aanlegsteiger, en palen in de waterbodem voor het aanlegsteiger op de plaats te houden) ?
2. Is er een NGE-onderzoek noodzakelijk, omdat we kleine grondwerkzaamheden gaan uitvoeren, of is het “onverdacht” gebied ?

Ich huur girre va dich.

Met vriendelijke groet,



Civiele Techniek

Gemeente Sittard-Geleen
Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer



Postbus 18, 6130 AA Sittard
Bezoekadres: Walramstraat 9 - 19A Sittard
