Globale Uitvoeringsplanning Dinkel Zuid

Datum: don 13-6-19 Projectnummer: 355487

Versie: 2

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Deadlines Opleverdossier**	**15 dagen**	**vri 14-6-19**	**vri 5-7-19**
2	Opleveren eerste concept opleverdossier	0 dagen	vri 14-6-19	vri 14-6-19
3	Reactie door opdrachtgever	0 dagen	vri 28-6-19	vri 28-6-19
4	Opleveren definitief opleverdossier	0 dagen	vri 5-7-19	vri 5-7-19
5	**PIP & MER**	**353 dagen**	**don 1-8-19**	**naa 7-12-20**
6	Voorontwerp PIP & NRD	94 dagen	don 1-8-19	din 10-12-19
7	Ontwerp PIP, Concept MER en ontwerpbesluit ontgrondingsvergunning	130 dagen	woe 11-12-19	din 9-6-20
8	PIP, MER en ontgrondingsvergunning	99 dagen	woe 10-6-20	aa 26-10-20
9	Vaststellen PIP door PS	0 dagen	din 27-10-20	din 27-10-20
10	Ten inzage	30 dagen	din 27-10-20	naa 7-12-20
11	**Besteksvoorbereiding**	7 mndn	vri 11-10-19	don 23-4-20
12	**Aanbesteden**	48 dagen	vri 24-4-20	din 30-6-20
13	**Uitvoering**	12 mndn	woe 1-7-20	din 1-6-21
14	**Werkzaamheden gereed**	0 dagen	woe 2-6-21	woe 2-6-21
15				
16				
17				
18				

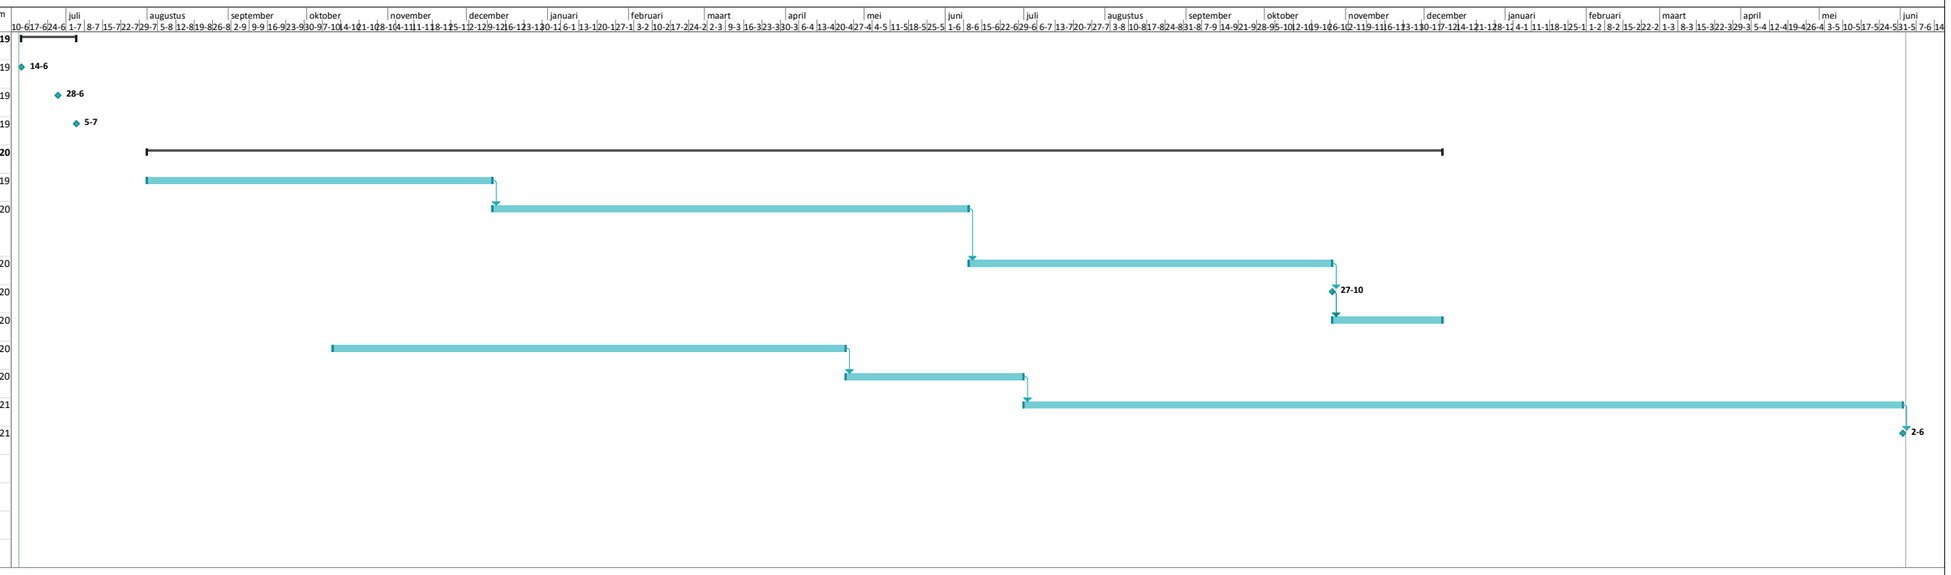

Project: Uitvoeringsplanning
Datum: don 13-6-19

Samenvatting | Inactieve taken | Taak | Mijlpaal | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Voortgang | Voortgang, handmatig
