Participatieproces project Folding Boxboard Eerbeek

Verantwoordingsnotitie

20 december 2022

pré-verkenning, verkenningsfase, planuitwerkingsfase (planperiode 2018-2023)

Eerbeek-Loenen 2030

Participatieproces project Folding Boxboard Eerbeek

Verantwoordingsnotitie

20 december 2022

pré-verkenning, verkenningsfase, planuitwerkingsfase (planperiode 2018-2023)

Eerbeek-Loenen 2030

Inhoud

1	**Inleiding**	**5**
1.1	Eerbeek-Loenen 2030	5
1.2	Bestemmingsplan Eerbeek 2018	6
1.3	Inpassingplan Folding Boxboard Eerbeek	6
1.4	Participatie en communicatie	6
1.5	Leeswijzer	7
2	**Uitgangspunten en proces**	**9**
2.1	Uitgangspunten	9
2.2	Processtappen	9
2.2.1	Processtappen gebiedsontwikkeling	9
2.2.2	Verkenningsfase project FBE	10
2.2.3	Planuitwerkingsfase project FBE	11
3	**Opzet participatieproces**	**13**
3.1	Doel van participatie	13
3.2	Doelgroepen	13
3.2.1	Bestuurlijk niveau	14
3.2.2	De omgeving	14
3.2.3	Belangenvertegenwoordiging	15
3.3	Participatiestrategie	15
4	**Participatie per projectfase**	**17**
4.1	Participatie verkenningsfase	17
4.2	Participatie planuitwerkingsfase	19

Bijlage 1:	Participatieladder	21
Bijlage 2:	Communicatie- en participatiemiddelen	23
Bijlage 3:	Overzichtslijst Participatie- en communicatie FBE	25

1 Inleiding

Binnen de dorpskern van Eerbeek staat het bedrijf Folding Boxboard Eerbeek B.V. (FBE). Het bedrijf produceert speciaal karton voor de verpakking van voedsel en medicijnen. Op de huidige bedrijfslocatie is ruim 350 jaar een papier- en kartonfabriek gevestigd. Het bedrijf heeft zich in de loop van de tijd doorontwikkeld en heeft ook meerdere (internationale)eigenaren gehad. Om toekomstige ontwikkelingen op de bedrijfslocatie zorgvuldig te kunnen toetsen is een passende bestemming nodig voor het terrein van FBE. Via een provinciaal inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie, wordt een passende bestemming voor het bedrijf vastgelegd. Voor zowel het bedrijf als de (directe) omgeving geeft het inpassingsplan duidelijkheid over welke ontwikkelingen zijn toegestaan en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. In deze participatieverantwoordingsnotitie is beschreven hoe het participatietraject is vormgegeven om te komen tot een provinciaal inpassingplan. Bij de start van het project was Mayr-Melnhof eigenaar van het bedrijf. In de loop van het project is het bedrijf overgenomen door Folding Boxboard Eerbeek. Het project heeft de naamswijziging overgenomen.

1.1 Eerbeek-Loenen 2030

Het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen de Industrie–kern Eerbeek Loenen (IKEL), provincie Gelderland, gemeente Brummen en gemeente Apeldoorn. Gezamenlijk hebben deze partners de ambitie om in de dorpen Eerbeek en Loenen een aantal grote projecten te realiseren.
Deze projecten dragen bij aan:

- **Vestigingsklimaat:** realiseren van blijvend competitief papiercluster;
- **Leefbaarheid:** behouden en verbeteren van de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld;
- **Duurzaamheid:** een bijdragen leveren aan een energie- en Co2 neutraal Eerbeek en Loenen in 2050, aan het reduceren van stikstof en aan het tegen gaan van verdroging.

Projecten die bijdragen aan één of meer van deze doelstellingen én waarvoor samenwerking tussen provincie, gemeente en industrie noodzakelijk is, zijn opgenomen in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Tien projecten maken onderdeel uit van het programma. Het project Folding Boxboard Eerbeek B.V. (FBE) is één van deze projecten.

De stuurgroep van het programma Eerbeek-Loenen 2030 heeft als taak de regie te voeren op het volledige programma, waaronder ook de verschillende projecten. De stuurgroep adviseert bestuurders van provincie Gelderland, gemeenten en de directie van de (papier)fabrieken over de koers, planning, inhoud en financiën. De stuurgroep neemt geen besluiten.

1.2 Bestemmingsplan Eerbeek 2018

Voor een groot deel van de kom van Eerbeek is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad Brummen. Het bedrijfsterrein van FBE viel binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan. In september 2019 is het planonderdeel FBE vernietigd, als gevolg van beroep bij de Raad van State (RvS). In het bestemmingsplan Eerbeek 2018 was voor het bedrijf extra ontwikkelruimte meegenomen. De RvS bepaalde dat onvoldoende was onderbouwd wat de effecten van deze extra ontwikkelruimte op de omgeving zouden zijn. Ook adviseerde de RvS een onderzoek naar welke mogelijke maatregelen op het terrein ingezet konden worden om overlast voor omwonenden verder te beperken (inwaarts zoneren). Daarnaast gaf de RvS aan dat behoud van de groenzone langs de Coldenhovenseweg beter geregeld moest worden. Er was dus een reparatie van het bestemmingsplan Eerbeek 2018 nodig.

1.3 Inpassingplan Folding Boxboard Eerbeek

Provincie Gelderland repareert de bestemming via een provinciaal inpassingsplan (PIP). In het PIP zijn de kaders en randvoorwaarden voor de bedrijfsbestemming van FBE vastgelegd. In de nieuwe bestemming is het uitgangspunt de vergunde productiecapaciteit van 200.000 ton papier/karton en 80.000 ontinkte stof. Uitbreiding van de vergunde productiecapaciteit is geen onderdeel van het PIP. Dat betekent dat de ontwikkelruimte die nog in de vergunning zit, gebruikt mag worden. Ook wordt het oordeel van de RvS verwerkt in de bestemming. Zo krijgt bijvoorbeeld de groenzone aan de Coldenhovenseweg ook echt een groenbestemming.

Om een inpassingplan vast te kunnen stellen is veel onderzoek nodig. Vooral de onderzoeken die in beeld brengen wat het effect is op milieu en omgeving zijn omvangrijk. De conclusies worden verwerkt in de planregels en de plankaart. Samen vormen de onderzoeken de milieueffectrapportage (MER). Het MER maakt onderdeel uit van het PIP.

Naast het inpassingsplan zijn ook vergunningen nodig. Een aantal ontwerp-vergunningen liggen tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage.

1.4 Participatie en communicatie

Participatie en communicatie is een belangrijk onderdeel in het proces om te komen tot een inpassingsplan. Zo zijn er op meerdere momenten in het proces bestuurders, direct omwonenden en belangstellenden geïnformeerd en heeft er ook inventarisatie plaatsgevonden. De vraag om actief mee te denken leverde ideeën, wensen en zorgen op. Die leidden tot aanpassingen in het inpassingsplan en aanvullende toezeggingen. Op deze wijze heeft participatie zichtbaar bijgedragen aan de totstandkoming van het inpassingplan.

Helaas kreeg ook de door het project gewenste participatieaanpak te maken met beperkende COVID 19-maatregelen. Fysieke bijeenkomsten met grotere groepen als ook keukentafelgesprekken waren niet mogelijk. Het programma heeft er toen voor gekozen om intensiever te communiceren via de beschikbare onlinekanalen zoals de website www.eerbeekloenen2030.nl en de digitale nieuwsbrief.
Een belangrijk digitaal middel voor het project FBE waren ook de ingesproken thema Powerpoint-presentaties. Daarnaast is ook meer ingezet op persoonlijke gesprekken via telefoon of beeldbellen naast bewonersbrieven. Door de inzet van andere communicatiemiddelen is het mogelijk geweest om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan het participatieproces.

1.5 Leeswijzer

In deze participatieverantwoordingsnotitie is het participatie- en communicatie-proces beschreven van het project FBE. In hoofdstuk 2 leest u een toelichting op uitgangspunten van het project en de processtappen die zijn doorlopen.
In hoofdstuk 3 is toegelicht op welke wijze omgevingsmanagement en participatie is ingezet. In hoofdstuk 4 is het participatieproces per projectfase beschreven. Ook is toegelicht op welke wijze de opbrengst uit het participatieproces is verwerkt.

In bijlage 1 is de participatieladder toegelicht. Bijlage 2 laat zien welke communicatiemiddelen zijn ingezet tijdens het proces. In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van participatie- en communicatiemomenten in het proces.

2 Uitgangspunten en proces

In dit hoofdstuk leest u in het kort de uitgangspunten van het project en de doorlopen processtappen.

2.1 Uitgangspunten

Het bedrijf Folding Boxboard Eerbeek B.V. heeft geldige vergunningen voor de productie en bedrijfsvoering. Echter een passende bestemming voor het bedrijfsterrein ontbreekt. Het uitgangspunt voor het inpassingsplan en de MER-onderzoeken is om de vergunde productiecapaciteit vastleggen in een passende bedrijfsbestemming. We nemen daarnaast wijzigingen in de bedrijfs–voering (korte termijn), de inrichting van de zone langs de Poelkampstraat en de verkeersafwikkeling mee in het plan.

Het bedrijf en de woonomgeving zijn met elkaar verweven. Dit levert spanning op. Bij alle afwegingen die worden gemaakt, kijken we naar het effect op de leefomgeving. Het effect op de leefomgeving komt zowel uit de MER-onderzoeken als van de bewoners. Het uitgangspunt voor het participatieproces is open en transparant. De omgeving is actief gevraagd tussentijds mee te denken en te reageren op voorstellen. De continuïteit in dit afstemmingsproces heeft ervoor gezorgd dat het participatieproces een belangrijke bouwsteen is geworden voor de afwegingen die zijn gemaakt in het plan.

Grootste wijzigingen die door het inpassingplan mogelijk worden:
- de vervanging van een pulpmachine;
- de aanleg van een geluidswand en groenstrook langs de Poelkampstraat en Volmolenweg (tot en met de inrit van FBE);
- de aanleg van een nieuwe weg door de groenzone van ’t Haagje en herinrichting van de groenzone;
- de aansluiting van de Wethouder Sandersstraat op de Coldenhovenseweg;
- het bestemmen van de groenzone langs de Coldenhovenseweg;
- het bestemmen van de beeldbepalende villa’s op het terrein van FBE aan de Coldenhovenseweg en Kloosterstraat.

Uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijfsterrein is dat nieuwe ontwikkelingen op het terrein zo worden ingepast dat deze zo min mogelijk overlast opleveren voor de omgeving.

2.2 Processtappen

Het realiseren van een project verloopt stapsgewijs. Voor alle projecten uit het programma Eerbeek-Loenen 2030 wordt het processchema voor gebiedsontwikkeling van de provincie Gelderland gebruikt. Voor het project FBE is de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase doorlopen.

2.2.1 Processtappen gebiedsontwikkeling

Het provinciale processchema gebiedsontwikkeling gaat uit van vijf projectfasen: de pré-verkenning, verkenning, planuitwerking, realisatie en exploitatie&beheer. Iedere stap in het proces is een GO of NO GO moment. Als blijkt dat een stap niet positief wordt afgesloten, volgt er geen verdere uitwerking meer. Besluiten de partners om door te gaan naar de volgende fase, dan borgen zij de afspraken in een overeenkomst. Net als het project zelf worden de onderlinge afspraken tussen partners steeds concreter.

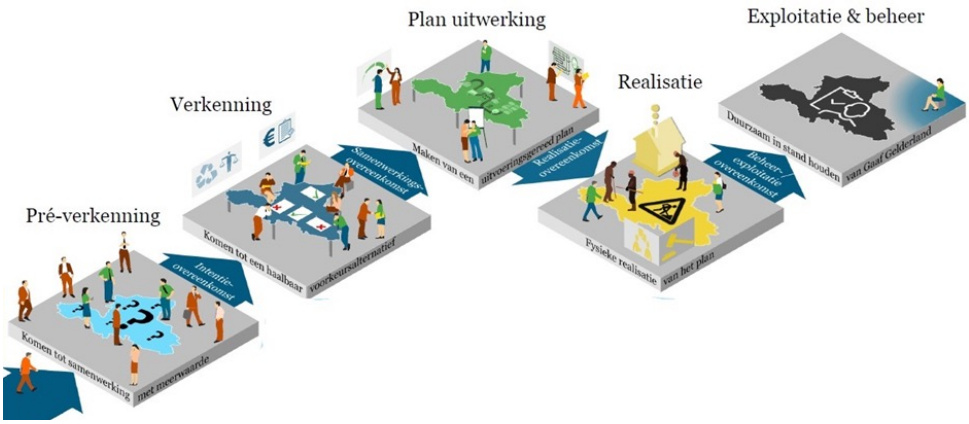

Processtappen gebiedsontwikkeling

2.2.2 Verkenningsfase project FBE

Het project FBE is gestart vanwege de uitspraak van de RvS. De RvS heeft in 2019 het planonderdeel voor de bedrijfslocatie FBE vernietigd en de gemeenteraad Brummen de opdracht gegeven het bestemmingsplan te repareren. Omdat er een concrete opdracht lag, start het proces van het inpassingplan voor FBE niet in de préverkenningsfase maar in de verkenningsfase. In deze fase is de afbakening van het project bepaald. Deze fase is afgesloten met een besluit over het voorkeursalternatief dat verder is uitgewerkt. Participatie heeft ertoe geleid dat het inpassingsplan zich niet alleen beperkt tot het bedrijfsterrein van FBE. Ook een nieuwe route voor afwikkelen van (vracht)verkeer buiten het terrein van FBE werd onderdeel van het project. Ideeën uit de omgeving over nieuwe, mogelijk ontsluitingsroutes waren de basis voor een alternatievenonderzoek.

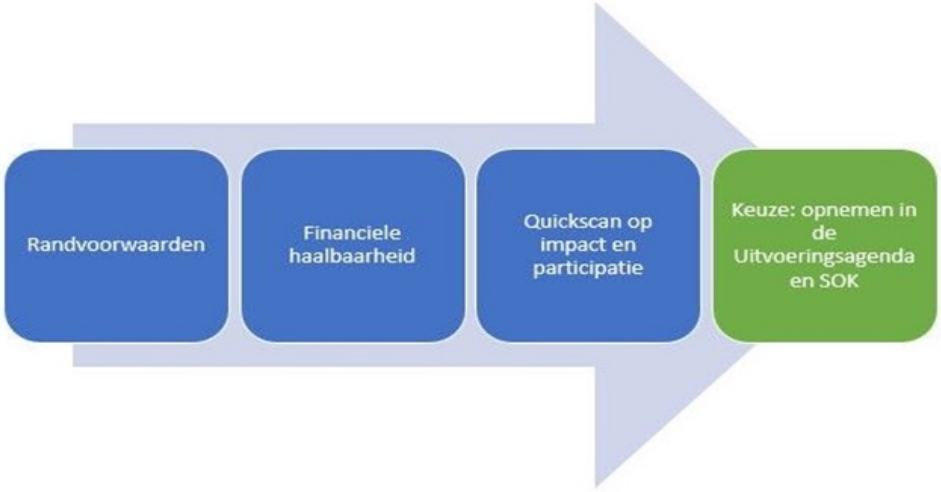

Verkenningsfase, proces op hoofdlijnen

2.2.3 Planuitwerkingsfase project FBE

In de planuitwerkingsfase is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot het niveau van een inpassingsplan. Een aantal planonderdelen, waaronder de pulpmachine, is gedetailleerder uitgewerkt voor een vergunningaanvraag.
In de planuitwerkingsfase is veel overleg gevoerd met de omgeving. De input over vormgeving en inrichting van de nieuwe weg en de groenzone langs de Poelkampstraat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het plan, zoals dat er nu ligt. Ook maatregelen om overlast te verminderen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het plan.
Afspraken over de realisatie worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de partners die samenwerken.

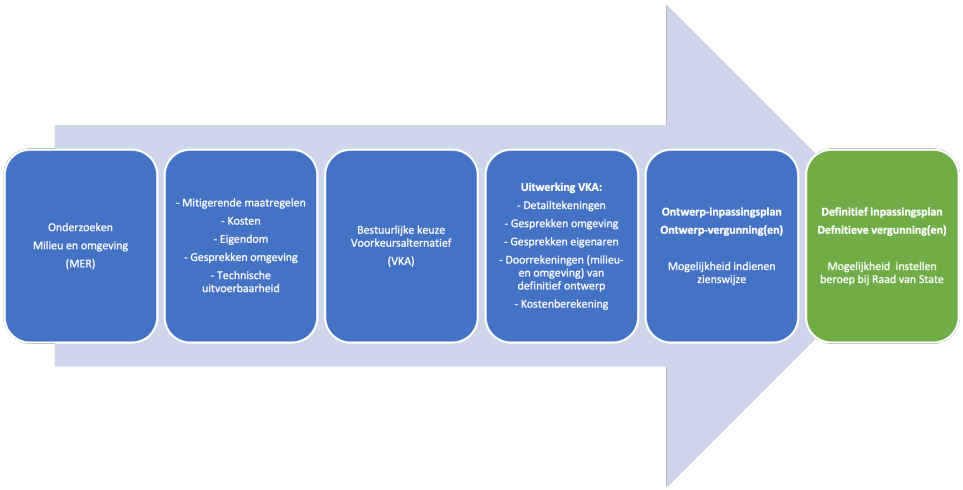

Planuitwerkingsfase, proces op hoofdlijnen

3 Opzet participatieproces

Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is een middel om een achterliggend doel te bereiken. In dit hoofdstuk leest u het doel van het participatieproces, voor welke participatiestrategie is gekozen en welke doelgroepen onderscheiden worden.

3.1 Doel van participatie

Het bedrijfsterrein van FBE ligt midden in een woonwijk. Zowel het bedrijf als de omgeving zijn in de loop der tijd doorontwikkeld. De verwevenheid tussen beiden is steeds groter geworden en levert spanning op. Het oordeel van de RvS om het planonderdeel bedrijfslocatie FBE te vernietigen was naar aanleiding van beroepen van met name direct omwonenden van de fabriek. De uitspraak laat zien dat concreter onderbouwd moet worden wat de effecten op de omgeving zijn als gevolg van het plan. Ook vraagt de Raad van State om te kijken of maatregelen getroffen kunnen worden die het effect op woon- en leefklimaat kunnen verbeteren (bv inrichting van het bedrijfsterrein).

Om invulling te geven aan de punten die de Raad van State meegaf is het van belang dat de omgeving meedenkt in het proces. De opdracht aan het projectteam is dan ook om participatie integraal onderdeel te maken van het proces om te komen tot een inpassingplan. De nadruk van het participatieproces ligt op het benutten van kennis, ervaringen en ideeën uit de omgeving. Daarvoor moeten belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken worden en moet een transparant proces gevolgd worden. Beschikbaar stellen van informatie en onderling vertrouwen zijn cruciaal om samen te komen tot een kwalitatief beter plan.

Aan het begin van iedere projectfase is een participatieplan opgesteld waarin staat hoe het participatietraject is ingericht. Daarin is aangegeven welke ruimte er is voor de omgeving om mee te denken en inbreng te leveren.

3.2 Doelgroepen

Niet iedereen neemt in het participatieproces dezelfde positie in. Dit is afhankelijk van de rol, het belang en de verantwoordelijkheden. In grote lijnen zijn op basis hiervan aan het begin van het proces verschillende doelgroepen onderscheiden. De positie in het participatieproces bepaalt welke ruimte er is om het proces of inhoud te sturen. Aan de hand van de participatieladder (zie bijlage I) is bepaald op welk participatieniveau de doelgroepen betrokken worden. De participatieladder kent de volgende participatieniveaus: Informeren, Consulteren (en adviseren), Samen beslissen, Samen handelen, Ondersteunen van initiatieven (zelf organiseren). Het is niet zo dat de doelgroepen altijd als afzonderlijke groepen zijn betrokken bij het proces. Juist het onderlinge gesprek tussen doelgroepen kan leiden tot nieuwe ideeën, begrip en gedragenheid.

3.2.1 Bestuurlijk niveau

Op bestuurlijk niveau onderscheiden we verschillende doelgroepen. In onderstaande tabel staan de doelgroepen, rol in het project en positie in het participatieproces.

Doelgroep	Rol in het project	Mate van participatie
Gedeputeerde Staten van Gelderland	– Bevoegd gezag vaststellen ontwerp-inpassingsplan – Bevoegd gezag vergunning Wet natuurbescherming – Bevoegd gezag omgevingsvergunning activiteiten milieu en bouwen – initiatiefnemer MER (onderdeel planMER) – Medefinanciering uitvoering	Beslissingsbevoegdheid
Provinciale Staten van Gelderland	– Bevoegd gezag vaststelling definitief inpassingsplan – Beschikbaar stellen van financiële middelen (budgetrecht)	Beslissingsbevoegdheid
College van B&W gemeente Brummen	– Medefinanciering uitvoering – Grondeigenaar – Beheerder openbare ruimte	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen
Gemeenteraad gemeente Brummen	– De gemeenteraad wordt gehoord over het inpassingsplan. – Beschikbaar stellen van financiële middelen (budgetrecht)	Informeren Consulteren/Adviseren
Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030	– Sturen op het proces – Adviseren van bevoegde gezagen over inhoud en proces.	Informeren Consulteren/Adviseren
Directie Folding Boxboard Eerbeek B.V.	– Initiatiefnemer MER (onderdeel projectMER) – Verantwoordelijk voor ontwikkelingen op eigen terrein – Aanvragen vergunningen ontwikkelingen eigen terrein	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen

3.2.2 De omgeving

Voor de omgeving zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden. De indeling is gemaakt op basis van persoonlijk belang. Het kan voorkomen dat bewoners deel uitmaken van verschillende doelgroepen. In onderstaande tabel staan de doelgroepen, rol in het project en positie in het participatieproces.

Doelgroep	Rol in het project	Mate van participatie
Bewoners directe omgeving bedrijfsterrein	– Belanghebbenden – Inbrengen van kennis, ervaringen en ideeën uit de praktijk	Informeren Consulteren/Adviseren
Bewoners met eigendom grenzend aan het tracé van de nieuwe weg	– Belanghebbenden – Inbrengen van kennis, ervaringen en ideeën uit de praktijk – Inbrengen wensen over inrichting gebied tussen erfgrens en nieuwe weg.	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen
Grondeigenaren binnen de grenzen van het plangebied	– Grondpositie op locatie benodigd voor realisatie van het plan.	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen
Belangstellenden	– Inbrengen van kennis, ervaringen en ideeën	Informeren Consulteren/Adviseren

3.2.3 Belangenvertegenwoordiging

De wijk- en dorpsraad zijn de enige belangenvertegenwoordigers die structureel zijn aangehaakt op het proces. In onderstaande tabel staat hun rol in het project en hun positie in het participatieproces.

Doelgroep	Rol in het project	Mate van participatie
Dorpsraad Eerbeek-Hall en de wijkraad Eerbeek Zuid	Adviserende rol richting stuurgroep op inrichting en uitvoering van het participatieproces. Zij hebben minimaal 2x per jaar zitting in de stuurgroep.	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen

3.3 Participatiestrategie

Voor bestuurders van de gemeente Brummen en de omgeving is een participatie-traject gevoerd. Voor de bestuurders van de provincie Gelderland is geen apart participatietraject gevoerd. Zij hebben beslissingsbevoegdheid en zijn geïnformeerd en nemen besluiten volgens een vaste procedure. Voorafgaand aan een projectfase is een participatiestrategie bepaald. Deze strategie biedt bewust ruimte om in te kunnen spelen op onverwachte situaties en het leveren van maatwerk.

Bestuurders gemeente Brummen
De bevoegdheid voor vaststelling van een inpassingsplan ligt bij de provincie. Dat betekent dat de bestuurders van de gemeente Brummen op een aantal formele momenten is gevraagd om te reageren op de stukken. De reactie wordt meegenomen in de besluitvorming. De bestuurders zijn gedurende het project geïnformeerd op inhoud en proces. Dit vond plaats via technische briefings aan de Raad en zitting van een wethouder in de Stuurgroep. Hierdoor zijn zij in staat gesteld om het proces te volgen, inhoudelijk op de hoogte te zijn en te adviseren op de formele momenten. Door zowel de Raad als de projectleider is initiatief genomen om technische briefings te agenderen.

Omgeving
Het project is geen blanco canvas. Er staat een fabriek, er zijn geldige vergunningen, er is een woongebied met een daarvoor passende bestemming. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om het gebied helemaal opnieuw in te richten. Dit heeft invloed gehad op de ruimte die geboden kon worden in het participatietraject. Sommige onderdelen uit het plan stonden al vast. Daar waar ontwerpruimte was, is de omgeving gevraagd mee te denken en mee te tekenen.
Al vrij snel in het proces hebben belanghebbenden en de belangenvertegen-woordiging van bewoners aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de planontwikkeling. Het verzoek bestond uit meerdere onderdelen: beschikbare informatie en (concept)stukken vroeg in het proces delen, meedenken over uitgangspunten en onderzoeksopzet en bijdragen aan het vinden van oplossingsrichtingen.

Om participatie een integraal onderdeel te maken van het proces en invulling te geven aan de wens van de omgeving is gedurende het project de volgende strategie gehanteerd: het voeren van een transparant en navolgbaar proces, aanspreekbaar zijn, korte lijnen over en weer en het benutten van kennis en wensen uit de omgeving.

- **Transparant en navolgbaar proces:** Tijdens het proces is veel gecommuniceerd en zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet om mensen te attenderen op ontwikkelingen binnen het project. Ook zijn diverse mogelijkheden geboden met als doel om de, vaak complexe en omvangrijke informatie, makkelijker eigen te maken. Samenvattingen, posters, ingesproken PowerPoint-presentaties

en gesprekken met experts zijn hier voorbeelden van. Ook zijn meerdere malen concept stukken en tussenstappen gedeeld via de website Eerbeek-Loenen2030. Op deze manier zijn mensen actief betrokken bij het proces en in staat gesteld om inhoudelijk goed op de hoogte te zijn. Gestreefd is naar een transparant proces waarin voor iedereen duidelijk was wat de stappen waren, wat de inhoud was en welke inbreng mogelijk was. Mensen in staat stellen om inhoudelijk goed op de hoogte te zijn is essentieel om constructieve, inhoudelijke gesprekken te voeren.

- **Aanspreekbaar:** De omgevingsmanager van het project was de schakel tussen projectteam en de omgeving. Deze was rechtstreeks aanspreekbaar via mail, telefoon of fysiek tijdens bijeenkomsten of locatiebezoek.
- **Korte lijnen:** Het ingerichte proces maakte het mogelijk om snel te schakelen tussen omgeving, projectteam en bestuurders.
- **Benutten van kennis:** bij iedere stap in het proces is afgewogen of er ruimte was, en zo ja welke ruimte, om de omgeving te vragen inbreng te leveren. Door dit toe te passen is vaker dan vooraf bezien kennis uit de omgeving benut. Een voorbeeld hiervan is het aandragen van alternatieve routes voor de verkeersafwikkeling en aanvullingen op de uitgangspunten voor het MER-onderzoek verkeer.
  Naar aanleiding van nieuwe inzichten uit het participatieproces, is het plan meerdere malen geactualiseerd en aangescherpt.

4 Participatie per projectfase

Vanaf de start van het programma Eerbeek-Loenen 2030 zijn de belanghebbenden en belangenvertegenwoordiging van bewoners nauw betrokken bij het proces om te komen tot een inpassingsplan en de vergunningen. Participatie is van begin tot eind onderdeel geweest van het proces. Op verschillende momenten, waaronder de belangrijke keuzemomenten, is de omgeving gevraagd mee te denken en input te leveren. De inbreng van de omgeving is onderdeel van de brede afweging op basis waarvan het bestuur besluiten heeft genomen.

De voorgaande hoofdstukken hebben inzicht gegeven in het kader en de uitgangspunten voor het gevoerde participatieproces. In dit hoofdstuk is het participatieproces per projectfase beschreven. De participatiemomenten die het meeste effect hebben gehad op het proces of inhoud zijn opgenomen in dit hoofdstuk. In bijlage 3 is een gedetailleerde tabel opgenomen met alle communicatie- en participatiemomenten en de resultaten daarvan.

4.1 Participatie verkenningsfase

De periode tot aan de vaststelling van het voorkeursalternatief (VKA) heet de verkenningsfase. In deze fase is een besluit genomen over inrichting van het terrein van FBE (op hoofdlijnen) en de keuze voor een nieuwe ontsluitingsroute. Het participatietraject is van grote invloed geweest op het voorkeursalternatief. Onderstaand de belangrijkste participatiemomenten en resultaten van participatie van de verkenningsfase.

- **Tervisielegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (augustus 2020)**
  Tijdens de tervisielegging van de NRD is door veel belanghebbenden verzocht de scope van het project te verruimen. Zorgen waren er over de verkeers–afwikkeling via de bestaande route. Eenieder is vervolgens gevraagd om alternatieve routes aan te dragen. Naar aanleiding van deze reacties is besloten om de scope van het MER-onderzoek te verruimen. De nieuwe scope omvat behalve een onderzoek naar twee inrichtingsvarianten voor het terrein van Folding Boxboard Eerbeek, ook een onderzoek naar vijf mogelijke aan- en afrijdroutes naar dit terrein.
  → **Resultaat participatie:** Verbreding van de projectscope. Verkeersafwikkeling is onderdeel geworden van het project. De aangedragen alternatieve routes voor verkeersafwikkeling worden onderzocht en beoordeeld in een alternatievenonderzoek.

- **Delen concept- alternatievenonderzoek (februari 2021)**
  Het delen van een concept-versie van het alternatievenonderzoek (welke routes worden verder onderzocht in het MER) en inzicht bieden in de opzet van de MER-onderzoeken die uitgevoerd gaan worden.
  → **Resultaat participatie:** Vijf verschillende ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer worden meegenomen in het MER en getoetst op milieu- en omgevingseffecten. Eigenaren voor wie een route invloed heeft op eigendom zijn persoonlijk geïnformeerd en in contact gebracht met de omgevingsmanager van het project.

- **Publicatie eerste MER resultaten (juni 2021)**
  De alternatieve ontsluitingsroutes zijn onderzocht op hun milieueffecten. De MER onderzoeken zijn vroeg in het proces openbaar gemaakt. Met belanghebbenden en belangstellenden zijn zowel de onderzoeksopzet als de onderzoeksresultaten besproken. Om de grote hoeveelheid en complexe informatie op een laagdrempelige manier te delen is een samenvattende notitie geschreven, zijn ingesproken presentaties gedeeld en zijn per

milieuthema verschillende vragenuren met de experts van het onderzoeks-bureau georganiseerd. Alle vragen zijn beantwoord in een gebundelde 'vragen-antwoordlijst' op de website. De gesprekken hebben ertoe geleid dat de belangstellenden goed op de hoogte zijn gebracht, het juiste kennisniveau hebben om te kunnen adviseren over de keuze van het VKA. Ook zijn veel aandachtspunten opgehaald die bij de uiteindelijke doorrekening van het VKA worden meegenomen zodat de kwaliteit van de onderzoeken verbetert (bijvoorbeeld beter aansluiten op de werkelijke situatie).

→ **Resultaat participatie:** Belangstellenden zijn op de hoogte van de onderzoeksopzet en het adviesbureau heeft door de gesprekken een goed beeld van de feitelijke situatie. In de opzet van het verkeersonderzoek en geluid en trillingsonderzoek zijn naar aanleiding van de gesprekken wijzigingen doorgevoerd.

- **Individuele gesprekken met direct belanghebbenden (september 2021)**
  De onderzochte nieuwe ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer particulier eigendom wordt verworven. Met de eigenaren van woonhuizen/bedrijfspanden/ gronden die onderdeel uitmaken van één of meerdere mogelijke ontsluitingsroutes zijn individuele gesprekken gevoerd. Zij hebben op deze wijze hun persoonlijke belang mee kunnen geven voor de keuze van het voorkeursalternatief (VKA).
  → **Resultaat participatie:** Wensen, ideeën en bezwaren zijn opgehaald om mee te laten wegen in de bestuurlijke keuze voor het VKA. Persoonlijke voorkeuren van belanghebbenden liepen uiteen. Er is door de belang-hebbenden geen gezamenlijke voorkeur uitgesproken. De gesprekken hebben inzicht gegeven dat geen van de onderzochte routes gerealiseerd kan worden via minnelijke verwerving.

- **Informatiebijeenkomsten (september 2021)**
  Voor belanghebbenden en belangstellenden zijn in kleine setting bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten was tweeledig: informeren over de resultaten van de MER-onderzoeken en het ophalen van aandachtspunten die meegewogen moesten worden bij de keuze van het VKA. Vragen die zijn voorgelegd zijn: zijn er nog meer maatregelen te bedenken die de effecten van Folding Boxboard Eerbeek op de omgeving kunnen verminderen, zijn er nog andere aanpassingen mogelijk die de leefbaarheid vergroten?
  Welk omgevingseffect moet voor u in de afweging de meeste aandacht krijgen?
  Wat vindt u belangrijk dat Gedeputeerde Staten meeneemt in de keuze voor een VKA?
  Het advies van de omgeving aan Gedeputeerde Staten is opgenomen in de notitie van 16 november 2021: "Project Folding Boxboard Eerbeek B.V, van alternatieven naar een voorkeursalternatief, Bundeling reacties omgevingsproces september-november 2021".
  → **Resultaat participatie:** Veel aangedragen ideeën kwamen overeen met de resultaten uit het MER (geluidswanden, bronmaatregelen, doorstroming verkeer). Participatie heeft de knelpunten en oplossingsrichtingen bevestigd. Participatie heeft daarnaast opgeleverd:
  - Uit de reacties blijkt dat veel waarde wordt gehecht aan een groene woonomgeving met uitzicht en uitstraling van een woonwijk. Bij de uitwerking van het ontwerp is de nieuwe weg zo veel mogelijk onttrokken aan het zicht door (deels) verdiepte ligging en begroeide geluidswanden. Ook zijn extra bomen, struiken en zichtlijnen in het ontwerp opgenomen. Het zichtbaar maken van de Eerbeekse beek en wandelmogelijkheid langs de beek draagt bij aan de uitstraling van een woonwijk.
  - Verbeterde communicatie tussen FBE en de omgeving. FBE is gestart met een eigen nieuwsbrief voor omwonenden en een aanspreekpunt om klachten te kunnen melden.

- Bij de bestuurlijke keuze over het VKA heeft de wens van de omgeving - goede balans tussen industrie en wonen/leefbaarheid, verminderen hinder en rekening houden met nieuwe gehinderden en eigendommen van derden - zwaar meegewogen.

- **Veldbezoek en bestuurlijk gesprek (oktober 2021)**
  Meerdere bewonersgroepen hebben na de openbare bijeenkomsten verzocht om een bestuurlijk gesprek, voorafgaand aan de keuze voor een VKA. Om dit mogelijk te maken is de besluitvorming met drie weken uitgesteld. Omwonenden van de vijf onderzochte ontsluitingsroutes hebben de mogelijkheid gekregen om in gesprek te gaan met de gedeputeerde en wethouder (portefeuillehouders Eerbeek-Loenen 2030). Zij hebben elkaar gesproken tijdens een rondwandeling door het gebied.
  → **Resultaat participatie:** Bestuurders hebben door de persoonlijke gesprekken op locatie een goed beeld kunnen vormen van de wensen, zorgen, kansen en knelpunten. De bestuurders hebben deze kennis betrokken bij de keuze voor het voorkeursalternatief.

4.2 Participatie planuitwerkingsfase

In de planuitwerkingsfase wordt het VKA uitgewerkt tot een inpassingsplan. Het detailniveau van het plan neemt in deze fase toe. Voor het participatieproces betekent dit dat de vraagstukken steeds concreter worden. Onderstaand de belangrijkste participatiemomenten en resultaten van de participatie tijdens de planuitwerkingsfase.

- **Groenzone en geluidswand Poelkampstraat/Volmolenweg (eind 2020-2022)**
  Grenzend aan de Poelkampstraat /hoek Volmolenweg wordt een groenzone met daarnaast een geluidswand gerealiseerd. Met de aanwonenden is op meerdere momenten besproken welke inrichting bij kan dragen aan een prettige leefomgeving. Wensen als: parkeerplaatsen, container-opstelplaatsen, groenblijvende beplanting en geen plaatsing van speeltoestellen en bankjes zijn meegenomen in het definitieve ontwerp van Folding Boxboard Eerbeek B.V. van de groenzone.
  → **Resultaat participatie:** aan het ontwerp zijn op verzoek van de aanwonenden parkeerplaatsen, container-opstelplaatsen en een verkeersdrempel in de Poelkampstraat toegevoegd. De groenzone wordt op verzoek van de aanwonenden vooral ingericht om het zicht op de fabriek te beperken en niet om te recreëren.

- **Inrichting groenzone 't Haagje (februari 2022)**
  Het VKA voor een nieuwe aan- en afrijdroute gaat door een bestaande groenstrook langs 't Haagje. Met de direct aanwonenden zijn verschillende gesprekken gevoerd over de inrichting van de groenzone en de aansluiting van de particuliere percelen op nieuwe weg. Deze wensen van de aanwonenden zijn zo veel als mogelijk meegenomen in het ontwerp van de nieuwe weg en de inrichting van de groenzone. Niet alle punten waar overeenstemming over is bereikt kunnen geborgd worden in het inpassingplan. Het detailniveau en de aard van de wensen past niet in het ruimtelijk plan. Toezeggingen die zijn gedaan over de inrichting, worden in een separate brief naar de betreffende eigenaren gestuurd.
  → **Resultaat participatie:** De ruimte tussen de nieuwe weg en de particuliere eigendommen aan de Coldenhovenseweg wordt zo veel mogelijk naar de wens van de aangrenzende eigenaren ingericht. Het gaat onder andere om het plaatsen van twee toegangshekken en schuttingen op de erfgrenzen, verlichting langs het toegangspad, beplanting van de geluidswand en de mogelijkheid om op eigen grond afschermende beplanting te plaatsen. Deze inrichting kan op instemming rekenen van het merendeel van de

aanwonenden. Voor de volledigheid goed om te vermelden.
Instemming op het ontwerp van het gebied tussen de erfgrens en de geluidswand betekent niet dat er instemming is over de keuze voor de voorkeursvariant – de nieuwe weg door 't Haagje.

- **Gesprekken verkeersveiligheid nieuwe route (april 2022)**
  De VKA-uitwerking van de nieuwe route leverde bij de omgeving zorgen op over de verkeersveiligheid. De zorgen zijn besproken met de verkeerskundigen uit het project. De gesprekken hebben ertoe geleid dat de kruispunten Volmolenweg/nieuwe weg door het haagje en de kruising nieuwe weg met de Wethouder Sanderstraat zijn aangepast. De wijzigingen zullen een positief effect hebben op de verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers.
  → **Resultaat participatie:** Het kruispunt nieuwe weg-Volmolenweg en het kruispunt nieuwe weg -Wethouder Sandersstraat zijn aangepast na gesprekken met de aanwonenden. De kruising met de Wethouder Sanders–straat gaat in het aangepaste ontwerp uit van een andere voorrangssituatie (nieuwe weg moet voorrang verlenen). De kruising met de Volmolenweg is ook aangepast. De huidige versmalling op de Volmolenweg (bij 't Haagje) blijft behouden.
  De aanpassingen van de kruispunten komen zo veel mogelijk tegemoet aan de wensen van de direct aanwonenden. De aanpassingen zijn gericht op een veiligere situatie voor voetgangers en fietsers.
  Voor de volledigheid goed om te vermelden dat aanpassingen aan de kruispunten en tegemoetkomen aan de wensen niet betekent dat er met de direct aanwonenden instemming is over de keuze voor de voorkeurs–variant – de nieuwe weg door 't Haagje.

- **Bijeenkomst VKA (mei 2022)**
  In mei is een inloopbijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken van de uitwerking VKA te presenteren en het gesprek hierover te voeren.
  Deze bijeenkomst werd druk bezocht (60 mensen). De bijeenkomst heeft weinig reacties opgeleverd. De bijeenkomst heeft niet geleid tot aanpassen van het plan.
  → **Resultaat participatie:** alle belangstellenden zijn op de hoogte van de inhoud en proces. De bijeenkomst heeft niet geleid tot grote aanpassingen in de onderzoeken en plannen.

Bijlage 1: Participatieladder

We betrekken graag iedereen bij de uitwerking van het project. Niet iedereen heeft echter hetzelfde belang. Ook lenen niet alle onderdelen van het proces zich voor een participatieproces. Aan de hand van de participatieladder is per projectfase in kaart gebracht op welke wijze de verschillende partijen betrokken worden bij het proces.

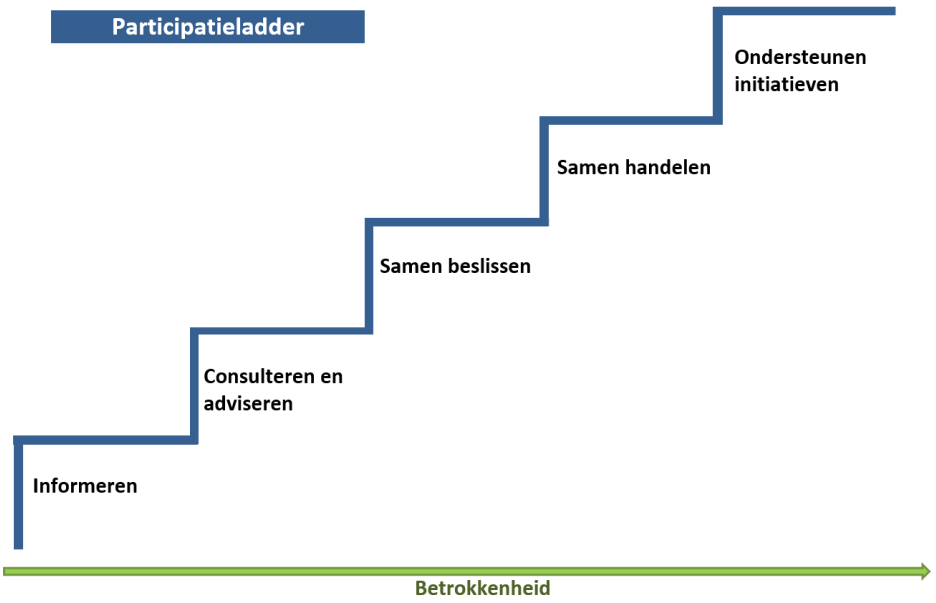

Trede 1: Informeren
Het projectteam informeert de belangstellenden en belanghebbenden over haar plannen. Belanghebbenden hebben toegang tot de basisinformatie om zich een correct beeld te kunnen vormen. Dit kan via brochures, persberichten, informatieavonden, website, nieuwsbrieven, etc.

Trede 2: Consulteren (en adviseren)
Belanghebbenden mogen hun mening en advies geven gevraagd en ongevraagd hun mening of advies tijdens keukentafelgesprekken, workshops of interviews. Het proces richt zich op het inventariseren van ervaringen, meningen en nieuwe ideeën. De uitkomsten zijn niet bindend maar worden wel betrokken bij besluitvorming. Belanghebbenden ontvangen een onderbouwde terugkoppeling van het besluit.

Trede 3: Samen beslissen
Belanghebbenden worden nauw betrokken en geïnformeerd over de planvorming en besluitvorming van het project. Gezamenlijk wordt een agenda opgesteld en naar oplossingen toe gewerkt. De politiek verbindt zich aan deze oplossingen, eventueel na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden.

Trede 4: Samen handelen
Stuurgroep en bestuur laten voorbereiding en uitwerking over aan betrokkenen, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. Het bestuur neemt de resultaten over. Resultaten uit het proces hebben bindende werking.

Trede 5: Ondersteunen van initiatieven (zelf organiseren)
Stuurgroep en bestuur helpen anderen om (mogelijk onder voorwaarden) hun initiatief te realiseren.

Bijlage 2: Communicatie- en participatiemiddelen

In het proces om te komen tot het inpassingsplan is gebruikgemaakt van verschillende communicatie- en participatiemiddelen. Beperkende maatregelen als gevolg van COVID 19 hebben invloed gehad op de inzet van deze middelen. Fysieke bijeenkomsten en gesprekken zijn in deze periode vervangen door digitale en schriftelijke gesprekken en bijeenkomsten. Ook zijn ingesproken presentaties op de website gezet.

Website EL2030

De website www.eerbeekloenen2030.nl is de centrale plek voor informatie–voorziening over het programma en de projecten. De website is daarnaast ingericht om dienst te kunnen doen als digitaal participatieplatform: belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de website hun mening geven of vragen stellen. Dit kan via het invullen van een reactieformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met de omgevingsmanager. In alle gevallen volgt een persoonlijke terugkoppeling op de ingediende reactie of vraag.
Voor het project FBE hebben we een projectpagina waarop informatie over o.a. de stand van zaken, de doelstellingen, proces en de planning staat. https://www.eerbeekloenen2030.nl/projecten/folding-boxboard-eerbeek-mayr-melnhof.

(Digitale) Bijeenkomsten

Bij voorkeur komen we fysiek bijeen, maar als dit door omstandigheden niet kan organiseren we de bijeenkomsten op digitale wijze. Tijdens het planproces zijn zowel fysieke als digitale bijeenkomsten gehouden. Gesprekken met specialisten over de MER zijn digitaal gevoerd. De meeste bijeenkomsten die fysiek plaatsvonden zijn kleinschalig ingericht. In kleine groepen, met uitgeprinte presentaties, zijn op een veilige manier constructieve gesprekken gevoerd.

(Individuele) gesprekken

Met name direct belanghebbenden maakten regelmatig gebruik van de mogelijkheid om hun persoonlijke verhaal in een één-op-één gesprek te delen. In gesprek is het makkelijker en laagdrempeliger om de specifieke situaties te bespreken. De mogelijkheid voor stakeholders om persoonlijk contact te zoeken met de omgevingsmanager stond gedurende de hele planuitwerkingsfase open. Ook was er de mogelijkheid om met een grotere groep (via beeld-bellen) in gesprek te gaan met de omgevingsmanager(s). Hier is meerdere keren gebruik van gemaakt door bewonersgroepen met een gemeenschappelijke zorg en/of belang.

Informeren en uitnodigen

Om de omgeving te informeren of om ze uit te nodigen om aan het participatieproces deel te nemen, is gekozen voor onderstaande middelen:

- **Nieuwsbrief EL2030:** Periodieke (digitale) nieuwsbrief. Hiermee houden we belangstellenden actief op de hoogte van specifieke ontwikkelingen binnen projecten en de voortgang van het totale programma.

- **Aanschrijving op adres:** Om heel gericht mensen of groepen uit te nodigen
- of te informeren is gebruik gemaakt van informatie verzenden per post (brief). Ook zijn voor de groenzone Poelkampstraat/Volmolenweg meerdere flyers per post gestuurd.

- **Social media:** Inzet van Facebook en Twitter van provincie en gemeenten Brummen om een breder publiek te bereiken en belangstellenden te informeren over nieuwswaardige ontwikkelingen.

- **GemeenteThuis:** Om een breder publiek te bereiken is gebruik gemaakt van de gemeentepagina om nieuws rondom het project naar buiten te brengen. GemeenteThuis is een onderdeel van het wekelijkse nieuwsblad BrummensNieuws.

- **Krant/ huis-aan-huisblad:** Formele tervisielegging of besluiten waarop bezwaar of beroep mogelijk is moeten gepubliceerd worden in het provinciaal blad (digitale uitgave van provincie Gelderland). Om een breder publiek te bereiken zijn formele procedures of besluiten ook gecommuniceerd via een huis-aan-huisblad.

Bijlage 3: Overzichtslijst Participatie- en communicatie FBE Participatieverantwoording periode 2017 - 2022

In deze bijlage treft u een overzicht aan van belangrijke communicatie- en participatiemomenten voor het project FBE. Op programma-niveau zijn momenten geweest die van invloed zijn geweest op het project FBE. Daarnaast is voor het project FBE een zelfstandig participatie- en communicatie–traject doorlopen. De communicatie- en participatiemomenten voor het totale programma en de momenten specifiek voor het project FBE zijn in deze bijlage in twee aparte tabellen weergegeven.

Programma Eerbeek-Loenen 2030

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatie-mogelijkheid	Resultaat
Pré-verkenningsfase				
09-11-2017	Workshop	Belangen-vertegenwoordiging ondernemers, bewoners, woningbouw, industrie, cleantech regio, onderwijs, energieorganisaties en overheden.	Workshop over de opgaven en ambities in Eerbeek. Ter bespreking is voorgelegd: De Position Paper van de industrie (IKEL) en de Second opinion haalbaarheid opgaven Eerbeek 2030 (McKinsey).	Er is een start gemaakt met: - Toekomstperspectief - Samenwerking Er is opgehaald wat iedere vertegenwoordiger verwacht te halen en brengen op het gebied van leefbaarheid, vestigingsklimaat en energie.
7/13/20 - 12-2017	Workshop (3x), Bestuurlijk overleg (1x)	Belangen-vertegenwoordiging ondernemers, bewoners, woningbouw, industrie, cleantech regio, onderwijs, energie-organisaties en overheden.	**Workshops:** **Energietransitie en duurzaamheid:** bepalen ambitieniveau en inventariseren van wensen. **Governance:** vormgeven samenwerking, uitwerken mogelijke organisatiemodellen, rol bepalen. **Leefbaarheid(focus), Industrie en Energie:** Schetsen gewenste toekomstbeeld van Eerbeek inventariseren wensen en kansen. **Bestuurlijk overleg:** Gesprek met stakeholders over governance.	Verdere uitwerking van initiatieven/projecten, samenwerking, belangen en rollen. Er is verkend of een samenwerking wenselijk is en hoe deze er uit kan zien.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatie-mogelijkheid	Resultaat
Pré-verkenningsfase				
24-04-2018	Gesprek	Dorpsraad Eerbeek-Hall en Wijkraad Eerbeek Zuid	Gesprek over rol belangenbehartiging bewoners via de Wijk-en dorpsraad.	Gesprek met Wijk- en dorpsraad Heeft geleid tot een formele rol voor de Wijk- en dorpsraad in het proces. De Wijk- en dorpsraad krijgen de mogelijkheid om de stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 rechtsreeks te spreken.
05-06-2018	Uitnodigings-brief voor informatie-markt	Organisaties, bedrijven, overheden en belangen–vertegenwoordigers uit Eerbeek	Mogelijkheid om te reageren op: – concept-lijst projecten Eerbeek-Loenen 2030. Gevraagd is om aandachtspunten en aanvullingen. – participatiestructuur voor wijk- en dorpsraad. – wie met welke rol betrokken moet worden bij de verkenning van de afzonderlijke projecten.	Er zijn geen nieuwe projecten aangedragen voor het programma Eerbeek-Loenen 2030. Voor alle projecten zijn aandachtspunten opgehaald. Deze inhoudelijk punten zijn meegenomen in de verkenning van de afzonderlijke projecten. Partijen die aangegeven hebben betroken te willen zijn bij verdere uitwering zijn in de afzonderlijke projecten benaderd en betrokken bij het proces. Alle aandachtspunten en beantwoording zijn weergegeven in een notitie 'Bundeling reacties_ informatiemarkt 5 juni 2018_EL2030'. Deze notitie is een bijlage bij besluit Projectenboek en IOK (1 oktober 2018).

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
01-10-2018	Protocol	Wijkraad Eerbeek Zuid Dorpsraad Eerbeek-Hall (belangen-vertegenwoordiging bewoners participatieproces)	Formele vastlegging rol wijk- en dorpsraad in organisatie programma Eerbeek-Loenen 2030.	Ondertekening Protocol Belangenvertegen-woordiging Bewoners door Wijkraad Eerbeek Zuid, Dorpsraad Eerbeek-Hall en de voorzitter stuurgroep.
01-10-2018	Participatie-plan Eerbeek-Loenen 2030, format voor de verkennings-fase	Belangstellenden	Wijkraad Eerbeek Zuid, Dorpsraad Eerbeek-Hall, Dorpsraad Loenen en Brummenenergie zijn gevraagd om input te leveren.	Vaststelling projectenboek, ondertekening intentieovereenkomst over samenwerking (IOK) met als bijlage' format participatieplan voor de verkenningsfase'. Besluit om voor ieder project binnen Eerbeek Loenen 2030 participatie integraal onderdeel te maken het proces en gebruik te maken van het format participatieplan.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
Okt 2018	Website www.eerbeekloenen2030.nl	Alle belangstellenden	Ondersteunend aan participatietraject (informeren, uitnodigen, contact)	Een projectwebsite die actueel is en waar voor zowel het programma als de afzonderlijke projecten alle beschikbare informatie gedeeld wordt.
27-11-2018 28-11-2018 04-12-2018	Informatie-markt (3 bijeen-komsten)	Alle belangstellenden	Informatiebijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Brummen over het masterplan Centrum en Eerbeekse beek. Tevens was stand EL2030 ingericht. Doel: informeren over het definitieve Projectenboek Eerbeek-Loenen 2030 (totaal 8 projecten) en ophalen van aandachtspunten voor het programma en participatieproces.	Opbrengst is gebundeld in 'Eerbeek laat van zich horen! verslag informatiebijeenkomsten over het centrum en de Eerbeekse Beek'. Voor de projecten LCE, Energietransitie, Talent & Opleiding en Wegennet (N786) zijn aandachtspunten opgehaald. De aandachtspunten sloten aan bij de opgave van de verkenningsfase en zijn meegenomen in de verkenning. Voor het project LCE zijn vooral andere bestemmingen voor het voormalig Burgersterrein opgehaald. Deze opmerkingen paste toen niet in de scope van het project en zijn niet meegenomen in de verkenningsfase.
23 januari 2019	Technische briefing	Provinciale Statencommissie EEM	Kennisnemen van programma Eerbeek-Loenen 2030.	Leden Provinciale Staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030.
17 april 2019	Informatie bijeenkomst, veldbezoek en gesprek	Provinciale Staten van Gelderland	Kennisnemen van het programma en gesprek voeren met gemeente, industrie en belangenvertegenwoordigers bewoners over programma Eerbeek-Loenen 2030. (onderdeel van het inwerkprogramma)	Leden Provinciale Staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030.
01-07-2019	Nieuwsbrief (digtaal)	Alle belangstellenden	Ondersteunend aan het participatieproces (informeren, uitnodigen, contact).	Een digitale nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030. Belangrijkste communicatiemiddel, wordt uitgebracht 1x per 4-6 weken. Mogelijkheid om aan te melden en de nieuwsbrieven automatisch digitaal te ontvangen.
11-09-2019	Uitspraak Raad van State	-	-	Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Eerbeek. Vernietiging planonderdelen: - bedrijfslocatie Mayr-Melnhof (nu FBE) - voormalig Burgersterrein, beoogde locatie LCE. Heroverweging projectenboek Eerbeek-Loenen 2030 noodzakelijk.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
09-12-2019	Besluit	-	-	Stuurgroep-besluit reparatie bestemmingsplan Eerbeek: Voor project FBE (voorheen Mayr Melnhof) en project LCE wordt de reparatie van het bestemmingsplan opgepakt via een inpassingsplan.
27 januari 2020	Bestuurlijk overleg	Wijk- en dorpsraad	Adviseren participatieproces in de verkenningsfase voor de projecten Eerbeek-Loenen 2030.	Wijk- en dorpsraad hebben verzocht om de voortgang van projecten niet ten koste te laten gaan van een zorgvuldig omgevingsproces. De stuurgroep heeft bevestigd dat participatie integraal onderdeel is van het proces en medebepalend is voor de planning.

Project Folding Boxboard Eerbeek

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
11-09-2019	Uitspraak Raad van State	-	-	Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Eerbeek. Vernietiging planonderdelen: – bedrijfslocatie Mayr-Melnhof (nu FBE) – voormalig Burgersterrein, beoogde locatie LCE. Heroverweging projectenboek Eerbeek-Loenen 2030 noodzakelijk.
09-12-2019	Besluit	-	-	Stuurgroep-besluit reparatie bestemmingsplan Eerbeek: Voor project FBE (voorheen Mayr Melnhof) en project LCE wordt reparatie van het bestemmingsplan via inpassingplan opgepakt.
Januari 2020	Besluit	-	-	Instemmen met canvas omgevingsmanagement Mayr Melnhof door stuurgroep.
Februari 2020	Nieuwsbrief	Belang-stellenden	Informeren	Start proces inpassingsplannen LCE en FBE. Aankondiging gesprekken met direct aanwonenden en later (vanaf april) start ontwerpproces in breder verband.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
6 maart 2020	Brief	Direct omwonenden FBE	Uitnodiging voor gesprekken in kleine groepen (kleinschalige bijeenkomsten). Vooruitlopend op de uitwerking is gevraagd in gesprek te gaan om te horen wat omwonenden belangrijk vinden en welke aandachtspunten in de verdere uitwerking terug moeten komen.	Aanmeldingen van direct aanwonenden om in gesprek te gaan. De uitnodigingsbrief is gestuurd aan 117 huishoudens om deel te nemen aan kleinschalige bijeenkomsten. De respons op de uitnodiging was ongeveer 50%.
17 maart 2020	Brief	Direct aanwonenden FBE	Annulering bijeenkomsten tot 6 april 2020 (lockdown COVID-19)	
1 april 2020	Brief	Direct aanwonenden FBE	Annulering bijeenkomsten tot 1 juni (beperkingen voor bijeenkomsten ivm COVID-19)	Opnieuw annulering fysieke bijeenkomsten. Gezocht wordt naar alternatieve communicatiemiddelen om participatie voort te kunnen zetten.
April 2020	Nieuwsbrief	Belangstellenden	Informeren	Annulering fysieke bijeenkomsten ivm COVID-19 maatregelen (voor projecten LCE, FBE en Wegennet). Annulering geplande gesprekken met direct betrokkenen en uitstel bredere bijeenkomst.
Juni 2020	Nieuwsbrief	Belangstellenden	Informeren	Vooraankondiging ter visielegging NRD in aug/sept 2020
Juni 2020	Website	Belangstellenden	Vernieuwde website met mogelijkheid om digitaal via een reactieformulier.	Mogelijkheid om laagdrempelig, digitaal contact te leggen met het projectteam. Op de (tijdelijke) webpagina 'denk mee, doe mee' staan ook vragen aan de lezer om mee te denken over het project FBE.
Juli 2020	Flyer	Aanwonenden FBE, LCE en Wegennet	Attenderen op contactmogelijkheden en informatiemogelijkheden.	Belanghebbenden zijn extra geïnformeerd over de voortgang in de projecten en mogelijkheid om contact op te nemen. Verstuurd naar 480 adressen (voor Wegennet, LCE en FBE samen)

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
Augustus 2020	- Publicatie provinciaal blad (3-8-2020) - Regiobode (4-8-2020) - Brummens nieuws (14-8-2020) - Nieuwsbrief EL2030 (4-8-2020) - Gemeente-Thuis (week 35) - Mail - Social media Gemeente Brummen	- Belangstellenden - Mensen die eerder aangegeven hebben op de hoogte te willen blijven (per mail)	Ter inzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In periode van 11 augustus tot en met 21 september 2020 is de mogelijkheid geweest voor indienen van een zienswijze. Vragen die zijn gesteld: - Zijn de alternatieven volledig? - Ontbreken er nog varianten of alternatieven? - Worden de juiste milieuthema's onderzocht? - Worden de juiste uitgangspunten voor de onderzoeken gehanteerd? Aankondiging en aanmeldmogelijkheid voor informatiebijeenkomst 9-9-2020	Op de NRD van Mayr-Melnhof zijn 19 zienswijzen ingediend. Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof wordt de zorg uitgesproken over de verkeersafwikkeling via de bestaande wegen. Verzocht wordt om breder te kijken dan alleen de uitspraak van de Raad van State. Dit verzoek is overgenomen en heeft geleid tot een besluit in oktober om een alternatievenonderzoek uit te voeren voor de verkeersafwikkeling.
9-9-2020	- Informatie bijeenkomst - Digitaal alternatief: ingesproken Powerpoint-presentatie over de NRD	Belangstellenden	Informeren en in gesprek over de inhoud van de NRD. (vooraf inschrijven voor gesprekken in kleine setting. Totaal 7 ronden van 45 min)	Ongeveer 30 personen hebben zich laten informeren en hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten. Het verzoek is om de verkeersafwikkeling ook mee te nemen in het plan en ook te kijken of de aanleg van nieuwe wegen of andere aansluitingen op bestaande wegen mogelijk zijn. Dit verzoek is overgenomen en heeft geleid tot een besluit in oktober om een alternatievenonderzoek uit te voeren voor de verkeersafwikkeling.
Oktober 2020	Nieuwsbrief	Belang-stellenden	Informeren en verzoek inbreng te leveren. - Alternatievenonderzoek naar verkeersafwikkeling wordt ingevoegd in het proces - uitnodiging om oplossingen/alternatieven voor de verkeersafwikkeling aan te dragen. - Mededeling dat communicatie komende tijd weer digitaal zal zijn. - Uitnodiging en oproep ook zelf initiatief te nemen om contact op te nemen als er onduidelijkheden of zorgen of nieuwe ideeën zijn.	Pas op de plaats LCE en FBE, start alternatievenonderzoek. De mogelijkheid wordt geboden om alternatieven aan te dragen die getoetst worden op haalbaarheid in het alternatievenonderzoek. De uitkomst van het alternatievenonderzoek is de basis voor het vervolg van het project. Het alternatievenonderzoek geeft antwoord op veel van de ingediende zienswijzen NRD.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Verkenningsfase				
Oktober 2020	– Website EL2030 (14-10-2020) – Nieuwsbrief (15-10-2020) – Website, twitter, facebook gemeente Brummen (15-10-2020) – Gemeente Thuis (16-10-2020) – Brief en mail aan indieners zienswijze NRD (20-10-2020) – Artikel van Wijk-en dorpsraad in de Regiobode (4-11-2020)	Belang-stellenden	Processtap: Verkenningsfase (alternatievenonderzoek) – - Aandragen alternatieven voor de verkeersafwikkeling rondom FBE. – - Mogelijkheid voor indienen van alternatieven mogelijk tot 9 november 2020.	In totaal zijn 15 verschillende alternatieven opgehaald om het alternatievenonderzoek te beoordelen. Alle voorstellen zijn op haalbaarheid getoetst. Haalbare alternatieven zijn toegevoegd aan de NRD en worden volledig getoetst in de milieueffectrapportage.
27 oktober 2020	Technische briefing	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken projecten FBE en LCE Stellen van technische vragen over beide projecten aan projectteam en verantwoordelijk wethouder	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van beide projecten.
23 september 2020	Besluit provinciale Staten Gelderland	Provinciale Staten	Besluiten over: – Coördinatiebesluit – Project Mayr-Melnhof – Voorbereidingsbesluiten – Projecten LCE en Mayr-Melnhof	

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
8 nov 2020	Brief en gesprek	Bewoners Volmolenweg, Coldenhovenseweg, Beekpad	Verzoek van omwonenden om in gesprek te gaan en afspraken maken over participatie gedurende proces. Gespreksmogelijkheid geboden (digitaal) op 3 momenten: 27, 30 november en 2 december.	– Mailgroep om bewoners sneller en rechtstreeks te informeren – Delen eerste analyse alternatievenstudie – Input voor VKA van omwonenden wordt meegenomen in de overwegingen voor een keuze voor het VKA. – Toezegging verfijnings-slag van het VKA: via schetssessies (of een digitale variant) worden belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken en mee te tekenen. – Toezegging verkeer: organiseren College/webinar. Hier is invulling aan gegeven via een ingesproken PowerPoint-presentatie (op de site geplaatst 11-3-2020).
November 2020	Flyer + intekenkaart	Bewoners Poelkampstraat en Volmolenweg (verzending per post)	Verzoek om wensen en ideeën aan te dragen voor groenzone en geluidswand Poelkampstraat/ Volmolenweg	Ongeveer 20 huishoudens maakten gebruik van deze mogelijkheid. Wensen en ideeën zijn gebundeld teruggekoppeld via een nota (feb 2021). Zo veel mogelijk ideeën komen terug in het ontwerp (waaronder beplanting, parkeerplaatsen en container opstelplaatsen en inrichting van het groen).
November 2020-februari 2021	Data op orde (trilling)	Specifieke adressen Volmolenweg en Kloosterstraat	STAB-advies heeft opmerkingen tav trilling gemaakt voor twee woningen Volmolenweg ikv het bestemmingsplan Eerbeek. In zienswijzen NRD en telefonisch hebben meerdere mensen aangegeven last te hebben van trilling.	Er is een gesprek geweest met de bewoners van de betreffende woonhuizen. Er zijn trillingsmeters geplaatst om de werkelijke trilling te meten.
10 december 2020	Technische briefing	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken projecten FBE en LCE. Stellen van technische vragen over beide projecten aan projectteam en verantwoordelijk wethouder	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van beide projecten.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
Februari 2021	– Brief – telefonisch contact	– Direct aanwonenden FBE – Aanwonenden alternatieve ontsluitingsroutes. – Indieners zienswijze NRD	Actief, telefonisch informeren van direct belanghebbenden over het alternatievenonderzoek. Actief per brief aanschrijven van bewoners in gebied rondom fabriek en alternatievenstudie.	Rechtstreeks informeren van bewoners/bedrijven waarvoor mogelijk consequenties tav eigendom aan de orde is.
Begin Februari 2021	– Brief – telefonisch contact – website	Speciale aandacht voor bewoners die gehinderd kunnen worden door de alternatieven en mensen die zienswijzen/reacties hebben ingediend. Direct aanwonenden fabriek en alternatieve ontsluitingsroutes Belangstellenden	Informeren over nader te onderzoeken varianten en alternatieven in NRD Delen van concept-documenten: – Alternatievenonderzoek verkeersafwikkeling Mayr-Melnhof – Overzicht van uit te voeren onderzoeken Mayr-Melnhof (is onderdeel van de nieuwe NRD) Uitnodiging om in gesprek te gaan over deze documenten. Mogelijkheid om vragen te stellen of aandachtspunten mee te geven richting besluitvorming.	4 t/m 16 feb evenemententool ingezet voor het inplannen van gesprekken voor de projecten FBE en LCE.
3 februari 2021	Technische briefing	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken projecten FBE en LCE. Stellen van technische vragen over beide projecten aan projectteam en verantwoordelijk wethouder	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van beide projecten.
2 maart 2021	– Telefonisch contact – Mail – Website – Brief – Nieuwsbrief	– Belangstellenden – Speciale aandacht voor mensen gehinderd kunnen worden door de alternatieven – Mensen die zienswijzen/reacties hebben ingediend.	Processtap: Besluit GS (vaststellen NRD) Informeren (geen inspraak) Informeren over: – de Reactienota – het Alternatieven-onderzoek – definitieve NRD. – participatieplan MM planuitwerkingsfase Uitnodigen om contact op te nemen bij vragen.	
2 maart 2021	Statenbrief	Provinciale staten van Gelderland	Informatie over project FBE, instemming door GS definitieve NRD	Provinciale Staten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en vervolg van het proces om te komen tot een PIP voor FBE

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
9 maart 2021	Statenbrief	Provinciale staten van Gelderland	Informatie over project LCE, instemming door GS definitieve NRD	Provinciale Staten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en vervolg van het proces om te komen tot een PIP voor LCE.
25 maart 2021	Technische briefing	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken project LCE. Stellen van technische vragen aan projectteam en verantwoordelijk wethouder	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het project.
15 juni 2021	Besluit Provinciale Staten Gelderland	Provinciale Staten	Besluiten over: – Voorbereidingsbesluiten – Projecten LCE en Mayr-Melnhof	
28 juni 2021	– Nieuwsbrief – Website – Publieks-vriendelijke informatie – vragen-uurtjes met MER-deskundige	Omwonenden Overige belangstellenden	Processtap: Planuitwerkingsfase (vrijgave MER-onderzoeken) Informeren. Verzoek uit de omgeving om in een vroeg stadium informatie te delen. Daarbij ook het verzoek om de informatie gepast aan te bieden, rekening houdend met beschikbare tijd en achtergrondkennis van de omgeving. Gedeelde informatie: – inhoudelijke MER-rapporten – samenvatting MER ('overkoepelende notitie') – Ingesproken presentaties (ppt) per MER-thema: verkeer& vervoer, geluid & trilling, geur, luchtkwaliteit, stedenbouw& visuele beleving, overige milieu-thema's. – Vragenuurtjes met MER-deskundige (digitaal) op; 12 en 13 juli 2021; 1 en 2 september 2021.	Kennis delen en bespreken ter voorbereiding op de werksessie met de omgeving over de keuze VKA (in sept). Belanghebbenden en belangstellenden zijn in de gelegenheid gesteld om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. Op deze manier zijn zij in staat gesteld om in september inhoudelijk mee te praten over de uitkomsten van de onderzoeken en voorbereiding van de keuze voor het VKA. Gesprekken met de omgeving hebben ook de onderzoeken aangescherpt en aandachtspunten voor vervolgonderzoek opgeleverd. Vragen over de MER-onderzoeken en de antwoorden zijn gebundeld in de notitie 'vraag- en antwoordlijst MER-onderzoeken. Deze notitie is 28 juli 2021 gedeeld op de website.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
September 2021	– Individuele gesprekken – bijeenkomst – schriftelijke reacties	– Belangstellenden – Speciale aandacht voor mensen die gehinderd kunnen worden door de alternatieven.	Processtap: Planuitwerkingsfase (voorbereiden keuze VKA) Informeren over: inhoud MER-resultaten per alternatief, impact op de omgeving, kosten en mogelijke mitigatie. Vragen die zijn voorgelegd aan de omgeving: – Zijn er nog meer maatregelen te bedenken die de effecten van een alternatief op de omgeving kunnen verminderen? – Zijn er nog andere aanpassingen mogelijk die de leefbaarheid vergroten? – Welk omgevingseffect moet voor u in de afweging de meeste aandacht krijgen? – Wat vindt u belangrijk dat de bestuurder meeneemt in de keuze voor het voorkeursalternatief? Eigenaren die door een van de alternatieven mogelijk in eigendom worden geraakt zijn persoonlijk gebeld en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Voor alle belanghebbenden en belangstellenden is een bijeenkomst georganiseerd op 16 september 2021.	Het advies van de omgeving aan Gedeputeerde Staten is opgenomen in de notitie van 16 november 2021: “Project Folding Boxboard Eerbeek B.V, Van alternatieven naar een voorkeursalternatief, Bundeling reacties omgevingsproces september-november 2021”. (15 reacties per mail, 15 mensen gebeld, 10 persoonlijke gesprekken) Op deze wijze is het participatietraject onderdeel van het bestuurlijke besluit over het VKA.
9 september 2021	Technische briefing	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken projecten FBE. Stellen van technische vragen over het project aan projectteam en verantwoordelijk wethouder	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het project.
29 oktober 2021	Bestuurlijk gesprek	Direct aanwonenden van alternatieven uit alternatieven onderzoek VKA FBE.	Processtap: Planuitwerkingsfase (voorbereiden keuze VKA) Gesprek op locatie op verzoek van omwonenden. 7 korte gesprekken met omwonenden, gedeputeerde dhr Marking en wethouder mevr van Burgsteden op locatie.	Verzoek van omwonenden om vóór besluitvorming over het VKA op locatie te spreken met bestuurders is georganiseerd. Bestuurders hebben zorgen, aandachtpunten en kansen uit de eerste hand gekregen van omwonenden. Besluitvorming over VKA is 3 weken uitgesteld om de gesprekken mogelijk te maken.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
November 2021	– Flyer (per post) – Inloop-bijeenkomst	Direct aanwonenden Poelkampstraat/ Volmolenweg	Processtap: Planuitwerkingsfase (poelkampstraat) Eerder ingebrachte wensen en ideeën zijn vertaald naar twee varianten. Omgeving wordt gevraagd om mee te denken over: – Parkeren langs de Poelkampstraat – Container-opstelplaatsen – nrichting groenzone Poelkampstraat (beplanting en wandelpad) – Inrichting groenzone Volmolenweg	Gesprek met aanwonenden Poelkampstraat en Volmolenweg (4 november 2021). Opbrengst: concrete voorstellen voor parkeerplaatsen, container opstelplekken en inrichtingen en gebruik groenzone.
Nov- dec 2021	– Brief Gesprek – Persbericht – Nieuwsbrief – Bijeenkomst	– Belangstellenden – Speciale aandacht voor mensen die mogelijk gehinderd worden door het gekozen VKA	Processtap: Planuitwerkingsfase keuze VKA) – Informeren over de keuze VKA – mogelijkheid om nav bericht over keuze VKA 23 of 25 nov projectteam te spreken op locatie. – uitnodiging voor bijeenkomst 7 december (direct aanwonenden VKA ontvingen tevens uitnodiging per post) Vragen aan omgeving: De onderwerpen die we de direct aanwonenden hebben voorgelegd zijn: 1. Vormgeving en hoogtes van geluidswerende voorzieningen (keerwand, keerwand met groene wal, beplante geluidswal). 2. Wenselijkheid achterom-pad achtertuinen (korte) Coldenhovenseweg. 3. Ligging van het voetpad langs de Eerbeekse beek. 4. Beheer beplanting geluidswerende wand/ wal.	Doel van deze bijeenkomst is geweest om uitgangspunten te bepalen die belangrijk zijn voor de gedetailleerde MER-doorrekening van de route langs 't Haagje. Aandachtspunten, beantwoording en verantwoording is opgenomen in de notitie: 'Bundeling en beantwoording reacties uitwerking nieuwe route langs 't Haagje en inrichting Eerbeekse beek, Input omwonenden december 2021'
25 november 2021	Veldbezoek (Horen van de Raad?)	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken project FBE. Rondleiding op het terrein van FBE, informatie en gesprek met projectteam over de verschillende planonderdelen van het Voorkeursalternatief.	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het project om advies uit te brengen aan GS van Gelderland over de uitgangspunten van het ontwerp provinciaal inpassingsplan.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
12 januari 2022	Technische presentatie	Provinciale Staten van Gelderland	Informeren over de stand van zaken Programma Eerbeek-Loenen 2030	Provinciale staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke projecten
14 maart 2022	Technische briefing	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken projecten FBE, LCE en wegennet. Stellen van technische vragen over programma Eerbeek-Loenen 2030 aan projectteam en verantwoordelijk wethouder	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke projecten.
16 maart 2022	Veldbezoek en gesprek	Provinciale Staten van Gelderland	Informeren over de stand van zaken programma Eerbeek-Loenen 2030, veldbezoek aan de verschillende projecten in Eerbeek en Loenen en gesprek met geïnteresseerden die met leden van PS wilden spreken over het programma Eerbeek-Loenen 2030	Provinciale Staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke projecten. Zij hebben gesproken met en zich laten informeren door belangstellenden en belanghebbenden.
April 2022	Gesprekken	Direct aanwonenden groenzone 't Haagje	Processtap: Planuitwerkingsfase (uitwerking VKA) Gesprek over verkeersveiligheid nieuwe ontsluitingsroute Gesprekken over aansluiting achtertuinen Coldenhovenseweg op nieuwe ontsluitingsroute.	Op basis van aangedragen suggesties zijn aanpassingen in het ontwerp van de kruispunten doorgevoerd (mn tbv fietsverkeer en voetgangers). Concrete afspraken over inrichting aansluiting tuinen op geluidswand van nieuwe ontsluitingsroute. Opgehaalde ideeën zijn verwerkt in de informatie/ posters van de bijeenkomst van 17 mei 2021
12 mei 2022	Bijeenkomst	Belangstellenden	Processtap: Planuitwerkingsfase (uitwerking VKA) Informeren over stand van zaken uitwerking VKA Mogelijkheid om in gesprek te gaan met projectteam, experts adviesbureau, FBE	Ongeveer 60 belangstellen hebben zich laten informeren en hebben gesprekken gevoerd tijdens de bijeenkomst. Aanscherping uitwerking VKA.
1 juni 2022	Inwerk-programma nieuwe gemeenteraad	Gemeenteraad Brummen	Informeren over de stand van zaken programma Eerbeek-Loenen 2030. Fietstocht langs de Eerbeekse projecten die vallen onder programma Eerbeek-Loenen 2030	De nieuwe gemeenteraad is volledig op de hoogte van programma Eerbeek-Loenen 2030.

Datum/ tijdvak	Instrument	Doelgroep	Geboden participatiemogelijkheid	Resultaat
Planuitwerkingsfase				
21 oktober 2022	Bijpraat-moment en veldbezoek	College Brummen en projectteams Eerbeek-Loenen 2030	Informeren over de stand van zaken programma Eerbeek-Loenen 2030, samenhang van de projecten en gesprek over de samenwerking tussen de partners.	College van Brummen en projectteams zijn volledig op de hoogte van de inhoud van het programma, de samenhang tussen de verschillende projecten wen de samenwerking.

Eerbeek - Loenen 2030 is een samenwerkingsverband tussen
provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en IKEL (Industriekern Eerbeek - Loenen

22 300 304 - W2211 592
